

INFORME PROYECTOS PMC DISTRITO CAROLINA REGIÓN METRO




AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

AAA

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Áreas Operacionales REGIÓN METRO

- Área San Juan
- Área Bayamón
- Área Carolina
- Área Guaynabo



INFRAESTRUCTURA

Septiembre de 2025



Proyectos Distrito de Carolina – Región Metro

	CIP #	Nombre del Proyecto	Municipio	Fase	Comienzo Construcción	Terminación Construcción	Costo Inversión
1	1-00-9002	Control de Sedimentos Embalse Carraízo	Trujillo Alto	Planificación	3Q 2026	4Q 2027	\$90,773,063
2	1-45-5017	Carolina Regional Wastewater Treatment Plant and Torrecillas Wastewater Pump Station - Microgrid	Loíza	Planificación	1Q 2027	3Q 2028	\$26,626,500
3	1-71-5016	Sergio Cuevas WTP & Cupey PS Microgrid Trujillo Alto, PR (FEMA-406)	Región Metro	Planificación	TBD	TBD	\$66,873,399
4	1-72-6043	Rehabilitación de la PF Sergio Cuevas (FAAST)	Trujillo Alto	Diseño	2Q 2026	2Q 2030	\$112,594,806
5	1-16-5044	Mejoras a la PAS Regional de Carolina Fase II, Loíza (FAAST)	Loíza	Diseño	4Q 2026	3Q 2028	\$97,244,214
6	1-15-6004	Rehabilitación de la PF Cubuy y la Toma (FAAST)	Canóvanas	Diseño	3Q 2026	3Q 2028	\$12,000,000
7	1-00-9103	Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase I- Metro (FAAST)	Trujillo Alto	Diseño	2Q 2027	4Q 2028	\$3,000,000
8	1-00-9005	D&B Emergency Generators - Drinking Water - Metro Region	incluye Carolina	Subasta	1Q 2026	3Q 2029	\$4,000,000
9	1-00-9008	D&B Emergency Generators – Wastewater Metro Region	incluye Trujillo Alto + Canóv.	Subasta	1Q 2026	3Q 2029	\$7,000,000
10	1-01-9000	Design and Build for the Lago Loíza (Carraízo) Dredging (FAAST)	Trujillo Alto	Construcción	Feb-23	Feb-26	\$111,443,736
11	1-16-9001	Design and Build for the Los Ángeles and Loiza Pueblo trunk sewers	Loíza	Construcción	May-22	Aug-25	\$11,762,333
12	1-15-9000	Diseño – Construcción y Rehabilitación Estación de Bombas La Central	Canóvanas	Construcción	Oct-24	Sep-26	\$3,668,875
13	1-15-9001	NRW- Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Loíza Valley (FAAST)	Canóvanas	Construcción	Feb-25	Dec-26	\$2,641,814
14	1-16-9002	NRW- Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Villa Fontana (FAAST)	Carolina	Construcción	Feb-25	Dec-26	\$2,847,184
15	1-66-9101	NRW- Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Country Club (FAAST)	Carolina	Construcción	Feb-25	Dec-26	\$3,902,711
16	0-80-1002M	Emergency Generator - Metro - Phase 3	Región Metro	Construcción	May-22	Jan-26	\$3,451,296
17	0-80-1003	D&B for the Emergency Generators Acquisition & Installation (Phase IV)	Región Metro	Construcción	Nov-24	Apr-27	\$9,773,880
18	0-80-1002A	Instalación de Generadores de Emergencia y ATS (Ernesto) - Metro	Región Metro	Construcción	Ago-24	N/a	\$1,066,639 + \$136,000 Allow.

Trujillo Alto



AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

AAA

GOBIERNO DE PUERTO RICO



Informe de Proyectos Municipio de Trujillo Alto

CIP	Nombre de Proyecto	Costo Inversión	Estatus	Fecha Subasta	Fecha Comienzo	Forecast Substantial Completion
1 CIP.1715016	Sergio Cuevas Water Treatment Plant and Cupey Pump Station - Microgrid	\$ 66,873,399.00	Planning	TBD	TBD	TBD
2 CIP.1009002	Control de Sedimentos Embalse Carraízo (FAAST)	\$ 90,773,063.00	Planning	4Q 2025	3Q 2026	4Q 2027
3 CIP.1726043	Rehabilitación de la PF Sergio Cuevas (FAAST-25) (PL-56)	\$ 112,594,806.00	Design	3Q 2025	2Q 2026	2Q 2030
4 CIP.1009103	Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Metro (FAAST)	\$ 3,000,000.00	Design	3Q 2026	2Q 2027	4Q 2028
5 CIP.0801003	D&B for the Emergency Generators Acquisition and Installation (Phase IV)	\$ 364,710.00	Construction	12/22/2023	11/04/2024	4/22/2027
6 CIP.1019000	Design and Build for the Lago Loíza (Carraízo) Dredging (FAAST)	\$ 111,443,736.00	Construction	Non-Applicable	2/22/2023	2/12/2026
7 CIP.0801002M	EB La Gloria - Emergency Generators - Phase 3 Metro	\$ 338,418.00	Completed	Non-Applicable	5/23/2022	2/13/2025
8 CIP.1009001	Tanque Fair View - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	\$ 869,797.00	Completed	Non-Applicable	9/12/2022	10/28/2024
9 CIP.1009001	Tanque Saint Just - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	\$ 800,695.00	Completed	Non-Applicable	9/12/2022	10/28/2024
10 CIP.0800074M	EBAS Conquistador 2 - Emergency Generators - Phase 2 Metro	\$ 255,372.00	Completed	Non-Applicable	6/05/2023	3/01/2024
11 CIP.0800074M	EBAS Lourdes - Emergency Generators - Phase 2 Metro	\$ 57,476.00	Completed	Non-Applicable	6/05/2023	3/01/2024
12 CIP.0800074M	EBAS Trujillo Pueblo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	\$ 188,344.00	Completed	Non-Applicable	6/05/2023	3/01/2024

\$387,559,816 US

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Trujillo Alto

Sergio Cuevas WTP & Cupey PS Microgrid Trujillo Alto, PR (FEMA-406) (CIP. 1-71-5016)

Estimado de construcción \$40,000,000.00

Estimado de inversión \$66,873,399.00

Estatus: En proceso de Planificación (PLA-50), taller celebrado 23 de julio de 2025.

Fuente de financiamiento FEMA (HMGP-406), CDBG-DR, AAA

* Microgrid: proyecto tiene como objetivo identificar fuentes de energía renovable más adecuadas en función de factores como la disponibilidad, el costo, la confiabilidad y otras consideraciones pertinentes. Los componentes del sistema eléctrico de energía renovable a ser evaluadas incluyen conexión a la red eléctrica, paneles solares, turbinas eólicas, microturbinas hidroeléctricas, sistema de almacenamiento de baterías.




- ↓ Status
- ↓ Inicio del diseño
- ↓ Anuncio de Subasta
- ↓ Notificación de inicio construcción
- ↓ Construcción finalizada

Control de Sedimentos Lago Loíza (Carraízo) (CIP. 1-00-9002)

Estimado de construcción	\$73,800,000.00
Estimado de inversión	\$90,773,063.00
Estatus:	En Planificación (PLA-100.1), anuncio de subasta proyectado último trimestre de 2025 y comienzo de construcción tercer trimestre de 2026.
Fuente de financiamiento	FEMA-406, CDBG-DR, AAA

* Medidas de mitigación para reducir y controlar la sedimentación mediante reparaciones a la infraestructura y soluciones basadas en la naturaleza. * Proyecto actualmente bajo la evaluación de FEMA (concepto de proyecto en adición a presupuesto solicitado).

* Beneficia a 171,387 familias en San Juan, Carolina, Canóvanas, Trujillo Alto, Gurabo, Loíza y Juncos.

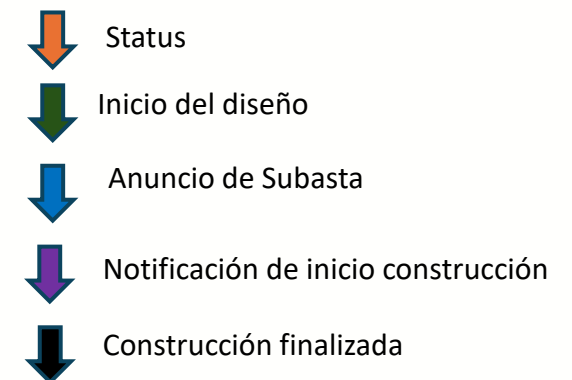

Rehabilitación de la PF Sergio Cuevas (CIP. 1-72-6043)

Estimado de construcción \$98,756,838.00

Estimado de inversión \$112,594,806.00

Estatus: Diseño finalizado (100%), en espera de aprobación documento REC FEMA. Se estima anuncio de subasta para el tercer trimestre del 2025 y comienzo de construcción para el segundo trimestre de 2026.

Fuente de financiamiento FEMA, CDBG-DR, AAA

* Proyecto beneficia a 188,920 familias en los municipios de San Juan, Carolina, Trujillo Alto, y algunos sectores de Gurabo y Juncos.



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Metro (FAAST) (CIP. 1-00-9103)

Estimado de construcción	\$2,000,000.00
Estimado de inversión	\$3,000,000.00
Estatus:	En proceso de diseño (DES-15), anuncio de subasta programado para el tercer trimestre del 2026 y comienzo construcción para el segundo trimestre del 2027.
Fuente de financiamiento	FEMA, CDBG-DR, AAA
- Se propone rehabilitar las siguientes Estaciones de Bombeo en el Municipio Trujillo Alto: - Saint Just <i>alterna: Camarones Grande (municipio de Guaynabo)</i>	



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada


Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Trujillo Alto

Emergency Generators Phase IV (CIP. 0-80-1003M)*

Estimado de inversión	\$9,773,880.00
Estatus:	En construcción (12%). Contratista realizando las evaluaciones y los diseños de las distintas facilidades. Se estima duración construcción 900 días.

- Fuente de financiamiento CWSRF-BIL, AAA
- Proyecto adjudicado a Three O, LLC por el monto de \$7,661,236.54 dólares el 15-Oct-2024. Reunión Pre-Construcción 24-Oct-2024. Comienzo de Construcción 4-Nov-2024.
 - Contratista realiza visitas de campo y evaluaciones de las instalaciones para producir diseños. Se han entregado diseños (30%) de 14 instalaciones de un total de 29.

No.	Facilidad	Tipo de Instalación	Municipio
1	EBAS VILLAS DE CANEY	EBAS	TRUJILLO ALTO



Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Trujillo Alto

Dragado Lago Loíza (Carraízo) (CIP. 1-01-9000)

Estimado de construcción \$93,502,307.00

Estimado de inversión \$111,443,736.00

Estatus: En Construcción (71%). Comienzo actividades de dragado 15 de marzo de 2024.


Fuente de financiamiento FEMA, CDBG-DR, AAA

* 1,567,430 m3 Dragados (9/01/2025) – 78% del Volumen Total (2 M m3).

* Contratista alega no disponibilidad de material de dragado dentro de los limites contractuales del proyecto. Se realizaron barrenos (borings) para la evaluación del reclamo por parte de GLM.

* El Contratista actualmente elaborando propuesta para remover escombros en segmentos del reservorio y dragar en estas áreas.

* Contrato ha finalizado, pendiente extensión de tiempo. Se prevé Contrato finalice primer trimestre 2026.

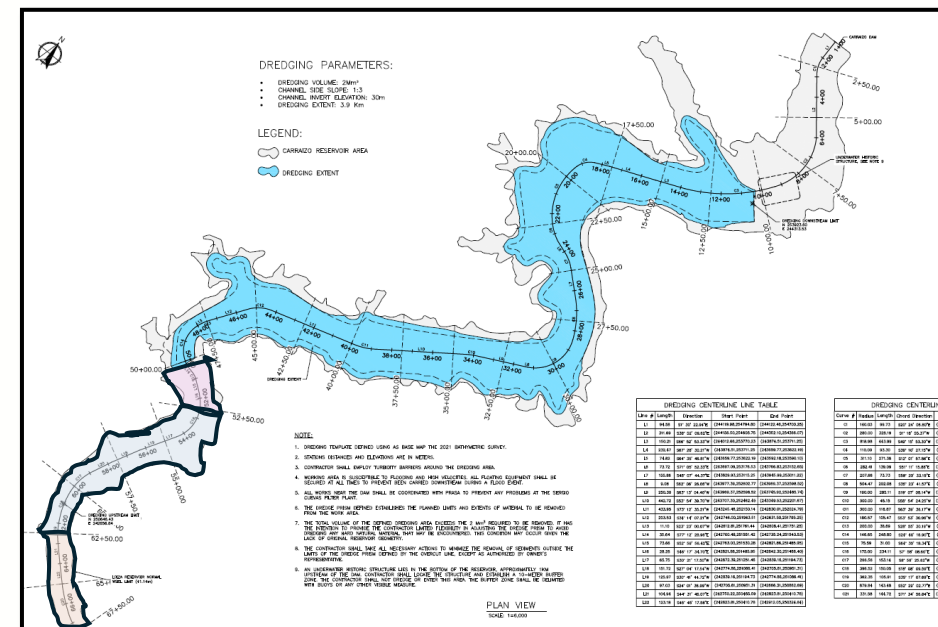

Status



Inicio del diseño



Anuncio de Subasta



Notificación de inicio construcción



Construcción finalizada



Dique A – Vista Aérea



Dique B – Vista Aérea



Dique C – Vista Aérea



**Dique C (Descarga del
“headwall” existente)**



Vertedor del Dique C



**Descarga al río del Dique C
(By-pass)**



AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

AAA

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Progreso del Proyecto

Emergency Generator Phase III (CIP. 0-80-1002M)*

Estimado de construcción	\$2,798,905.32
Estimado de inversión	\$3,451,296.00
Estatus:	Proyecto completado (100%). Terminación Sustancial Parcial emitido 13 de febrero de 2025. Pendiente lista de deficiencias a corregir por el Contratista.
Fuente de financiamiento	AAA
*EB La Gloria: \$338,418.00	



- ↓ Status
- ↓ Inicio del diseño
- ↓ Anuncio de Subasta
- ↓ Notificación de inicio construcción
- ↓ Construcción finalizada

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Trujillo Alto

Rehabilitación de Tanques Fase I – Metro (CIP. 1-00-9001)*

Estimado de construcción \$2,967,036.30

Estimado de inversión \$4,945,740.00


Estatus: Proyecto Completado (100%).

Fuente de financiamiento FEMA, CDBG-DR, AAA



- * **1. Tanque Fair View (91%):** \$521,806.78 dólares (construcción)
2. Tanque Saint Just (93%): \$480,350.86 dólares (construcción)



Fair View

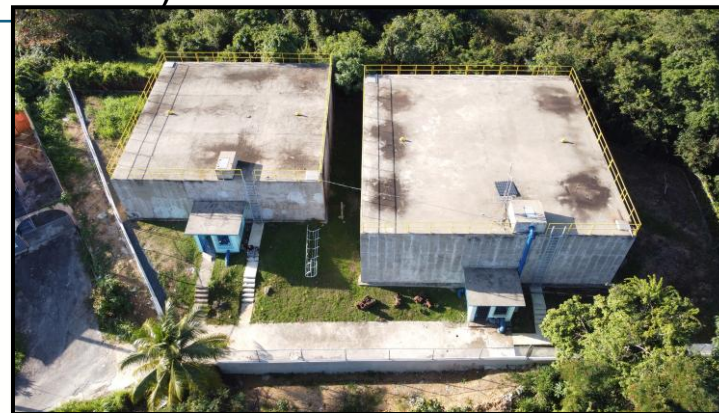

Saint Just

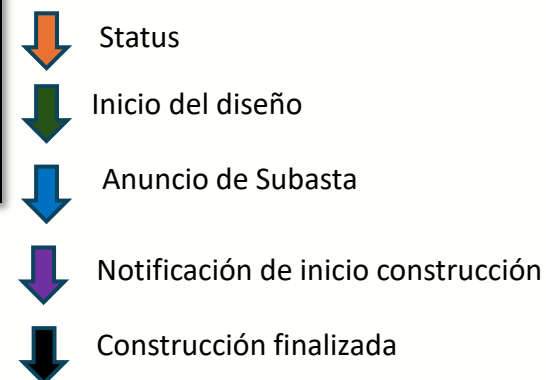

Planificación

Diseño

Subasta

Construcción

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Trujillo Alto

Emergency Generator Phase II (CIP. 0-80-0074M)*

Estimado de construcción	\$1,574,129.59
--------------------------	----------------

Estimado de inversión	\$2,055,678.00
-----------------------	----------------


Estatus:	Proyecto Completado (100%).
----------	-----------------------------

Fuente de financiamiento	AAA
--------------------------	-----

*1. EBAS Conquistador 2 (construcción): \$53,303.25 dólares.

2. EBAS Lourdes (construcción): \$15,673.77 dólares.

3. EBAS Trujillo Pueblo (construcción): \$103,790.20 dólares.



Carolina



AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

AAA

GOBIERNO DE PUERTO RICO



Informe de Proyectos Municipio de Carolina

CIP	Nombre de Proyecto	Costo Inversión	Estatus	Fecha Subasta	Fecha Comienzo	Forecast Completion
1 CIP.1669101	Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Country Club, Carolina (FAAST) #NRW #JG	\$ 4,363,845.00	Construction	6/28/2024	2/5/2025	10/27/2026
2 CIP.1169002	Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Villa Fontana, Carolina (FAAST) #NRW #JG	\$ 2,488,027.00	Construction	6/28/2024	2/5/2025	10/27/2026
3 CIP.0801003	D&B for the Emergency Generators Acquisition and Installation (Phase IV)	\$ 1,114,170.00	Construction	12/22/2023	11/04/2024	4/22/2027
4 CIP.0801002M	EB Centro Judicial - Emergency Generators - Phase 3 Metro	\$ 431,095.00	Construction	8/19/2021	5/23/2022	1/30/2026
5 CIP.0801002M	RP Guzmán Río - Emergency Generators - Phase 3 Metro	\$ 310,055.00	Completed	8/19/2021	5/23/2022	12/12/2024
6 CIP.1009001	Tanque Lomas de Carolina - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	\$ 380,051.00	Completed	Non-Applicable	9/12/2022	10/28/2024
7 CIP.0800074M	EBAS Metropolis - Emergency Generators - Phase 2 Metro	\$ 205,057.00	Completed	Non-Applicable	6/05/2023	3/01/2024

\$9,292,300 US

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Carolina


NRW – Diseño & Construcción Reemplazo y Renovación de Tuberías de Agua Potable (CIP. 1-01-9003)*

Estimado de construcción \$4,709,637.00

Estimado de inversión \$6,851,872.00


Estatus: En construcción (6%). El Contratista finalizó el programa de trabajo (Schedule), desglose de partidas para pago, continuando con las inspecciones de campo y diseños de los distintos segmentos del proyecto.

Fuente de financiamiento FEMA, CDBG-DR, AAA

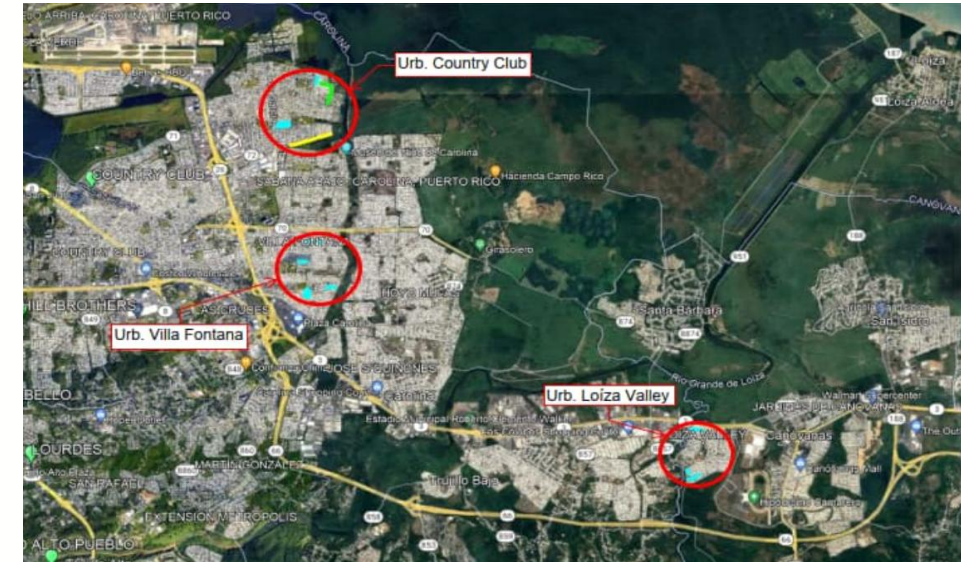

* Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Country Club, Carolina (FAAST) #NRW #JG (se sometió diseño 15%, bajo evaluación)

* Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Villa Fontana, Carolina (FAAST) #NRW #JG (se sometió diseño 30%, bajo evaluación)



Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Carolina

Emergency Generators Phase IV (CIP. 0-80-1003M)*



Estimado de inversión \$9,773,880.00

Estatus: En construcción (12%). Contratista realizando las evaluaciones y los diseños de las distintas facilidades. Se estima duración construcción 900 días.

Fuente de financiamiento CWSRF-BIL, AAA

- Proyecto adjudicado a Three O, LLC por el monto de \$7,661,236.54 dólares el 15-Oct-2024. Reunión Pre-Construcción 24-Oct-2024. Comienzo de Construcción 4-Nov-2024.
- Contratista realiza visitas de campo y evaluaciones de las instalaciones para producir diseños. Se han entregado diseños (30%) de 14 instalaciones de un total de 29

No.	Facility	Tipo de Instalación	Municipality
1	EBAS JARDINES DE CAROLINA	EBAS	CAROLINA
2	EBAS CAROLINA PUEBLO	EBAS	CAROLINA
3	EBAS MARTÍN GONZÁLEZ	EBAS	CAROLINA
4	EBAS BUENA VENTURA	EBAS	CAROLINA

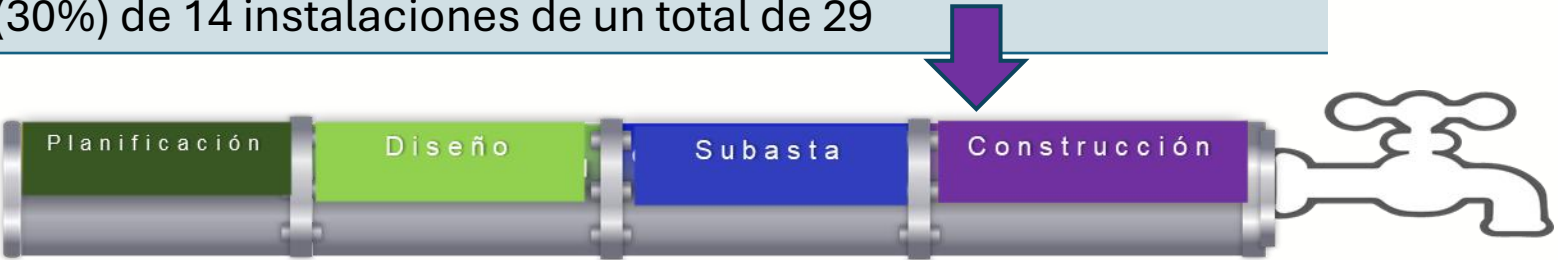

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Carolina

Emergency Generator Phase III (CIP. 0-80-1002M)*

Estimado de construcción \$2,798,905.32

Estimado de inversión \$3,451,296.00

Estatus: En construcción. Contratista sometió los diseños correspondientes al (90%) el 13 de agosto de 2025 (bajo evaluación).

Fuente de financiamiento AAA

* EB Centro Judicial: \$431,095.00



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Emergency Generator Phase III (CIP. 0-80-1002M)*

Estimado de construcción	\$2,798,905.32
Estimado de inversión	\$3,451,296.00
Estatus:	Proyecto completado (100%). Terminación Sustancial Parcial emitido 12 de diciembre de 2024. Pendiente lista de deficiencias a corregir por el Contratista.
Fuente de financiamiento	AAA
* EB RP Guzmán Río: \$310,055.00	



- Status
- Inicio del diseño
- Anuncio de Subasta
- Notificación de inicio construcción
- Construcción finalizada

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Carolina

Rehabilitación de Tanques Fase I – Metro (CIP. 1-00-9001)*

Estimado de construcción \$2,967,036.30

Estimado de inversión \$4,945,740.00

Estatus: Proyecto Completado (100%).

Fuente de financiamiento FEMA, CDBG-DR, AAA

* **1. Tanque Lomas de Carolina:** \$227,999.25 (construcción)



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Carolina

Emergency Generator Phase II (CIP. 0-80-0074M)*

Estimado de construcción	\$1,574,129.59
Estimado de inversión	\$2,055,678.00
Estatus:	Proyecto Completado (100%).
Fuente de financiamiento	AAA

*EBAS Metrópolis (construcción): \$93,436.50



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Loíza



AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

AAA

GOBIERNO DE PUERTO RICO



Informe de Proyectos Municipio de Loíza

CIP	Nombre de Proyecto	Costo Inversión	Estatus	Fecha Subasta	Fecha Comienzo	Forecast Completion
1 CIP.1-45-5017	Carolina Regional Wastewater TP and Torrecillas Wastewater Pump Station - Microgrid	\$ 26,626,500.00	Planning	2Q 2026	1Q 2027	3Q 2028
2 CIP.1165044	Mejoras a la PAS Regional de Carolina Fase II, Loíza (FAAST-25)	\$ 97,244,214.00	Design	1Q 2026	4Q 2026	3Q 2028
3 CIP.1169001	Design and Build for the Los Ángeles and Loiza Pueblo Trunk Sewers (FAAST)	\$ 11,762,333.00	Construction	Non-Applicable	5/16/2022	TBD
4 CIP.0801003	D&B for the Emergency Generators Acquisition and Installation (Phase IV)	\$ 1,401,563.00	Construction	12/22/2023	11/04/2024	4/22/2027
5 CIP.0800074M	EBAS Loíza Pueblo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	\$ 257,347.00	Completed	Non-Applicable	6/05/2023	3/01/2024

\$ 137,321,957 US

Mejoras a la PAS Regional de Carolina Fase II, Loíza (CIP. 1-16-5044)*

Estimado de construcción \$79,095,594.00

Estimado de inversión \$97,244,214.00

Estatus: En proceso de finalización de diseño (aprobación estudios arqueológicos fase II, en proceso fase III). Anuncio de subasta programado para el primer trimestre del 2026 y comienzo de construcción para el cuarto trimestre del 2026.

Fuente de financiamiento FEMA, CDBG-DR, AAA

* Beneficia a municipios de Carolina, Canóvanas y Loíza.




- ↓ Status
- ↓ Inicio del diseño
- ↓ Anuncio de Subasta
- ↓ Notificación de inicio construcción
- ↓ Construcción finalizada

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Loíza

Rehabilitation of Los Ángeles and Loíza Pueblo Trunk Sewers (CIP. 1-16-9001)

Estimado de construcción	\$9,210,203.37
Estimado de inversión	\$11,762,333.00
Estatus:	En construcción (58%).
Fuente de financiamiento	FEMA, CDBG-DR, AAA

- Lugares de Construcción: Villamar & Laguna Gardens (0%), Loíza (100% completado) y Vistamar (100% completado). Trabajos consisten en rehabilitación del alcantarillado sanitario por gravedad utilizando el método Cured-in-Place-Pipe Lining.
- Permiso Cuerpo de Ingenieros emitido para sección Villamar el 13 de febrero de 2025. Actualmente, Contratista somete reclamación para trabajos a realizarse por \$2,012,311.24 y 823 días calendarios.

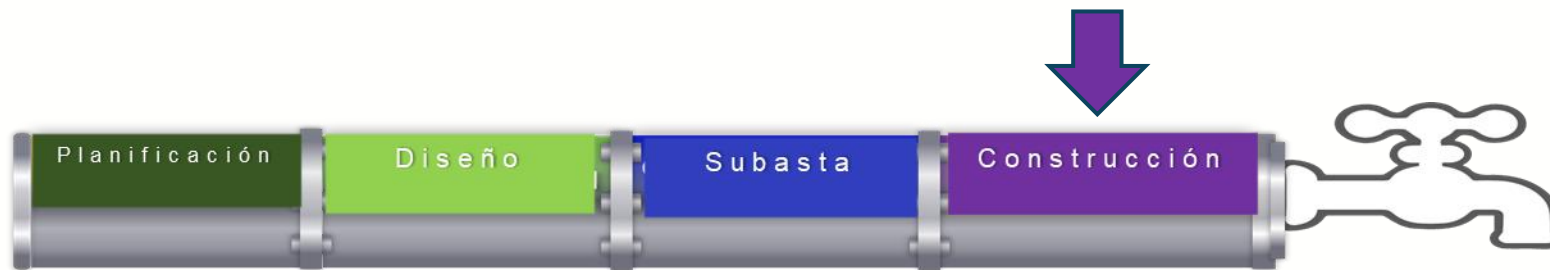

-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Emergency Generators Phase IV (CIP. 0-80-1003M)*

Estimado de inversión	\$9,773,880.00
Estatus:	En construcción (12%). Contratista realizando las evaluaciones y los diseños de las distintas facilidades. Se estima duración construcción 900 días.
Fuente de financiamiento	CWSRF-BIL, AAA

* Proyecto adjudicado a Three O, LLC por el monto de \$7,661,236.54 dólares el 15-Oct-2024. Reunión Pre-Construcción 24-Oct-2024. Comienzo de Construcción 4-Nov-2024.



No.	Facility	Tipo de Instalación	Municipality
1	EBAS LOÍZA E	EBAS	LOÍZA
2	EBAS LOÍZA D	EBAS	LOÍZA
3	EBAS LOÍZA C (GARDEN)	EBAS	LOÍZA
4	EBAS VILLAS DEL MAR BEACH RESORT	EBAS	LOÍZA



- Status
- Inicio del diseño
- Anuncio de Subasta
- Notificación de inicio construcción
- Construcción finalizada

Emergency Generator Phase II (CIP. 0-80-0074M)*

Estimado de construcción	\$1,574,129.59
Estimado de inversión	\$2,055,678.00
Estatus:	Proyecto Completado (100%).
Fuente de financiamiento	AAA
*EBAS Loíza Pueblo (construcción): \$88,168.57	



- ↓ Status
- ↓ Inicio del diseño
- ↓ Anuncio de Subasta
- ↓ Notificación de inicio construcción
- ↓ Construcción finalizada

Canóvanas



AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

AAA

GOBIERNO DE PUERTO RICO



Informe de Proyectos Municipio de Canóvanas

CIP	Nombre de Proyecto	Costo Inversión	Estatus	Fecha Subasta	Fecha Comienzo	Forecast Completion
1 CIP.1156004	Rehabilitación de la PF Cubuy y la Toma	\$ 12,000,000.00	Design	1Q 2026	3Q 2026	3Q 2028
2 CIP.1159000	Diseño & Construcción Rehabilitación EB La Central (FAAST)	\$ 3,668,875.00	Construction	3/25/2024	10/9/2024	9/28/2026
3 CIP.1159001	Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Loíza Valley (FAAST) #NRW #JG	\$ 2,056,041.00	Construction	6/28/2024	2/5/2025	10/28/2026
4 CIP.0801002M	EB TK Campo Rico (El Comandante) - Emergency Generators - Phase 3 Metro	\$ 277,916.00	Construction	8/19/2021	5/23/2022	1/30/2026
5 CIP.0801003	D&B for the Emergency Generators Acquisition and Installation (Phase IV)	\$ 417,331.00	Construction	12/22/2023	11/04/2024	4/22/2027
6 CIP.1009001	Tanque Las Haciendas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	\$ 484,983.00	Completed	Non-Applicable	9/12/2022	10/28/2024
7 CIP.1009001	Tanque El Comandante - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	\$ 526,309.00	Completed	Non-Applicable	9/12/2022	10/28/2024

\$19,431,455 US

Rehabilitación de la PF Cubuy y la Toma (FAAST) (CIP. 1-15-6004)


Estimado de construcción \$7,000,000.00

Estimado de inversión \$12,000,000.00

Estatus: En proceso de diseño (60%), anuncio de subasta programado para el primer trimestre del 2026, y comienzo de construcción proyectado para el tercer trimestre de 2026.

Fuente de financiamiento FEMA, CDBG-DR, AAA

* Se celebró taller de diseño 60% el 28 de marzo de 2025. Se han realizado varias visitas de campo para recolectar información necesaria para el progreso de diseños. Se evalúa la inclusión de construcción de tubería de gravedad desde la toma hasta la planta.

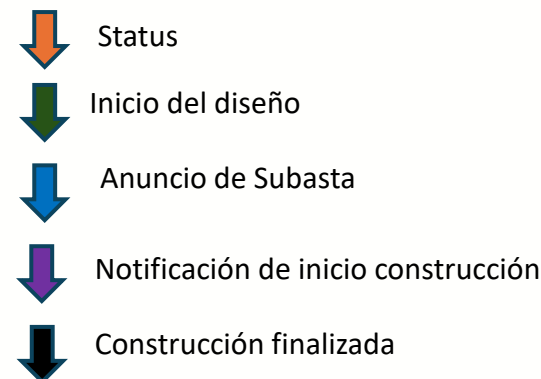

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC)

Municipio de Canóvanas / Carolina

Diseño & Construcción Rehabilitación EB La Central (FAAST) (CIP. 1-15-9000)

Estimado de construcción	\$2,302,089.00 <i>(incluye 1 Orden de Cambio)</i>
Estimado de inversión	\$3,668,875.00
Estatus:	En construcción (20%). Contratista realizó evaluaciones de la instalación y entregó diseños (90%) el 27 de mayo de 2025 para evaluación gerencia. Contratista / diseñador finalizaron mediciones de flujo para diseño sistema bombeo (27 de junio) el cual requiere bombas de 150hp y el 4/sept/2025 fueron aprobadas las pruebas de filtración al tanque.
Fuente de financiamiento	FEMA, CDBG-DR, AAA

* Proyecto adjudicado a CX Contractor, LLC por \$2,294,400 dólares el 20-Sept-2024, Reunión Pre-Construcción 30-Sept-2024, Comienzo de Construcción 9-Oct-2024.

* Proyecto localizado en jurisdicción Municipio de Carolina, pero beneficia 2,500 familias en Municipio Canóvanas.



- Status

Inicio del diseño

Anuncio de Subasta

Notificación de inicio construcción

Construcción finalizada

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Canóvanas

NRW – Diseño & Construcción Reemplazo y Renovación de Tuberías de Agua Potable (CIP. 1-01-9003)*

Estimado de construcción \$1,640,649.00

Estimado de inversión \$2,056,041.00

Estatus: En construcción (6%). El Contratista finalizó el programa de trabajo (Schedule), desglose de partidas para pago, continuando con las inspecciones de campo y diseños de los distintos segmentos del proyecto.

Fuente de financiamiento FEMA, CDBG-DR, AAA

* Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Loíza Valley (FAAST) #NRW #JG: se entregó diseños (90%). Se proyecta comienzo labores de construcción en el segmento Urb. Loíza Valley en Octubre 2025.



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Emergency Generator Phase III (CIP. 0-80-1002M)*

Estimado de construcción	\$2,798,905.32
Estimado de inversión	\$3,451,296.00
Estatus:	En construcción. Equipo y plataforma existente removidos). Generador disponible en Puerto Rico. Porciento progreso: 100% (diseño), solo rediseño de pad de concreto para evitar conflictos con tubería agua existente. Trabajos civiles próximo a comenzar.
Fuente de financiamiento	AAA

*EB TK Campo Rico (El Comandante): \$277,916.00



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Emergency Generators Phase IV (CIP. 0-80-1003M)*

Estimado de inversión \$9,773,880.00

Estatus: En construcción (12%). Contratista realizando las evaluaciones y los diseños de las distintas facilidades. Se estima duración construcción 900 días.

Fuente de financiamiento CWSRF-BIL, AAA

* Proyecto adjudicado a Three O, LLC por el monto de \$7,661,236.54 dólares el 15-Oct-2024. Reunión Pre-Construcción 24-Oct-2024. Comienzo de Construcción 4-Nov-2024.



No.	Facility	Tipo de Instalación	Municipality
1	EBAS SAN ISIDRO	EBAS	Canóvanas



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Municipio de Canóvanas

Rehabilitación de Tanques Fase I – Metro (CIP. 1-00-9001)*

Estimado de construcción \$2,967,036.30

Estimado de inversión \$4,945,740.00

Estatus: Proyecto Completado (100%).

Fuente de financiamiento FEMA, CDBG-DR, AAA



* **1. Las Haciendas (100%):** \$290.950 (construcción)

2. El Comandante (100%): \$315,742 (construcción)

Las Haciendas



El Comandante

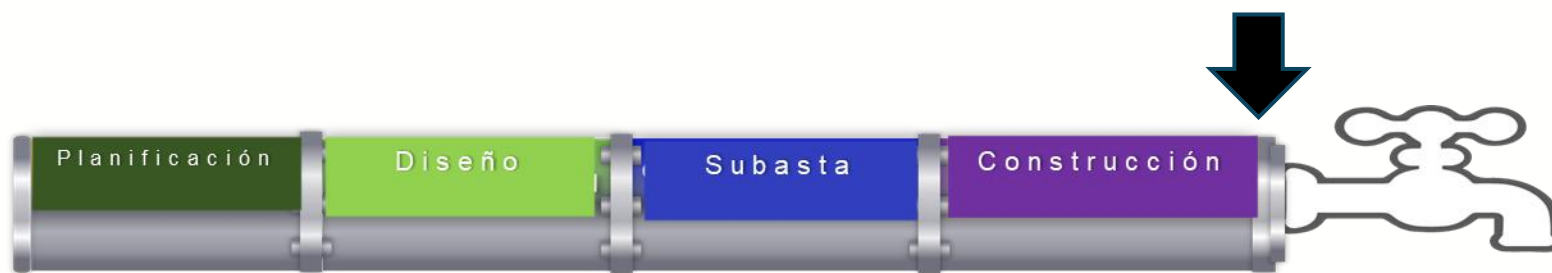

Área Metro



AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

AAA

GOBIERNO DE PUERTO RICO



Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Región Metro

D&B Rehabilitation of Wastewater Pump Station - Metro Region (CIP. 1-00-9007)*

Estimado de construcción \$15,000,000.00

Estimado de inversión \$20,000,000.00

Estatus: En proceso de planificación (PLA-50), comienzo de diseño programado para el último trimestre del 2025 y anuncio de subasta para el último trimestre del 2026.

Fuente de financiamiento CWSRF-SAHFI, AAA

* Proyecto incluye la rehabilitación de varias estaciones de bombas sanitarias (EBAS) en los municipios de Bayamón, San Juan (*EBAS Conquistador II, EBAS Trujillo Puente, EBAS Villas del Sol, and EBAS Lomas de Trujillo*), Carolina (*EBAS Torrecillas y EBAS Villa Carolina*) y Guaynabo.

* Taller de diseño (mem. técnico 50%) fue llevado a cabo 30/junio/2025.



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Región Metro

D&B Emergency Generators - Drinking Water - Metro Region (CIP. 1-00-9005)*

Estimado de construcción	\$2,500,000.00
Estimado de inversión	\$4,000,000.00
Estatus:	Diseño Completado (100%). Anuncio de subasta fue llevado a cabo 27/junio/2025. Apertura 7/oct/2025.
Fuente de financiamiento	DWSRF-SAHFI, AAA

*Reemplazo generadores de emergencia en varias instalaciones.

Región	Municipality	Operational Area	EB	Fase 5/5.5	Prioridad	Costo
Metro	Carolina	Carolina	EB	EB Metropolis	1	\$ 726,900.00
Metro	Carolina	Carolina	EB	EB Arrayanes I	1	\$ 503,400.00
Metro	Carolina	Carolina	EB	EB Santa Sapo	1	\$ 726,900.00
Metro	Carolina	Carolina	EB	EB El Trompito	1	\$ 500,400.00
Metro	Guaynabo	Guaynabo	EB	EB Sunset Hill	2	\$ 237,000.00



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada

Resumen de Proyectos de Infraestructura (PMC) Región Metro

D&B Emergency Generators – Wastewater Metro Region (CIP. 1-00-9008)*

Estimado de construcción	\$4,350,000.00
Estimado de inversión	\$7,000,000.00
Estatus:	Diseño Completado (100%). Anuncio de subasta fue llevado acabo el 27/junio/2025. Apertura 30/sept/2025.
Fuente de financiamiento	CWSRF-SAHFI, AAA

*Reemplazo generadores de emergencia en varias instalaciones.



Región	Municipality	Operational Area	EBAS	Fase 5/5.5	Costo
Metro	San Juan	San Juan	EBAS	EBAS PISCINA OLIMPICA (ESCAMBRON)	\$ 215,700.00
Metro	Toa Baja	Bayamón	EBAS	EBAS LEVITTOWN 1	\$ 654,400.00
Metro	Trujillo Alto	San Juan	EBAS	EBAS CIUDAD SEÑORIAL (PORTAL DE LAS CUMBRES)	\$ 216,600.00
Metro	San Juan	San Juan	EBAS	EBAS LA PERLA	\$ 507,400.00
Metro	Canóvanas	Carolina	EBAS	EBAS CIUDAD JARDIN (RIVER VALLEY)	\$ 494,200.00
Metro	Guaynabo	Guaynabo	EBAS	EBAS SANTA ELENA I	\$ 654,500.00
Metro	Guaynabo	Guaynabo	EBAS	EBAS PRADO ALTO	\$ 308,200.00
Metro	Trujillo Alto	San Juan	EBAS	EBAS ENCANTADA (RIO CRISTAL)	\$ 358,600.00
Metro	Toa Alta	Bayamón	EBAS	EBAS MONTEVERDE	\$ 308,200.00
Metro	San Juan	San Juan	EBAS	EBAS SAN FERNANDO	\$ 309,400.00
Metro	Trujillo Alto	San Juan	EBAS	EBAS JARDINES DE TRUJILLO	\$ 309,400.00



-  Status
-  Inicio del diseño
-  Anuncio de Subasta
-  Notificación de inicio construcción
-  Construcción finalizada
