



## GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Secretaría | Dra. Yanira I. Raíces Vega | raices\_y@de.pr.gov

8 de febrero de 2024

Sr. Yamil Rivera Vélez  
Secretario  
Senado de Puerto Rico  
El Capitolio  
PO Box 902228  
San Juan, PR 00902-2228

**Re: Petición de Información del Senado núm. 2024-0016**

Estimado señor secretario:

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) recibió la Petición de Información núm. 2024-0016, presentada por la senadora Santiago Torres el pasado 22 de enero y aprobada por el referido cuerpo. En esta, se solicitaba información relacionada con varias escuelas localizadas en el municipio de Cayey. Específicamente, las siguientes escuelas:

1. Benigno Fernández García;
2. Elemental Salvador Brau;
3. Emérita León; y,
4. Miguel Meléndez Muñoz.


En respuesta a este requerimiento, proveemos la información con la que cuenta nuestra agencia.

Nos complace notificarle, que las iniciativas de las 4 escuelas se encuentran con un 40 % completadas, 30 % en construcción y un 30 % en la etapa de planificación para ser subastadas, tal como ilustra la *Gráfica 1*.

*Gráfica 1*



*Gráfica 2*

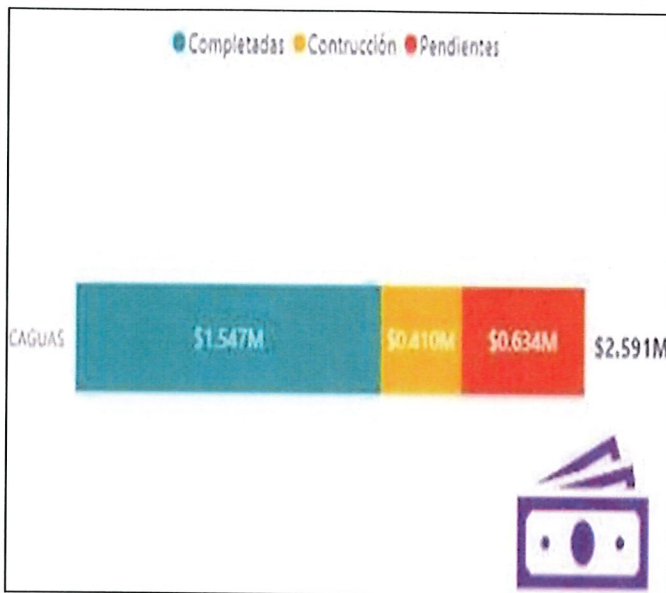

Estos trabajos son subvencionados con fondos federales disponibles a través del Programa de Ayudas de Emergencia para las Escuelas Elementales y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés); la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés); como también fondos estatales, para una inversión total de \$2.591 millones; tal como ilustra la *Gráfica 2*.

A continuación, ofrecemos datos específicos a cada escuela.

Esperamos que la información provista sea de utilidad para los trabajos que realiza el Senado de Puerto Rico. Quedamos en la mejor disposición de colaborar en iniciativas futuras.

Atentamente,

Yanira I. Raíces Vega, Ed. D.  
Secretaria

Anejo





GOBIERNO DE PUERTO RICO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Infraestructura y Reconstrucción

Code	School Name	Region	City	Address	Initiative	Responsible Agency	Maintenance	Program	Scopes	School Project Status	Progress %	Start Date	End Date
21089	Benigno Fernández García	CAGUAS	CAYEY	Calle Barbosa Final Cayey PR 00737	Columnas Cortas II	AFI	OMEPE	ESSER-III	Special Construction - Mitigation of Short Columns	Construction - Contract Procurement	0	10/12/2023	3/10/2024
					Subasta de Emergencia I	DE	OMEPE	ESSER-II	Doors / Windows & Interiors - Hardware, Doors / Windows & Interiors - New Doors, Doors / Windows & Interiors - New Window Screens, Electrical - Distribution, Finishes - Acoustical Ceilings, Finishes - Cement Plaster, HVAC - Equipment, Plumbing Distribution - Replacement, Plumbing Fixtures - Bathrooms, Specialties - Bathroom Partitions, Specialties - Identifying Devices	Construction	75	2/24/2023	3/16/2024
					Back to School 2023-2024	OMEPE	OMEPE	State Funds	Doors / Windows & Interiors - Window Repairs, Finishes - Exterior Paint	Construction	0	11/18/2023	10/31/2023
21188	Emérta León ( Elemental )	CAGUAS	CAYEY	Urb. Villa Verde 118 Calle Luis Morales Cayey PR 00737	Columnas Cortas I	AFI	OMEPE	ARPA	Special Construction - Mitigation of Short Columns	Notice of Acceptance	100	3/8/2022	10/27/2022
					Subasta de Emergencia I	DE	OMEPE	ESSER-II	Doors / Windows & Interiors - New Window Screens, Electrical - Bell System, Electrical - Distribution, Electrical - Lighting, Finishes - Acoustical Ceilings, HVAC - Equipment, Mechanical - Fire Protection System, Mechanical - Fume Hood, Plumbing - Grease Trap, Plumbing Fixtures - Bathrooms, Sitework - Landscape, Specialties - Bathroom Partitions, Specialties - Identifying Devices	Construction	70	2/24/2023	3/16/2024
23531	Miguel Meléndez Muñoz ( Superior )	CAGUAS	CAYEY	Ave. Antonio R. Barceló Frente Cuc Cayey PR 00737	Columnas Cortas II	AFI	AEP	ESSER-III	Finishes - Exterior Paint, Finishes - Interior Paint, Special Construction - Mitigation of Short Columns	Construction - Contract Procurement	0	1/15/2024	6/13/2024
					ASG23J-08274 – Sellado de Techos – Fase 4	DE	AEP	ESSER-III	Thermal and Moisture Protection - Roof	Construction - Contract Procurement	0	10/2/2023	4/30/2024
28084	Salvador Brau Elemental	CAGUAS	CAYEY	JARDINES I CALLE 13 FINAL	Columnas Cortas I	AFI	AEP	ARPA	Special Construction - Mitigation of Short Columns	Notice of Acceptance	100	1/18/2022	6/20/2022
					ASG19-255C – Sellado de Techos – Fase 1	DE	AEP	ESSER-II	Thermal and Moisture Protection - Roof	Notice of Acceptance	100	6/20/2022	9/17/2022
					ASG22-2841 – Rehabilitación de Escuelas – Fase 1	DE	AEP	ESSER-II	Finishes - Exterior Paint, Finishes - Interior Paint	Notice of Acceptance	100	8/2/2022	12/8/2022

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acoso.
