Enviar
Copia a la
Comisión de Urbanismo
e Infraestructura

SENADO
PUERTO RICO

Secretaría

MANUEL A. TORRES NIEVES
SECRETARIO DEL SENADO

- ☐ Ver al dorso
- ☐ Para su información
- ☐ Notas
- ☐ Para mantenerle al día
- ☑ Expediente
- ☑ Dar Cuenta
- ☐ Registrar y Procesar

Senado
DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO
PO Box 9023431
San Juan, Puerto Rico
00902-3431

T: 787.722.3460
787.722.4012
F: 787.723.5413
E: mantorres@senadopr.us
W: www.senadopr.us

Iniciales

Oficina del Presidente

Katherine Erazo
CHIEF OF STAFF

Fecha 9 de febrero de 2015

Referido a Manuel Torres

- ☐ Para su información
- ☐ Evaluar y recomendar
- ☐ Para trabajar y contestar directamente
- ☐ Dar cuenta al cuerpo
- ☐ Para otorgar contrato
- ☐ Para nombramiento
- ☐ Autorizado

Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados
GOBIERNO DE PUERTO RICO

604 Barbosa Avenue
Hato Rey, PR 00917-4310
P.O. Box 7066, San Juan, PR 00916-7066
Tel. (787) 999-1717 Ext. 1117
Fax (787) 993-9140

INFRAESTRUCTURA

RECIBIDO SECRETARIA
SENADO DE P.R.
2012 FEB -9 PM 1:12
2012 FEB 14 AM 8:48

7 de febrero de 2012

POR MENSAJERO
Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
PO Box 9023431
San Juan, PR 00902-3431

Re: Informe a la Asamblea Legislativa

Estimada señora Presidenta:

En cumplimiento con la Ley 92, de 31 de marzo de 2004, Sección 143 (h), la cual enmendó la Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), le incluimos el informe de los status de proyectos de la AAA bajo el Programa de Mejoras Capitales. Dicho informe recoge las iniciativas y logros del Directorado de Infraestructura para el periodo del 2012 al 2016, según aprobado por la Junta de Directores mediante Resolución Núm. 2650, del 7 de septiembre de 2011.

A continuación le detallamos los documentos incluidos:

- Informe de Proyectos de Mejoras Capitales, aprobado por la Junta de Directores en septiembre de 2011.
- Presentación de Logros 2011 del Directorado de Infraestructura.

De tener alguna pregunta sobre el particular, no dude en comunicarse con este servidor al teléfono (787) 999-1717 ext. 1119.

Cordialmente,

Alberto M. Lázaro, P.E., BCEE
Director Ejecutivo de Infraestructura

xc: Ing. José F. Ortiz Vázquez – Presidente Ejecutivo
Directores Regionales AAA

SEDE

DO-17173

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Directorado de Infraestructura

Informe de Logros 2011

2 de diciembre de 2011



Infraestructura

- Ejecución Plan de Mejoras Capitales:
  - Subastas:
    - Anuncios de Subasta:
      - **47** Anuncios de Subastas Formales (Inversión $667 M)
      - **14** Invitaciones de Subastas Informales (Inversión $10 M)
    - Implantación de Portal Electrónico de Subastas (www.aaasubastas.com)
  - Contratos:
    - **60** Contratos Firmados
      - Inversión sobre $175 M

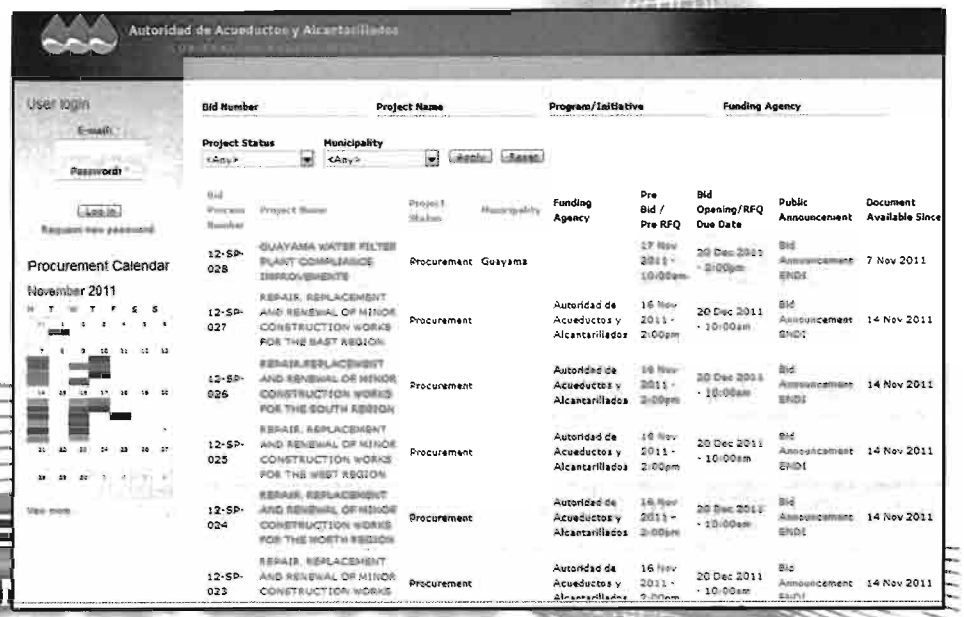

Infraestructura

- Ejecución Plan de Mejoras Capitales:
  - Primeras Piedras:
    - PMC: **23** proyectos (Inversión **$108 M**)
    - OCM: **25** proyectos (Inversión **$10 M**)
  - Inauguraciones:
    - PMC: **26** proyectos (Inversión **$248 M**)
    - OCM: **18** proyectos (Inversión **$5 M**)
  - Plantas Eliminadas: 5
    - PAS Utuado Vieja, PAS El Torito, PAS Playa Santa, PAS La Parguera, PF Perchas

OCM = Obra de Construcción Menor

Infraestructura

- Represa y Sistema de Acueducto del Valenciano
  - Estamos moviendo adelante un proyecto que lleva más de 40 años en planificación
  - **Inversión: $250 M**
  - Beneficios:
    - El proyecto reducirá la dependencia del Área Metropolitana y redundará en abastos de agua adicional para necesidades futuras
    - **Familias Beneficiadas:**
      - 52,500 directamente
      - 450,00 indirectamente
    - **Creación de Empleos:**
      - 2,700 empleos directos e indirectos

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Infraestructura

- Represa y Sistema de Acueducto del Valenciano
  - "Industry Outreach"
    - Llevado a cabo con éxito en Junio 1, 2011
  - Fase 1: Planta de Filtración 7 MGD
    - Anuncio de Subasta: Agosto 2011
  - Fase 2: Represa, Expansión PF y Sistema de Distribución
    - Solicitud de Calificaciones: Septiembre 2011
    - 6 Solicitudes Recibidas:
      - ACCIONA, Conalvias/FCC/Aqualia, Consortium Grupo Odinsa/Integra, Dragados USA/ACS, B&V, Ferrovial Agroma y OHL Group.

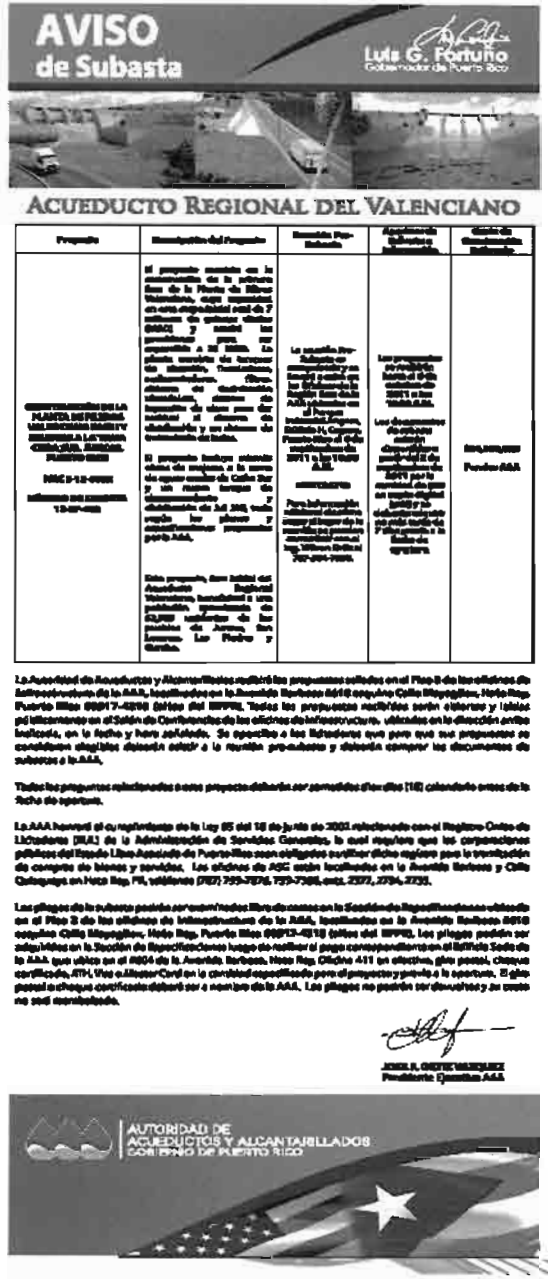

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y A

GOBIERNO DE PUERTO

Infraestructura

RECOVERY.GOV

- Proyectos ARRA
  - **22** proyectos
  - Fondos Asignados: **$102 M**
  - Población Beneficiada: Más de Medio Millón
  - Empleos Generados: 1,450
  - Avance de Proyectos:
    - Terminados (Cierre): 8 proyectos
    - Arranque: 2 proyectos
    - Construcción: 12 proyectos
  - **Auditorías** (OIG, EPA Región 2 y EPA Headquarters)
    - Más de 10 auditorías durante el año 2011
    - Recibimos felicitaciones por el cumplimiento sobresaliente con los requerimientos ARRA en TODOS los proyectos

Infraestructura

PEC CRIOLLO
PLAN DE ESTÍMULO

- Proyectos Estímulo Criollo (PEC)
  - 2 proyectos
  - Fondos Asignados: $12.5 M
  - Familias Beneficiada: 2,900
  - Empleos Generados: 90
  - Avance de Proyectos:
    - Guánica: Completado e Inaugurado por el Gobernador
    - Yauco: 75%

AUTORIDAD DE ACUEDUC
GOBIERNO DE
GREEN AGENCY

Infraestructura

- Planificación
  - Ambiental, Recursos de Agua y Permisos
    - Se tramitaron aproximadamente 80 exclusiones categóricas
    - Apoyo a Operaciones, Emergencias y Legal (reclamaciones) con Análisis Geológicos, se atendieron 25 casos.
    - Apoyo en el trámite de franquicias para las fuentes de agua superficial y subterránea
    - Evaluación de aproximadamente 500 documentos ambientales con la nueva oficina de permisos (OGPE)

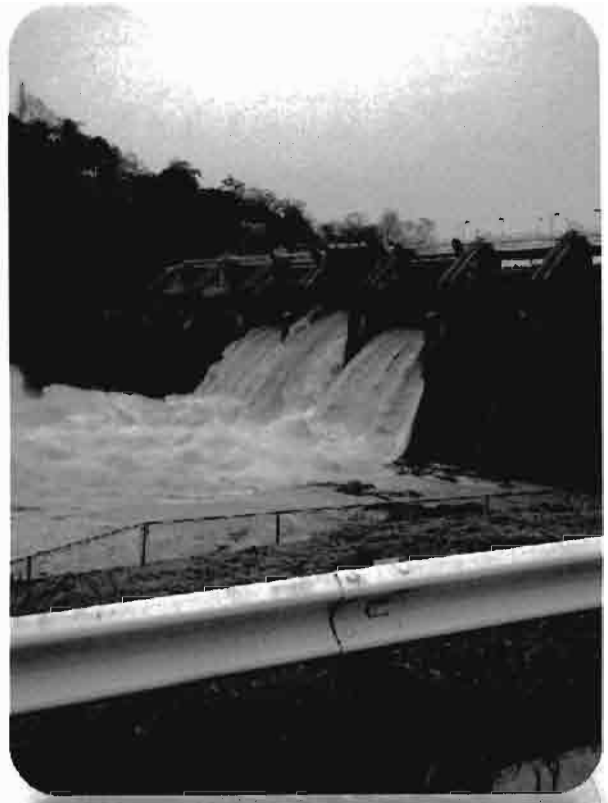



Infraestructura

- Modelaje Hidráulico y Apoyo Técnico
  - Se realizaron 10 modelos hidráulicos
    - Cabo Rojo
    - Mayagüez
    - Patillas-Guayama
    - Sabana Grande
    - Encantada
    - Yab coa
    - Las Marías
    - Carolina
    - Orocovis
    - Guzmán Arriba
    - Salinas
  - **Los resultados permitieron eliminar facilidades, mejorar el servicio, separar áreas de distribución, e incrementar la operación sostenible del sistema.**

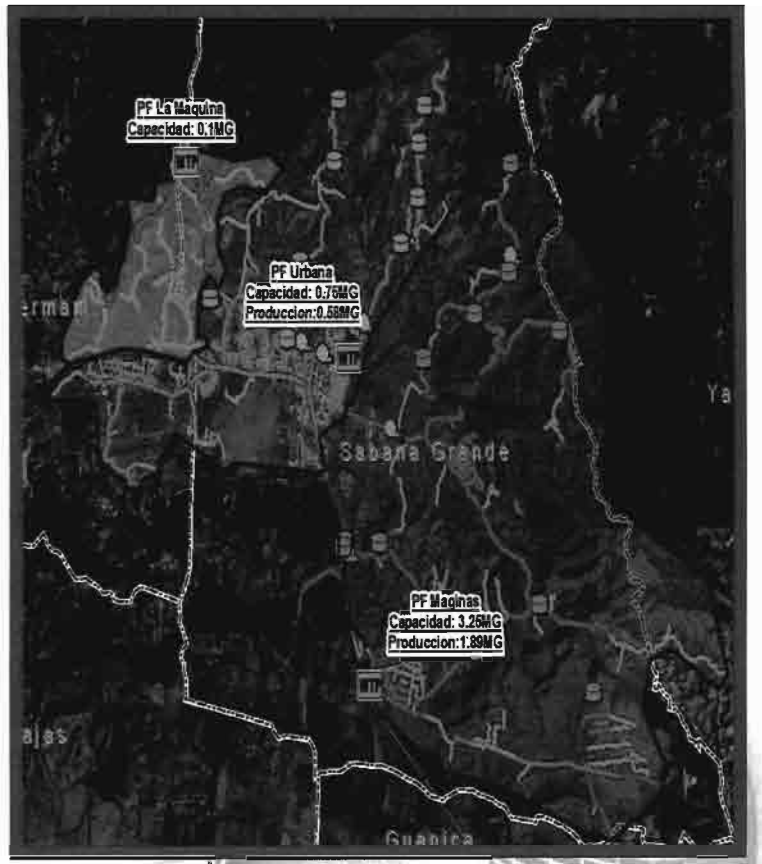



Infraestructura

- Sistema de Información Geográfica (GIS)
  - Implementación de AQUAWEB y un "Link" con información hidráulica
  - Se realizaron talleres en las Regiones Oeste y Sur
  - Se logró establecer comunicación con los diferentes departamentos de la Autoridad (Región Oeste)
  - Se logró mantener y guardar información de los proyectos nuevos y viejos tanto de PPP como de Infraestructura (Región Oeste)
  - Digitalización de aproximadamente 150 proyectos de PPP
  - Se ha incluido la información de los cambios que han realizado las diferentes áreas operacionales, así como los proyectos de obra menor

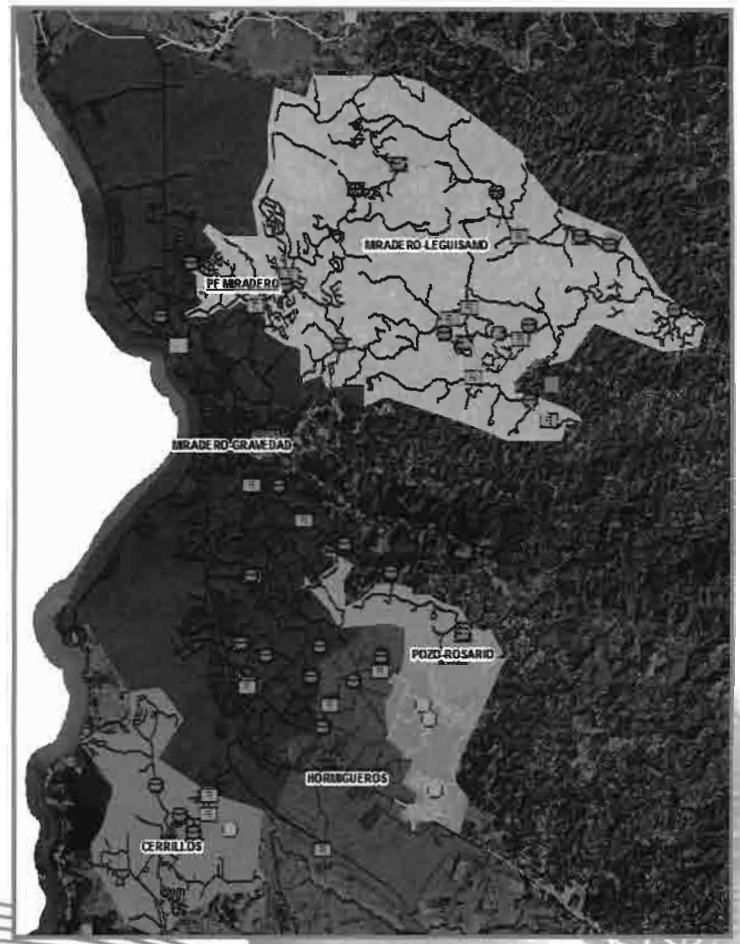

Infraestructura

- **Proyectos Especiales**
  - Evaluación para Dragado Carraizo
  - Evaluación del Caño Tiburones
  - **Plan Maestro**
  - **Sectorización Hidráulica y Esquemáticos**
    - **Se sectorizó por área de servicio, la totalidad del sistema de distribución de la AAA. Aprox. 180 áreas de servicio y 600 sectores**
  - Se preparó la solicitud de propuestas del **Catastro de Clientes** y de **Lectura Remota** de Grandes Clientes
  - **Formación Exitosa del Grupo de GIS y Modelaje de la AAA**

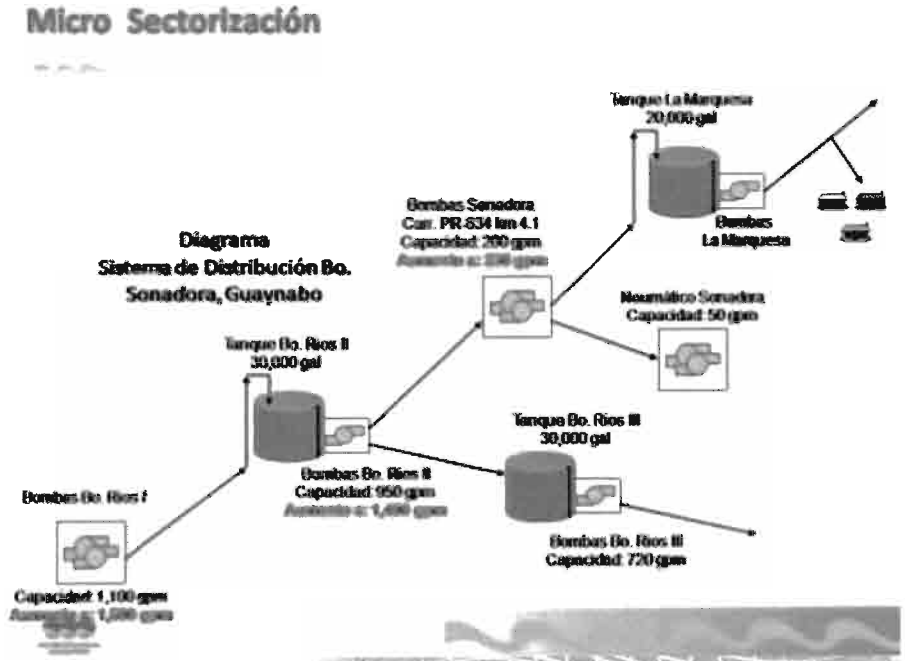

Infraestructura

- Sistema Financiero para Manejo del PMC (SFPMC)
  - **Beneficios:**
    - Ya no es un archivo de Excel
    - Mayor control y estabilidad
    - Múltiples usuarios a la vez
    - Está atado a SAP
    - Se reduce al mínimo el riesgo de perder el archivo
  - Se compone de cuatro fases:
    - **Fase 1- Conversión de Archivo Excel a Base de Datos**
      - En funcionamiento desde Julio 2011
      - Reside en servidos de la AAA
      - 33 formatos de informes
      - Módulo de "Report Builder"

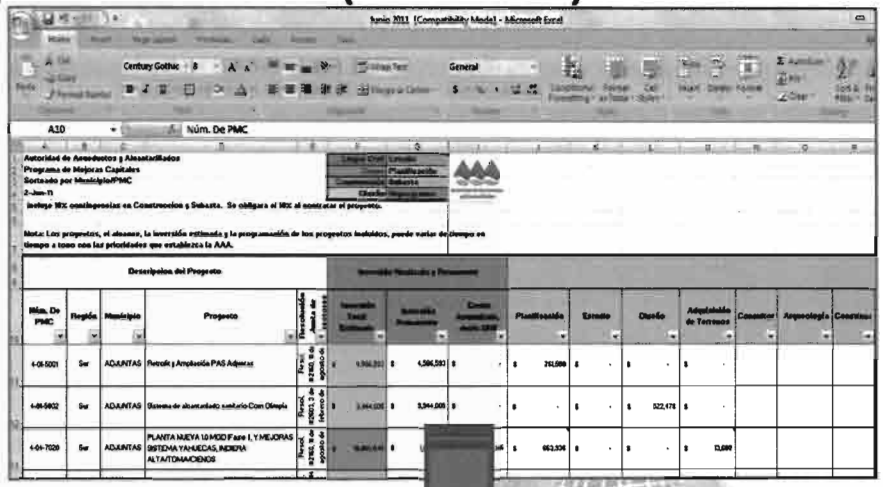

AUTORIDAD DE ACUED
GOBIERNO
GREEN AGENCY

Infraestructura

- **Contrato Regionales -Obras de Construcción Menor**
  - **Descripción:**
    - Proveer apoyo a Operaciones con brigadas eléctricas, mecánicas y de obras generales para llevar a cabo reparaciones, reemplazos y rehabilitaciones en infraestructura de la AAA (Tuberías, EBs, Pozos, Plantas, entre otros)
  - **Beneficios:**
    - Agilizar la ejecución de obras de construcción menor de manera eficiente y costo efectiva (desde el punto de vista administrativo, gerencial y de construcción)
  - **Logros:**
    - Se estableció un Comité compuesto por Directores de Operaciones, Compras, Legal e Infraestructura para conformar el ámbito y contrato.
    - Se completó ámbito y paquete de subasta expéditamente
    - Anuncio de Subasta: Octubre 2011
  - **Metas Esperadas:**
    - Tener los contratistas y respectivas brigadas listas para comenzar en el primer trimestre del 2012.
    - Llevar a cabo las obras en menor tiempo y de manera costo efectiva que redundará en beneficios no tan solo económicos, sino en lograr cumplimiento con los distintos requerimientos que tiene la Agencia.

Infraestructura

- Inicitavias de Energía
  - Acuerdos de Compra de Energía (PPAs)
    - **Dos proyectos Contratados**
      - Eólica: 9.75 MW en 8 facilidades
      - Waste to Energy: 14 MW en Yabucoa
    - **Dos proyectos en etapa de contratación**
      - Waste to Energy: 10 MW en Aguada
      - Solar: 0.7 MW en Culebra
  - Reducción de Consumo de Energía:
    - Mediante "Energy Perfomance Contracting" (EPCs)
    - Ya se negocian contratos en instalaciones iniciales con potencial de ahorros mayor a $5 M

Infraestructura

- Hidroeléctricas
  - La Junta de Directores de la AEE aprobó el 28 de octubre de 2011, la Resolución Núm. 3861 en la que autorizó el traspaso y la venta a la AAA de todos los Sistemas de Riego y los Sistemas Hidroéléctricos.
  - **El Directorado de Infraestructura de la AAA lidera este esfuerzo:**
    - Análisis preliminar de viabilidad y costo efectividad
    - Se redactó un proyecto de ley para que se traspase con todas las facultades y obligaciones los diez sistemas de Riego e Hidroeléctricos del Gobierno de Puerto Rico y el Programa Estatal de Inspección y Reglamentación de Presas y Embalses.
    - Se redactaron los borradores de resolución de la Junta de Directores de la AEE y de la AAA
    - Análisis económico en coordinación con la AEE y con el Banco Gubernamental de Fomento en el período de transición
  - **Beneficios para la AAA:**
    - Oportunidad de ahorros en el gasto de energía de la AAA de **$30 M a $90 M** anuales.
    - La transferencia redundará en mejorar el servicio de agua potable a la vez que contribuirá a hacer más costo efectiva la operación de la AAA.
    - La transferencia dará mejor control a la AAA de los recursos hídricos del país.

Infraestructura

- Apoyo a Otros Directorados
  - **Regiones Operacionales:**
    - Se llevaron a cabo reuniones durante el año entre Infraestructura y Operaciones para mantenernos alineados con las necesidades y reforzar el trabajo en equipo.
    - Se brindó apoyo en las siguientes actividades:
      - Preparación de ámbitos de trabajo, ejecución e inspección de proyectos
      - Ejecución de Declaraciones de Emergencia
      - Apoyo técnico en evaluaciones de facilidades y sistemas de recolección y distribución
      - Modelajes Hidráulicos y Optimización de Sistemas
      - Acuerdos (MOAs) con Municipios

Región	# "apoyos"
Norte	147
Sur	114
Este	60
Oeste	75
Metro	80

Infraestructura

- Apoyo a Otros Directorados
  - **Servicio al Cliente:**
    - El DE de Infraestructura y parte de su Staff están dedicando gran esfuerzo a apoyar a Servicio al Cliente y las iniciativas de ingresos.
  - **Cumplimiento:**
    - Apoyo directo en Renegociaciones de Acuerdos con la EPA y el DS.
    - Preparación del "Affordability Study" de la AAA.
    - Participado directamente en negociaciones con el DS que ha redundado en la eliminación de multas.
    - Infraestructura ha sido clave en el cumplimiento de la Agencia con los Acuerdos establecidos (MCD, ATE y STS)
  - **Programa Mantenimiento Preventivo:**
    - Preparación de planillas para incorporar nuevas facilidades al PIMP.
    - Apoyo en instalación de equipo de Telemetría en la Región Oeste.

Infraestructura

- **Reconocimientos y Premios**
- **Obra sobresaliente categoría Agrimensura e Ingenería Civil Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico: Embalse Río Blanco**
  - **Regionalización y confiabilidad en el Sistema de Agua Potable**
  - Beneficia a los municipios de Naguabo, Humacao, Las Piedras, Vieques, Culebra y Yabucoa
  - El embalse tiene una capacidad de almacenaje para proveer más de dos meses de servicio ininterrumpido a 18 mgd y cerca de seis meses a 12 mgd sin recibir influjos del río
  - El embalse tiene una vida útil de más de 1,000 años
  - Obra ecoamigable
  - **Además de ser una instalación de reserva de agua se convierte en un tesoro natural para el Pueblo de Puerto Rico**

ASEGURANDO TU
PATRIMONIO...
AAA
GREEN AGENCY
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
2-11-6010	Norte	LARES	Mejoras sistema acueducto, toma, estación de bombas, tanques, PF e instalación de líneas de distribución	$ 8,424,162	$ 7,572,589	Jan-00	May-02	Jan-00	Cierre por Conveniencia	60	Acueducto	PFE	NM Crec	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-14-7120	Oeste	LAS MARIAS	PLANTA MODULAR BARRIOS BUCARABONES FASE I, JOSEFA/CIENOS, TANQUE 0.3 MG, ESTACION DE BOMBAS Y TOMA	$ 3,852,101	$ 33,413	Nov-98	Jan-03	Dec-11	Cierre - Litigio Civil	99	Acueducto	PF>C	M DOH	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-75-5000	Norte	VEGA BAJA	LATERALES Y TRONCAL SANITARIA, ESTACIONES DE BOMBAS, COM. SANDIN BO. PUERTO NUEVO	$ 15,611,269	$ 573,146	Jul-97	Jan-05	Jan-00	Cierre - Litigio Civil	89	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-01-6160	Metro	GUAYNABO	TECHO TANQUE DISTRIBUCION PLANTA FILTROS GUAYNABO	$ 8,105,026	$ 8,105,026	May-01	Jan-05	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	PFE	NM Cumpl	0.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-01-6170	Metro	GUAYNABO	D/C REHABILITACION DE LOS FILTROS(SAFE WATER TREATMENT) EN P.F. LOS FILTROS	$ 5,713,778	$ 5,713,778	May-00	Jan-05	Jan-00	Cierre - Litigio Civil	100	Acueducto	PFE	M Demanda	1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-01-6020	Oeste	RINCON	LINEA DE TRANSMISION DE 16" DESDE AGUADA Y TANQUE.	$ 4,898,669	$ 3,265,605	Feb-98	Aug-05	Jan-00	Cierre - Litigio Civil	100	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-11-6050	Este	COMERIO	CONSTRUCCION PLANTA FILTRACION 3.0 MGD, TANQUE 2.0 MG Y CIENOS, Bo Pinas	$ 17,191,031	$ (55,144)	May-01	Oct-05	Jan-00	CIERRE	99	Acueducto	PFN	NM Cumpl	1.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-38-5010	Norte	JAYUYA	NUEVA TRONCAL PRINCIPAL Y PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO 1.0 MGD	$ 14,854,454	$ (77,790)	Dec-01	Jan-06	Jun-11	CIERRE	100	Alcantarillado	PASN	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-03-6200	Oeste	SAN SEBASTIAN	TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE CIENOS PLANTA DE FILTRACION URBANA	$ 464,433	$ 464,433	Jan-96	Jan-06	Jan-00	Cierre - Litigio Civil	99	Acueducto	Cienos	NM Cumpl	0.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-12-6015	Este	SAN LORENZO	Aportación REHABILITACION DEL SISTEMA ACUEDUCTO CASCO URBANO - FASE I	$ 335,678	$ 2,828	Feb-04	Feb-06	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-12-5000	Oeste	CABO ROJO	ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD MONTEGRANDE	$ 6,171,888	$ 672,326	Sep-97	May-06	Jan-00	Cierre - Litigio Civil	76	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-13-7000	Sur	GUAYAMA	MEJORAS SISTEMA ACUEDUCTO BARRIOS CARITE Y GUAMANI - FASE I Y II (ELIMINACION P.F. CARITE)	$ 6,323,415	$ 92,579	May-00	Jun-06	Jan-00	CERRADO	100	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-13-7010	Sur	GUAYAMA	MEJORAS AL SISTEMA DE ACUEDUCTOS SECTOR CULEBRAS BO. GUAMANI (ELIMINACION P.F. GUAMANI)	$ 1,388,712	$ 195,787	May-00	Jun-06	Jan-00	CIERRE	98	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-33-5025	Este	GURABO	RECONSTRUCCIÓN REGISTROS SANITARIOS COMUNIDAD NAVARRO	$ 2,737,477	$ 80,301	Nov-01	Jun-06	Jan-00	Cierre por Conveniencia	20	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-03-7013	Norte	COROZAL	Rehabilitacion pulsador de Planta de Filtracion Negros y adiestramiento operadores, Fase I	$ 434,443	$ 169,322	Feb-06	Jun-06	Dec-11	CONSTRUCCIÓN	100	Acueducto	PFE	M DOH	1.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-15-6090	Sur	GUAYAMA	TERMINACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE CIENOS	$ 1,392,173	$ 89,056	Jul-98	Jul-06	Jan-00	CIERRE	98	Acueducto	Cienos	NM Cumpl	0.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-9800	ISLA	ISLA	ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA REDUCCION DE TURBIDEZ EN PLANTAS DE FILTRACION - FASE I	$ 632,946	$ 630,524	Jan-06	Jul-06	Jan-00	Estudio	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
4-35-5001	Oeste	HORMIGUEROS	APORTACION LATERALES SANITARIAS COM. LAVADERO - FASE I	$ 418,000	$ 232,259	Nov-04	Jul-06	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	50	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-36-7005	Norte	MOROVIS	Rehabilitación PF Morovis Sur, Fase I (Telemetria, rehab tanque pulsador, acuadores, iny de quimicos, ect)	$ 685,278	$ 439,079	Mar-06	Jul-06	Dec-11	CIERRE	100	Acueducto	PFE	M DOH	1.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-31-5000	Sur	GUAYANILLA	ALCANTARILLADO SANITARIO CARRETERA PR 127,BARRIO JAGUAS/PUEBLO DESDE Km 8.0 HASTA Km 11.6 (Troncal Magas)	$ 2,202,884	$ 112,734	Aug-03	Aug-06	Jan-00	Cierre - Litigio Civil	41	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-67-5001	Este	SAN LORENZO	Aportación REHABILITACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO FASE I	$ 585,573	$ 28,873	Jan-04	Aug-06	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Calidad	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-77-5000	Sur	VILLALBA	LATERALES SANITARIAS COMUNIDAD JAGUEYES	$ 797,115	$ 242,800	Jul-97	Oct-06	Jan-00	Cierre - Litigio Civil	52	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9-99-6247	Oeste	ISABELA	Construcción de la nueva Planta de Filtración de Agua de 5.0 mgd, Isabela	$ 7,983,030	$ 709,727	May-06	Nov-06	Jan-00	CERRADO	100	Acueducto	PFN	NM Cumpl	1.79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-29-5001	Sur	GUANICA	EXPANSION PLANTA ALCANTARILLADO EXISTENTE DE 0.8 A 2.2 MGD, FILTROPRENSA DE LODOS Y TUBERIA DESCARGA AL MAR	$ 18,552,489	$ 101,011	Dec-03	Mar-07	Jun-11	CIERRE	100	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-11-5036	Metro	BAYAMON	Estudio Influjo e infiltracion, Sistema Alcantarillado Sanitario Bayamon Centro, Fase I	$ 1,487,481	$ 139,617	Dec-06	Apr-07	Jan-00	Estudio	0	Alcantarillado	SAS	M Demanda	1.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-02-6001	Norte	COROZAL	Mejoras PF Urbana, Rehabilitacion Modulos PACER, Fase I	$ 512,216	$ 64,004	Jan-06	Apr-07	Dec-11	CIERRE	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-02-6000	Este	RIO GRANDE	Combinado: Acueductos de Rio Grande, Mejoras al sistema de acueductos	$ 490,300	$ 490,300	Sep-04	Apr-07	Jan-00	CIERRE	0	Alcantarillado	PAS>C	NM Crec	0.74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-61-5000	Este	RIO GRANDE	Combinado: Acueductos de Rio Grande, Mejoras al sistema de alcantarillados	$ 2,424,400	$ 2,424,400	Sep-04	Apr-07	Jan-00	CIERRE	0	Alcantarillado	PAS>C	NM Crec	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-2705	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (Nuevo Website AAA)	$ 205,589	$ 9,591	Jan-06	May-07	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-2709	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (Cambio de Dominio/Servicios Básicos)	$ 763,729	$ 371,032	Jan-06	May-07	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-2712	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (Procedimientos técnicos de Disaster Recovery)	$ 493,909	$ 493,909	Jan-06	May-07	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-40-5000	Este	JUNCOS	TRONCAL SANITARIA JUNCOS-GURABO Y ELIMINACION PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO JUNCOS (PER CAGUAS)	$ 11,515,955	$ 23,845	Jul-03	Jun-07	Jun-11	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-9007	ISLA	ISLA	Mantenimiento Preventivo	$ 1,161,371	$ 19,874	Jun-06	Jul-07	x	REN y Otros	0	PMP	Otros W&S	M EPA	1.74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-17-7005	Sur	GUAYANILLA	Pruebas de rendimiento y calidad de agua - Pozos Guaypao y Magas (Penuelas y Guayanilla)	$ 116,697	$ 295	Oct-06	Jul-07	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Abastos	NM Crec	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
3-23-7020	Este	LAS PIEDRAS	Combinado: Mejoras al sistema de distribución Pueblito del Rio (Las Piedras Combine, Corp.)	$ 2,280,598	$ 2,269,947	Nov-05	Aug-07	Jan-00	CIERRE	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-2007	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 237,075	$ 497	Jul-06	Aug-07	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-3007	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 12,115,894	$ 160,510	Jul-06	Aug-07	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-8007	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo, incluye $3.0m de 3 TS operacionales, $1.3m Wheeler Aibonito	$ 82,879,159	$ 2,541	Jul-06	Aug-07	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-01-7002	Oeste	AGUADA	Instalacion de valvulas reguladoras de presion	$ 372,131	$ 37,904	Apr-07	Oct-07	Jan-00	CIERRE	99	Acueducto	Redes	NM Calidad	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-03-7011	Norte	COROZAL	Mejoras al sistema de agua potable, nuevo tanque intermedio y rehabilitacion toma de aguas crudas y E/B, Bo. Negros	$ 3,854,854	$ 254,057	Nov-05	Oct-07	Dec-11	CIERRE	100	Acueducto	Redes	M DOH	1.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-33-5015	Este	GURABO	Combinado: construcción laterales sanitarias Bo. Navarro, desde Mega Tree Village hasta Santa Barbara PS	$ 1,639,912	$ 1,433,517	Dec-04	Oct-07	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	99	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-11-5012	Metro	BAYAMON	Rehabilitación EB La Rabua, Fase I (desviar 2.2 mgd al sist de Pto. Nuevo, limpieza, repar5ación de estructuras, instalacion de bombas, valvulas, metros, equipo control y transformadores)	$ 266,190	$ 110,601	Jan-07	Oct-07	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	EB	M Demanda	1.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-09-6002	Metro	TOA BAJA	Nueva conexion al Superacueducto	$ 739,241	$ 676,120	Mar-06	Jan-08	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Redes	NM Crec	1.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-30-5016	Sur	GUAYAMA	Terminación EB sistema sanitario Com. San Martin y eliminación EB Green Hill	$ 134,524	$ 134,524	Jul-07	Jan-08	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	EB	NM Cumpl	1.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-50-5020	Oeste	MAYAGUEZ	EVALUACIÓN Y DISEÑO MEJORAS ESTRUCTURALES DE TRONCAL DE ENTRADA PAS MAYAGUEZ	$ 179,355	$ 1,028	Sep-06	Jan-08	Jun-16	Estudio	0	Alcantarillado	PASE	M EPA	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-12-7070	Este	COMERIO	MEJS. SIST. DIST. AGUA DESDE PLANTA FILT. URBANA COMERIO HACIA BOS. PIÑAS,NARANJO,VEGA REDONDA,DOÑA ELENA,PALOMAS (FASE II,III,IV)	$ 29,148,098	$ 1,073,525	Jul-03	Jan-08	Dec-11	CIERRE	99	Acueducto	Redes	M DOH	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-09-6040	Metro	TOA BAJA	Rehabilitacion colectores aguas crudas, PF La Virgencita	$ 299,926	$ 81,303	Jan-06	Jan-08	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	PFE	NM Crec	1.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-66-5086	Metro	SAN JUAN	Reparacion y terminacion linea de 36" de agua potable atraves del Puente de la Constitucion, San Juan Water Front (REN-21130)	$ 684,135	$ 568,358	Jun-07	Feb-08	Jan-00	CIERRE	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-66-5080	Metro	SAN JUAN	Alimentador 38Kv EBAS Martin Pena	$ 292,575	$ 190	Aug-07	Feb-08	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	EB	NM Calidad	0.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-08-6001	Norte	HATILLO	Ren tuberia agua potable 2" por 4 y 6", cambio de acometidas, valvulas, derenajes, bocas de incendio Com Carrizales	$ 530,507	$ 82,391	Jun-07	Apr-08	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-66-5016	Metro	SAN JUAN	Inspeccion troncal sanitaria San Jose	$ 633,803	$ 37,606	Jul-07	Apr-08	Jan-00	Estudio	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
4-21-6000	Oeste	LAJAS	NUEVO LAGO REGULADOR 6 MG, TUBERIA TRANSMISION 16" Y TANQUE 5.0 MG - FASE II	$ 12,610,146	$ 56,424	Jul-06	Jul-08	Dec-11	CERRADO	100	Acueducto	Abastos	M DOH	1.58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-3008	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 7,559,264	$ 678	Jul-07	Jul-08	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-06-7015	Oeste	HORMIGUEROS	Pozo Eureka, 800 gpm en la PR 114 (Cancelado, transferido al 4-06-7016)	$ 578,270	$ 119,807	Jan-08	Jul-08	Jan-00	CIERRE	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-9008	ISLA	ISLA	Mantenimiento Preventivo	$ 7,332,888	$ 4,765	Jul-07	Aug-08	x	REN y Otros	0	PMP	Otros W&S	M EPA	1.74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-15-6092	Sur	GUAYAMA	2daTerminación del sistema de tratamiento y disposición de cienos (3-15-6090)	$ 1,091,312	$ 142,317	Dec-06	Aug-08	Jan-00	CIERRE	90	Acueducto	Cienos	NM Cumpl	0.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-69-5029	Sur	SANTA ISABEL	Mejoras PAS Urbana, Prevención de derrames al suelo y mejoras al sistema de cloracion, incluye barandas, parrilas y dos estaciones de monitoreo	$ 703,788	$ 133,057	Nov-06	Sep-08	Jan-00	CIERRE	98	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9-99-7076	Oeste	SABANA GRANDE	Expansión a la Planta de Filtración de Maginas	$ 16,171,433	$ 899,773	May-06	Sep-08	Jun-13	CONSTRUCCIÓN	99	Acueducto	PF>C	M STS	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-23-7002	Sur	OROCOVIS	Eliminación sistema Non-PRASA y conexión al sistema de distribución de agua potable para la comunidad La Sapia	$ 1,283,482	$ 1,278,998	Jan-07	Sep-08	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Crec	0.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-20-7005	Sur	MAUNABO	MEJORAS SISTEMA ACUEDUCTO BOS. CALZADA Y PALO SECO Y LOS SECTORES LOS LEBRONES, BO.TALANTE Y LOS SANCHEZ, BO. QUEBRADA ARENAS	$ 16,567,168	$ 1,208,103	Dec-99	Oct-08	Jan-00	CIERRE	99	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-58-5052	Sur	PONCE	Reemplazo tuberia sanitaria 12" en Calle Navarra hasta MH frente al Colegio Sagrado Corazon (Ave Emilio Fagot)	$ 2,594,808	$ 740,331	Jul-07	Oct-08	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	75	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-22-6020	Sur	VILLALBA	PLANTA FILTRACION ACEITUNAS (2 MGD) Y TUBERIA DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION, FASE I (ELIMINACION PF LA JULITA)	$ 20,577,373	$ 151,400	Jul-03	Oct-08	Dec-11	CIERRE	100	Acueducto	PFN	M DOH	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-66-5012	Metro	SAN JUAN	Terminación Rehabilitacion Incinerador de Puerto Nuevo (+ 9-99-5060)	$ 4,628	$ 548	Mar-07	Oct-08	Jan-00	CIERRE	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-67-5005	Este	SAN LORENZO	Combinado: PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO 1.5 MGD SAN LORENZO (DISEÑO Y MEJORAS) +3-67-5015	$ 2,363,208	$ 2,332,638	Jan-07	Nov-08	Jun-11	CONSTRUCCIÓN	99	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-31-5001	Sur	GUAYANILLA	Terminación Alcantarillado sanitario PR 127 Comunidad Jaguas (4-31-5000)	$ 4,620,653	$ 63,614	Apr-07	Nov-08	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-13-5060	Este	CAGUAS	TS Aguas Buenas Fase II -A & ELIMINACION CRUCE RIO CAGUITAS, E/B CAGUAS NORTE Y CONEXION A FASE II-A DE LA T.S. AGUAS BUENAS CAGUAS. Elimina 1 EB (+3-13-5049)	$ 3,827,073	$ 838,070	Aug-06	Dec-08	Jan-00	Cierre por Conveniencia	65	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-11-6011	Norte	LARES	TERMINACIÓN PLANTA FILTROS 4.0 MGD,TOMA,E/B,DISTRIBUCION Y LINEA TRANSMISION/TANQUE -RIO PRIETO	$ 22,224,820	$ 1,635,759	Dec-05	Dec-08	Dec-11	CIERRE	90	Acueducto	PFN	M DOH	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-32-7001	Norte	CIALES	Terminación sistema de distribución de agua Sector Pozas Fase II	$ 2,741,600	$ 314,359	Jan-07	Dec-08	Jan-00	CERRADO	100	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplim iento	Etapa	Ava nce %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Priori dad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
2-26-5001	Norte	DORADO	Alcantarillado Sanitario Comunidad Costa de Oro	$ 5,842,176	$ 191,074	Feb-07	Dec-08	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9-99-6235	Sur	COAMO	Sistema de Transmisión Agua Potable desde Juana Díaz a Coamo Fase I	$ 17,399,806	$ 802,153	May-06	Jan-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	95	Acueducto	Redes	NM Crec	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-58-5051	Sur	PONCE	Reemplazo bombas de entrada PAS Ponce (emergencia)	$ 2,551,747	$ 418,185	Sep-07	Jan-09	Jan-00	CIERRE	99	Alcantarillado	EB	NM Cumpl - SREN	1.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-58-5025	Sur	PONCE	Rehabilitacion troncal sanitaria, Fase I	$ 18,717,094	$ 62,266	May-07	Feb-09	Jun-16	CERRADO	100	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9-99-5060	Metro	SAN JUAN	Rehabilitación del Incinerador de Puerto Nuevo, San Juan	$ 17,882,842	$ 440,035	May-06	Mar-09	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-01-7061	Este	CAGUAS	Sistema de acueductos sector la Barra y la Mesa	$ 7,093,997	$ 432,474	Apr-07	Mar-09	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9-99-7070	Sur	VILLALBA	Nueva Planta de Filtración Toa Vaca de 7.5 mgd, Villalba	$ 49,221,145	$ 2,574,620	May-06	Apr-09	Dec-11	CONSTRUCCIÓN	95	Acueducto	PFN	M DOH	1.79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-77-6002	Sur	VILLALBA	Acuerdo Interagencial para la construcción de obra en la Carretera Estatal PR-149, Villalba / Mejoras al sistema de transmisión y distribución, inst 2,450 ml tub de 36" y 1,200ml de 30"	$ 9,239,788	$ 8,800,073	Apr-07	Apr-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	75	Acueducto	Redes	NM OTH	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-78-5000	Este	YABUCOA	Aportación al Municipio para el proyecto, Sistema Alcantarilados Sanitario Barrio Ingenio	$ 452,971	$ 452,971	Sep-08	Apr-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	OUT	Alcantarillado	SAS	NM OTH	0.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-80-6010	Sur	PONCE	MOA OBRAS INCIDENTALES A SOTERRADO DEL LIMITE DE PRIMER ORDEN DE LA ZONA HISTORICA EN COORD. A.E.E. FASE I y II (PONCE EN MARCHA) (+4-80-5000)	$ 11,973,180	$ 5,600,595	May-06	Apr-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	50	Alcantarillado	SAS	NM Calidad	0.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-16-7000	Oeste	SAN GERMAN	CONST. TANQUE LA TEA (220,000 G)	$ 2,035,704	$ 124,809	Jul-07	May-09	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-80-2016	Oeste	MAYAGUEZ	Nuevas Oficinas Regionales Area de Operaciones, calle Tenerife, Sultana (Teodoro transferira $100,000 para cubiri telefonía y camaras de seguridad)	$ 3,219,787	$ 668,151	Dec-07	May-09	Jan-00	CIERRE	100	Edificios	Otros W&S	NM OTH	0.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-71-5001	Metro	TOA BAJA	TERMINACION LATERALES MARISOL, KENNEDY, VEGAS Y CAMASEYES	$ 5,723,379	$ 961,565	May-08	May-09	Jan-00	CERRADO	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-12-6070	Este	HUMACAO	Combinado: WTP HUMACAO - CUMPLIMIENTO	$ 4,425,668	$ 4,385,551	Jul-08	Jun-09	Dec-11	CONSTRUCCIÓN	80	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-01-6231	Metro	TRUJILLO ALTO	PLANTA DE FILTRACION SERGIO CUEVAS, INSTALACION TUBERIAS DE DISTRIBUCION, FASE II	$ 35,522,795	$ 2,454,771	Aug-04	Jun-09	Dec-11	CIERRE	100	Acueducto	PFE	M DOH	1.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-66-5081	Metro	SAN JUAN	Rehabilitación troncal sanitaria Miramar, San Juan Water Front	$ 7,892,688	$ 96,404	Sep-07	Jul-09	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-09-7091	Norte	LARES	Línea de distribución eléctrica para el sistema de acueductos Bos. Espino y Pezuela de Lares y Bo. Charnorro de Las Marías	$ 2,350,969	$ 262,240	Mar-07	Jul-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	95	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
0-99-2009	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 4,579,144	$ 79,144	Jul-08	Jul-09	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-3009	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 2,200,704	$ 704	Jul-08	Jul-09	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-2008	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 213,871	$ 2,272	Jul-07	Jul-09	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-39-5005	Sur	JUANA DIAZ	Instalación sistema sanitario Comunidad Santa Marta	$ 6,062,478	$ 953,066	Sep-07	Jul-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	98	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-9001	ISLA	ISLA	SISTEMA CONTADORES DE LECTURA REMOTA	$ 8,113,750	$ 5,018,851	Jan-08	Jul-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	50	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-20-7002	Sur	MAUNABO	Instalacion sistema de disinfeccion de luz ultravioleta UV PR de Lizas	$ 461,576	$ 48,479	Mar-08	Jul-09	Jan-00	CIERRE	90	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-06-6031	Oeste	MAYAGUEZ	Mejoras sistema de acueductos, Fase B (Instalación 1600 ml de 36" PR 108 por ACT en AC-10821)	$ 2,286,083	$ 1,198,537	Feb-07	Jul-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	84	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-11-5013	Metro	BAYAMON	Rehabilitación EB La Rabua, Fase II (Diseño y constr nueva EB 10 MGD y tubería de descarga de 24", desviar a Pto Nuevo)	$ 5,309,706	$ 769,056	Dec-07	Aug-09	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	EB	M Demanda	1.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-75-5050	Norte	VEGA BAJA	Terminación LATERALES Y TRONCAL SANITARIA, ESTACIONES DE BOMBAS, COM. SANDIN BO. PUERTO NUEVO (2-75-5000)	$ 4,727,638	$ (55,984)	Jul-07	Aug-09	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-9009	ISLA	ISLA	Mantenimiento Preventivo	$ 16,505,620	$ 29,475	Jul-08	Aug-09	x	REN y Otros	0	PMP	Otros W&S	M EPA	1.74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-58-5084	Sur	PONCE	Acuerdo Interagencial para la construcción de obra en la Carretera Estatl PR-14, Ponce / Troncal sanitaria de 30" desde Río Bucaná hasta la Ave Fagot y la PR-14	$ 5,346,035	$ 5,346,035	Aug-07	Aug-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	75	Alcantarillado	SAS	NM OTH	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-2800	Metro	ISLA	Estudios de Planificacion	$ 2,542,400	$ 871,706	Jul-06	Aug-09	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-2801	Norte	ISLA	Estudios de Planificacion	$ 2,542,400	$ 1,226,468	Jul-06	Aug-09	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-2802	Este	ISLA	Estudios de Planificacion	$ 2,542,400	$ 2,411,023	Jul-06	Aug-09	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-2803	Oeste	ISLA	Estudios de Planificacion	$ 2,878,400	$ 296,804	Jul-06	Aug-09	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-2804	Sur	ISLA	Estudios de Planificacion	$ 2,206,400	$ 771,744	Jul-06	Aug-09	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9-99-5059	Norte	VEGA BAJA	Expansión y Mejoras a la Planta de Tratamiento de Aguas Usadas de Vega Baja	$ 18,996,495	$ (43,015)	May-06	Aug-09	Jun-11	CIERRE	99	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Priori dad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
3-19-7015	Este	NAGUABO	SISTEMA ACUEDUCTOS BO. MAIZALES - FASE II	$ 5,799,451	$ 699,617	May-06	Sep-09	Jan-00	CERRADO	100	Acueducto	Redes	NM Cumpl	1.45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-74-5005	Norte	VEGA ALTA	SISTEMA LATERALES SANITARIAS COMUNIDADES ESPINOSA Y PONDEROSA Y CONEXION A TRONCAL PRINCIPAL	$ 9,633,030	$ 432,763	Aug-07	Oct-09	Jan-00	CIERRE	99	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-8009	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo ($60k Ofic Com Bayamón, + $20,400 guagua Subdirector Infra, -$40,480 PAS Unibon)	$ 53,496,977	$ 9,674	Jul-08	Nov-09	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-52-5011	Norte	MOROVIS	Expansión de la PAS Unibon, Módulo de 80,000gpd	$ 2,341,720	$ 357,121	Dec-07	Nov-09	x	CIERRE	99	Alcantarillado	SAS	M EPA	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-12-7002	Este	SAN LORENZO	Acueducto Rural de San Lorenzo, Fase II y Fase III (+3-12-7003)	$ 5,595,051	$ 425,707	Dec-07	Nov-09	Jun-12	CIERRE	100	Acueducto	Redes	M STS	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-46-5001	Este	LUQUILLO	Troncal Sanitaria Luquillo - Fajardo	$ 19,410,691	$ 361,929	Nov-06	Nov-09	Jun-11	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-16-6015	Sur	PATILLAS	Combinado: Línea de transmisión Patillas - Salinas con E/B y Construcción tanque de reserva de 7.0 mg Fase I (Patillas - Arroyo)	$ 15,395,034	$ 13,872,788	Dec-07	Nov-09	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	100	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-22-7001	Sur	VILLALBA	Nueva EB 1 MGD, PF Toa Vaca, Mejoras al sistema de acueductos Sectores Palma Sola I, Camarones, Palma Sola II y Cerro Gordo	$ 2,840,024	$ 109,416	Jul-07	Nov-09	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	EB	NM Crec	0.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-63-5002	Oeste	SABANA GRANDE	ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD LA MAQUINA, BO. SANTANA	$ 9,485,891	$ 1,200,612	Sep-07	Dec-09	Jan-00	CIERRE	95	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-19-7011	Este	NAGUABO	PLANTA MODULAR CUBUY 0.5 MGD, CIENOS Y REHABILITACION TOMA RIO CUBUY Y TUBERIA AGUAS CRUDAS - FASE I-B	$ 9,499,169	$ 1,779,138	May-06	Jan-10	Dec-11	CONSTRUCCIÓN	97	Acueducto	PFN	M DOH	1.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-58-5080	Sur	PONCE	Reemplazo de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario Barriada Borinquen	$ 2,845,448	$ 434,368	Aug-07	Jan-10	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-06-6032	Oeste	MAYAGUEZ	Mejoras sistema de acueductos, Fase C (Instalación 1350 ml de 24" PR 2) & Fase D (Instalación 1250 ml de 24" PR 2) +4-06-6033	$ 3,055,330	$ 552,301	Aug-08	Jan-10	Jan-00	CIERRE	92	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1-09-6045	Metro	TOA BAJA	Diseño Construcción del Nuevo Sistema de acueductos Com. Villa Quintero y Esperanza	$ 2,012,193	$ 62,555	Mar-08	Jan-10	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Redes	NM Crec	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-11-6011A	Norte	LARES	Terminación segunda PLANTA FILTROS 4.0 MGD,TOMA,E/B,DISTRIBUCION Y LINEA TRANSMISION/TANQUE -RIO PRIETO	$ 2,952,083	$ 2,952,083	Dec-05	Jan-10	Dec-11	CIERRE	100	Acueducto	PFN	M DOH	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-09-7000	Sur	PONCE	Reemplazo sistema de acueductos Barriada Borinquen (ref 4-58-5080)	$ 1,773	$ 16	Oct-07	Mar-10	Jan-00	CIERRE	91	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-06-7003	Norte	UTUADO	Terminación EB aguas crudas en Lago Caonillas y mejoras a la linea de transmision (Ref 9-99-7057)	$ 4,480,671	$ 348,348	Jan-08	Apr-10	Dec-16	CERRADO	100	Acueducto	PF>C	M DOH	1.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-09-6035	Metro	TOA ALTA	Mejoras sistema de sedimentación / sólidos PF Enrique Ortega, Fase I (Mejoras a la floculación, sedimentación, remoción de sólidos, 12 tanques; constr nuevo feeder y transf de 13.2kv, reemplazar	$ 25,889,749	$ 3,056,136	Jun-07	Apr-10	Dec-21	CIERRE	100	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplim iento	Etapa	Ava nce %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Priori dad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
2-06-7000	Norte	NARANJITO	Mejoras de cumplimiento Naranjito-Anones, conexion a sistema Comerio	$ 5,341,025	$ 998,764	Sep-07	Apr-10	Dec-11	CIERRE	99	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-75-5052	Norte	VEGA BAJA	Terminación Expansion y Mejoras a la PAS Vega Baja (9-99-5059)	$ 717,496	$ 185,306	May-09	Apr-10	Jan-00	CERRADO	100	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-06-6034	Oeste	MAYAGUEZ	Mejoras sistema de acueductos, Fase E (instalación 1190 ml de 24" PR 102) Proyecto de ACT por AFI	$ 1,828,958	$ 1,823,771	Mar-07	May-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	65	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2-70-5016	Norte	TOA ALTA	Troncal Eliminacion PAS Toa Alta Height	$ 9,120,464	$ 1,681,427	Oct-07	May-10	Jun-11	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-04-7012	Oeste	AÑASCO	Mejoras al sistema de acueductos y eliminacion de sistemas Non-PRASA, Fase 2c Pinales	$ 3,214,532	$ 131,877	Sep-07	May-10	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Redes	NM Cumpl	1.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-07-2000	Norte	ARECIBO	Mejoras a las oficinas de Servicio al Cliente de Arecibo para ubicar las brigadas reasiganadas al Area de Operaciones	$ 86,946	$ 86,946	Jan-10	Jun-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Edificios	Otros W&S	NM Calidad	0.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4-06-5010	Oeste	AÑASCO	TRONCAL Y LATERALES SANITARIA LA PLAYA, HATILLO, QUEBRADA LARGA, CARACOLES Y PIÑALES	$ 20,650,094	$ 1,370,790	Dec-04	Jun-10	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 10,843	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,843
4-04-7020	Sur	ADJUNTAS	PLANTA NUEVA 1.0 MGD Fase I, Y MEJORAS SISTEMA YAHUECAS, INDIERA ALTA/TOMA/CIENOS	$ 10,860,034	$ 1,037,888	Nov-06	Jun-10	Jun-19	CIERRE	95	Acueducto	PFN	M STS	1.13	$ 8,672	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,672
0-80-2703	Este	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (GIS, Geographic Information System)	$ 5,736,997	$ 1,020,553	Dec-06	Jun-10	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 16,185	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,185
1-11-5063	Metro	BAYAMON	SUB-TRONCAL, ELIMINACION ESTACION DE BOMBAS SAN AGUSTIN Y LAS AMERICAS	$ 3,852,053	$ 289,108	Oct-07	Jul-10	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	EB	M Demanda	1.35	$ 7,087	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,087
7-42-5000	Norte	LARES	Renovación de 58 metros de tubería sanitaria de 8" en calle Colecturia	$ 68,867	$ 68,867	Jan-10	Jul-10	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-2010	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 4,163,616	$ (636,384)	Jul-09	Jul-10	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-3010	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 200,663	$ (3,099,337)	Jul-09	Jul-10	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-99-8010	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo, menos CIP Obras Menores	$ 43,702,136	$ 4,002,136	Jul-09	Jul-10	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ 179,504	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 179,504
1-80-2401	ISLA	ISLA	REMODELACION EDIFICIO SEDE - FASE III INFRAESTRUCTURA, Sede, Norte, Este, Oeste	$ 1,407,870	$ 595,175	Sep-05	Jul-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	99	Edificios	Otros W&S	NM OTH	0.44	$ 13,506	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,506
4-63-5010	Oeste	SABANA GRANDE	TRONCAL OESTE PR #2; LIBORIO,LLUVERAS, Fase I	$ 5,027,479	$ 498,421	Feb-07	Jul-10	Jan-00	CIERRE	92	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.62	$ 16,688	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,688
4-12-5035	Oeste	CABO ROJO	Terminanción alcantarillado sanitario Monte Grande	$ 5,927,454	$ 2,061,442	Feb-08	Jul-10	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 85,231	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85,231

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
3-22-6120	Este	NAGUABO	EMBALSE PLANTA DE FILTROS RIO BLANCO - (PER HUMACAO)	$ 168,877,718	$ 1,797,974	Apr-04	Aug-10	Dec-11	CIERRE	100	Acueducto	Abastos	M DOH	1.92	$ 43,698	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,698
0-80-2810	ISLA	ISLA	Mantenimiento Preventivo, Telemetría (PMP 2009)	$ 9,488,343	$ 2,556,779	Jul-09	Aug-10	x	REN y Otros	0	PMP	Otros W&S	M EPA	1.74	$ 207,377	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 207,377
0-99-9010	ISLA	ISLA	Mantenimiento Preventivo	$ 15,764,452	$ (1,335,548)	Jul-09	Aug-10	x	REN y Otros	0	PMP	Otros W&S	M EPA	1.74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-25-5005	Este	CULEBRA	SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 30,311,867	$ 2,059,334	May-06	Aug-10	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 80,666	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,666
0-80-5030	ISLA	ISLA	Mejoras Escuelas OMEP - eliminar pozos sépticos y conectarlas al sistema sanitario existente más cercano. Beneficia 3,400 estudiantes y personal escolar	$ 1,569,221	$ 1,569,221	May-10	Sep-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	0.7	$ 397,480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397,480
1-11-5014	Metro	BAYAMON	Estudio Influjo e infiltracion, Sistema Alcantarillado Sanitario Bayamon Centro, Fase II	$ 3,816,806	$ 2,520,002	Aug-08	Sep-10	Jan-00	Estudio	0	Alcantarillado	SAS	M Demanda	1.39	$ 233,505	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 233,505
4-06-6035	Oeste	MAYAGUEZ	Mejoras al sistema de acueductos Mayaguez Fase F, 875 ml de 24" por la PR 102 Sur Proyecto por AFI	$ 2,324,612	$ 2,145,164	Apr-09	Sep-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0	$ 262,090	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 262,090
7-58-9000	Sur	PONCE	Mejoras Control EB Brisas del Caribe 1 y 2	$ 115,036	$ 115,036	May-10	Oct-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	EB	NM Crec	0.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-09-7000	Norte	BARCELONETA	Construcción cuarto de cloro para el Pozo Vizcase	$ 75,212	$ 75,212	Jan-10	Oct-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - APlan	1.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0-80-2716	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - LICENCIAS MICROSOFT & ALTIRIS	$ 807,098	$ 162,437	Sep-08	Oct-10	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 16,589	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,589
0-80-2717	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - ALAMBRADO REDES LOCALES	$ 610,400	$ 519,884	Sep-08	Oct-10	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 53,419	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53,419
2-09-6002	Metro	TOA ALTA	Mejoras a la PF Enrique Ortega Fase II (instalar 2 EB de 20 MGD c/u, MCC y switchgear para las EB nuevas y para 5 existentes, constr 2da línea electr de 115 kv con subestación y transf de 13.2kv, incluye	$ 10,475,744	$ 2,089,996	Feb-08	Oct-10	Dec-11	CIERRE	95	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ 190,643	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 190,643
3-13-5051	Este	CAGUAS	Combinado: Mejoras sistema alcantarillado sanitaro Bo. Tomas de Castro	$ 1,557,600	$ 1,557,600	Aug-08	Oct-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	50	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-79-9000	Sur	YAUCO	Instalación de 610ml de tubería PVC DR-14 de 4", 30 acometidas, valvulas y ventosa en el Callejón Los Vélez Bo. Quebradas	$ 104,431	$ 104,431	Apr-10	Oct-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Crec	0.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-18-5000	Este	CAYEY	EXPANSION PAS DE 4.28 A 9 MGD, RELOCALIZACION E/B, ESTUDIO INFILTRACION, TANQUE RECIBIDOR DESCARGAS SEPTICAS	$ 70,470,244	$ 13,903,401	Mar-06	Oct-10	Jun-11	CONSTRUCCIÓN	99	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ 747,612	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 747,612
7-11-7001	Metro	BAYAMON	Instalación de 83 ml de tuberia de 4" PVC Camino Los Fonseca	$ 38,775	$ 38,775	May-10	Oct-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-32-7002	Metro	GUAYNABO	Instalación de 193 ml tubería de 4" de agua potable Camino Los Ríos	$ 87,151	$ 87,151	Apr-10	Oct-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplim iento	Etapa	Ava nce %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Priori dad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
2-09-6041	Norte	TOA ALTA	Constr Tanque de almacenamiento 1MG, Contorno, e inst 240ml de 12" para conectar a tuberia de EB La Virgencita	$ 4,751,693	$ 642,279	Nov-07	Oct-10	Jan-00	Cierre por Convenien cia	50	Acueduct o	Redes	NM Calidad	0.7	$ 58,763	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58,763
7-55-9003	Sur	OROCOVIS	Instalación de 1,750.7 ml tubería PVC SDR 14 de 4", 55 acomteidas, válvulas de línea, asfalto Barrio Bauta Arriba Sector Bauta Centro	$ 360,731	$ 360,731	Dec-09	Oct-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	0	Acueduct o	Redes	NM Crec	0.09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-55-9004	Sur	OROCOVIS	Instalación tuberia de 1,611 ml 2" dia, 23 acometidas en el Bo. Bermejales, Sector Buena Vista Carr 155 KM 17.2	$ 228,893	$ 228,893	May-10	Oct-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	0	Acueduct o	Redes	NM Crec	0.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-79-8000	Sur	YAUCO	Diseño y construcción sistema alcantarillados sanitario (290ml de tubería) conexión Escuela Benicia Vélez, Sector Susua Baja	$ 232,602	$ 232,602	May-10	Oct-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	0	Alcantaril lado	SAS	NM Crec	0.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-12-8000	Oeste	CABO ROJO	Aumento de capacidad de la troncal sanitaria de 8" a 10" y acometidas en Comunidad La Pileta	$ 704,196	$ 704,196	Apr-10	Nov-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	48	Alcantaril lado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8-32-6002	Metro	GUAYNABO	Optimización del sistema de distribución (1-32-6002)	$ 683,128	$ 646,817	Dec-09	Nov-10	Jan-00	CIERRE	100	Acueduct o	Redes	NM Calidad	1.04	$ 172,844	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172,844
8-09-6045	Sur	PONCE	Extención acueducto sectores Camino Viejo, Los Crotos y Parcelas La Yuca, Ref 4-09-6045	$ 1,332,912	$ 1,230,804	Oct-09	Nov-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	87	Acueduct o	Redes	NM Crec	0.75	$ 268,199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 268,199
8-09-6050	Norte	BARCELONET A	Optimización del sistema de distribución (Ref 8-09-6058 & 2-09-6050)	$ 420,499	$ 400,209	Dec-09	Nov-10	Jan-00	CIERRE	100	Acueduct o	Redes	NM Calidad	1.04	$ 113,304	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113,304
7-66-6002	Metro	SAN JUAN	Instalación de 565 mí de tubería de agua potable en las calles 5 y 19 de Villa Nevarez	$ 316,341	$ 316,341	Mar-10	Nov-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	0	Acueduct o	Redes	NM Calidad	0.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-55-9002	Sur	OROCOVIS	Instalación de 1,294ml de tubería de 4", 90 acometidas, hidrante y valvulas en el Bo. Cacao Sector Alturita	$ 295,924	$ 295,924	Mar-10	Nov-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	0	Acueduct o	Redes	NM Crec	0.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-52-9002	Norte	MOROVIS	Mejoras a la PF Morovis Urbano, renovación de tuberías, válvulas niples, medidores de flujo, puerta cuarto de control.	$ 156,466	$ 156,466	Jan-10	Dec-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	0	Acueduct o	PFE	NM Cumpl	1.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8-36-6001	Este	HUMACAO	Optimización del sistema de distribución (3-36-6001)	$ 442,277	$ 428,972	Dec-09	Dec-10	Jan-00	CIERRE	100	Acueduct o	Redes	NM Calidad	1.04	$ 140,877	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140,877
8-29-6000	Sur	GUANICA	Optimización del sistema de distribución (4-29-6000)	$ 223,396	$ 199,660	Dec-09	Dec-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	60	Acueduct o	Redes	NM Calidad	1.04	$ 65,831	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,831
4-06-7016	Oeste	HORMIGUERO S	Pozo Bajura, 800 gpm en la PR 114, capacidad 800 gpm (reemplaza al 4-06-7015) Default	$ 942,811	$ 932,205	Jan-10	Dec-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	8	Acueduct o	Abastos	NM Calidad	0.75	$ 300,834	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300,834
7-30-9002	Sur	GUAYAMA	Mejoras tanque distribución de Guayama PF Guayama: reemplazo de acceso, escaleras y sellado interior y exterior.	$ 65,602	$ 65,602	May-10	Dec-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	0	Acueduct o	Abastos	NM Cumpl - APlan	0.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-49-8002	Sur	MAUNABO	Mejoras EB Maunabo: parcela, verjas y otros. (Encuesta Sanitaria)	$ 29,652	$ 29,652	May-10	Dec-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	0	Acueduct o	EB	NM Cumpl - APlan	0.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7-64-9001	Sur	SALINAS	Rehabilitación Pozo Coco 4 y tubería salida: parcela, verjas y valvulas	$ 28,268	$ 28,268	May-10	Dec-10	Jan-00	CONSTRU CCIÓN	0	Acueduct o	Abastos	NM Crec	0.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-79-9001	Sur	YAUCO	Renovación sistema de distribución Sector Cambalache: 3,726ml de tubería de 4", bocas de incendio, 215 acometidas, drenajes y ventosas.	$ 170,204	$ 170,204	May-10	Dec-10	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Crec	0.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3-12-6002	Este	JUNCOS	Embalse Valenciano - Fase I	$ 24,994,349	$ 2,510,755	Jan-08	Jan-11	Jan-00	CIERRE	79	Acueducto	Abastos	NM Crec	2	$ 352,592	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 352,592
8-15-5001	Metro	CANOVANAS	Linea de fuerza de la estación de bombas Torrecillas, Fase I (1-15-5001)	$ 18,112,137	$ 9,181,352	Nov-09	Jan-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	86	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.43	$ 3,131,492	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,131,492
4-02-6000	Sur	YAUCO	SISTEMA DISTRIBUCION, TANQUE URBANO 2.0 MGD Fase III	$ 20,653,956	$ 8,090,906	Jan-08	Feb-11	Jan-00	CIERRE	89	Acueducto	Redes	NM Cumpl	1.83	$ 1,243,582	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,243,582
3-49-5005	Sur	MAUNABO	NUEVA PLANTA URBANA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1.0 MGD	$ 22,701,937	$ 2,923,995	Jun-07	Feb-11	Jun-11	CONSTRUCCIÓN	98	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ 411,646	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 411,646
8-66-6001	Metro	SAN JUAN	Optimización del sistema de distribución Cairnito (1-66-6001)	$ 573,632	$ 557,899	Dec-09	Feb-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	80	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 229,330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229,330
8-06-7002	Norte	UTUADO	PF Urbana de 2 a 3 MGD, EB Lago Caonillas y atender el problema de turbidez (2-06-7002)	$ 1,593,258	$ 982,983	Sep-09	Feb-11	Dec-16	CONSTRUCCIÓN	41	Acueducto	PF>C	M DOH	1.62	$ 337,016	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 337,016
3-25-6000	Este	CULEBRA	Mejoras RO para maximizar eficiencia de la planta y atender necesidades operacionales - Fase I	$ 520,468	$ 520,468	Jul-10	Feb-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	1.12	$ 324,850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324,850
7-32-7000	Metro	GUAYNABO	Reempalzo 300ml tubería de agua potable Camino Chiclana I Com. Caimito	$ 173,525	$ 173,525	Jul-10	Feb-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.53	$ 11,607	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,607
7-11-7000	Metro	BAYAMON	Instalación de 142 ml de tuberia de 4" PVC Bo. Buena Vista	$ 66,921	$ 66,921	Aug-10	Feb-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.65	$ 5,797	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,797
7-15-7002	Metro	CANOVANAS	Reemplazo de tubería galvanizada de 2" a PVC de 4" en las Parcelas Campo Rico calles 7, 9, y 11 del Bo. Campo Rico	$ 370,482	$ 370,482	Aug-10	Feb-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.87	$ 28,425	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28,425
7-50-9001	Oeste	MAYAGUEZ	Rehabilitación del camino a la toma de aguas crudas del Rio Canas	$ 175,322	$ 175,322	Aug-10	Feb-11	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0.99	$ 13,424	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,424
7-54-6000	Norte	NARANJITO	Instalación de sistema tube settlers y remoción de cienos de fondo clarificadores PF Cedro Arriba	$ 598,786	$ 598,786	Aug-10	Feb-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Cumpl - APlan	0	$ 45,942	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45,942
7-48-9001	Oeste	MARICAO	Mejoras a la Planta de Filtros Monte del Estado	$ 288,982	$ 288,982	Jun-10	Mar-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	33	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.34	$ 27,314	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,314
4-21-6215	Oeste	LAJAS	EXPANSION DE 2.2 A 6.0 MGD Y REHAB. PLANTA FILTROS URBANA, BACTERIOLOGIA, CIENOS	$ 21,095,956	$ 2,821,944	Oct-06	Mar-11	Dec-11	CIERRE	100	Acueducto	PF>C	M DOH	1.62	$ 357,004	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 357,004
4-22-6021	Sur	VILLALBA	MEJORAS SISTEMA DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE, Aceitunas FASE II	$ 24,340,978	$ 4,905,119	May-06	Mar-11	Jun-12	CIERRE	99	Acueducto	Redes	M STS	1.62	$ 576,682	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 576,682
7-11-6000	Metro	BAYAMON	Instalación de 176 ml de tuberia de 4" PVC Rexville	$ 99,472	$ 99,472	Aug-10	Mar-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.65	$ 17,702	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,702

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
2-47-5001	Norte	MANATI	Sistema de alcantarillado sanitario Sector Palo Alto	$ 2,735,498	$ 1,501,421	Dec-08	Mar-11	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Crec	1.1	$ 408,151	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408,151
7-49-9000	Sur	MAUNABO	Mejoras tanques Mariani, Emajagua I, Emajagua II y Boradaleza: cambio escoltillas, acceso, loza hormigón, verjas, boyas, sistema trolley, empañetado y resanado y otros. (Encuesta Sanitaria)	$ 235,872	$ 235,872	Jul-10	Mar-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - APlan	0.34	$ 33,432	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,432
4-15-6006	Sur	PONCE	Relocalización de sistema de agua potable en área del muelle del Puerto las Américas	$ 1,006,629	$ 921,700	Dec-09	Mar-11	Jan-00	CIERRE	100	Acueducto	Redes	NM Crec	0.57	$ 373,195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 373,195
4-58-5072	Sur	PONCE	RELOCALIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PUERTO DE LAS AMERICAS (APOYO PUERTO LAS AMERICAS)	$ 5,331,923	$ 5,264,810	Dec-09	Mar-11	Jan-00	CIERRE	100	Alcantarillado	SAS	NM Crec	0.74	$ 2,132,150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,132,150
4-41-5027	Oeste	LAJAS	Terminacion TRONCAL SANITARIA LA PARGUERA/LAJAS Y ESTACION DE BOMBAS (ELIMINACION PAS PARGUERA)	$ 8,496,166	$ 4,319,656	Oct-06	Apr-11	Jun-11	CONSTRUCCIÓN	57	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.35	$ 589,679	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 589,679
4-02-6015	Sur	YAUCO	NUEVA PLANTA DE FILTRACION URBANA DE 7 MGD, CIENOS Y MEJORAS A LA PLANTA EXISTENTE DE 1.6 MGD Fase I. (Incluye estudio de viabilidad Abasto de agua Valle de Lajas.)	$ 33,884,077	$ 21,961,191	Apr-09	Apr-11	Jun-13	CONSTRUCCIÓN	34	Acueducto	PFN	M STS	1.83	$ 6,513,596	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,513,596
3-64-5030	Sur	SALINAS	Troncal sanitaria Comunidad Cocos, paralela PR-52, Fase I (Ver 3-64-5001)	$ 1,062,251	$ 1,062,027	May-10	Apr-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 624,601	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 624,601
4-08-6175	Oeste	LAS MARIAS	PLANTA FILT. (2.5 MGD) Y TOMA RIO AÑASCO, E/B,LINEA AGUAS CRUDAS,TANQUE Y CIENOS-TURBIDEZ, Fase I	$ 18,518,871	$ 4,800,866	Aug-05	Apr-11	Dec-11	Cierre por Conveniencia	25	Acueducto	PFN	M DOH	1.62	$ 534,412	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 534,412
1-32-2000	Metro	GUAYNABO	Construcción Oficinas Modulares tipo trailer de 84' x 40' y almacenes para piezas y bombas tipo trailer de 84' x 40' Area Operacional, incluye mobiliario. (+ 1-32-2001)	$ 1,867,188	$ 1,865,003	May-10	Apr-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Edificios	Otros W&S	NM OTH	0.87	$ 1,140,561	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,140,561
7-56-9000	Sur	PATILLAS	Reemplazo tanque en acero de 10,000 gal Bo. Cacao Alto, Sector Los Laboy	$ 119,140	$ 119,140	Aug-10	Apr-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Crec	0.17	$ 30,991	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,991
7-67-9002	Este	SAN LORENZO	Camnio de acceso al tanque de lavado de la Planta de Filtración Cerro Gordo.	$ 124,149	$ 124,149	May-10	Apr-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	0	$ 23,209	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,209
7-13-9001	Este	CAGUAS	Rehabilitación de filtros #1 y #3 PF Caguas Sur	$ 125,618	$ 125,618	Sep-10	Apr-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.61	$ 32,676	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,676
0-80-2707	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (SAP-Fase II)	$ 757,471	$ 498,386	Jan-06	Apr-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 59,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59,000
0-80-2711	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (Adecuación del Centro de Cómputos y upgrade MF)	$ 611,539	$ 48,649	Jan-06	Apr-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 5,759	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,759
4-56-5001	Sur	PATILLAS	Acuerdo Municipio Patillas: Instalación de 1,180ml tubería gravedad PVC 8", 25 registros, EB, 516 ml línea de fuerza de 4", 83 acometidas y demolición EB existente Sector Playa, Barrio Bajos	$ 62,893	$ 62,893	May-10	Apr-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	0.92	$ 39,398	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39,398
1-72-7000	Metro	TRUJILLO ALTO	Mejoras a la Estación de Bombas Cupey Nueva (Cupey Water System)	$ 544,236	$ 544,236	Sep-10	Apr-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	0.91	$ 398,706	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 398,706
0-80-2714	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - SISTEMAS FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES SFPMC	$ 868,569	$ 868,569	Dec-07	May-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 172,762	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172,762

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-52-9003	Norte	MOROVIS	Terminación proyecto mejoras al sistema de distribución de agua potable en la Com. Cabachuelas Bo. Torrecillas REN-51385 (asfalto)	$ 136,161	$ 136,161	Jan-11	May-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 71,036	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71,036
8-02-6002	Sur	YAUCO	Extension Sistema de Acueductos, Sector La Jurada (4-02-6002)	$ 2,160,245	$ 1,161,061	Sep-09	May-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	59	Acueducto	Redes	NM Cumpl	1.35	$ 494,236	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 494,236
7-68-9000	Oeste	SAN SEBASTIAN	Instalación de tubería de 8" para la eliminación de la PF Perchas (2-05-7040)	$ 479,478	$ 479,478	Aug-10	May-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	75	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.99	$ 139,370	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 139,370
7-50-9002	Oeste	MAYAGUEZ	Rehabilitación del camino a la toma de aguas crudas del Rio Yaguez	$ 184,431	$ 184,431	Aug-10	May-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0.99	$ 59,292	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59,292
7-65-9000	Oeste	SAN GERMAN	Instalación de 1,700ml tubería de 6" para conectar tanque La Tea	$ 490,210	$ 490,210	Jan-10	May-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	85	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0.92	$ 92,476	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92,476
4-79-5015	Sur	YAUCO	Sistema sanitario comunidad Arturo Lluveras	$ 2,886,427	$ 2,446,375	Oct-09	Jun-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	70	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 1,166,288	$ 22,819	$ -	$ -	$ -	$ 1,189,107
0-99-8008	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo (-$3.5 a PMC: Carrizales Hatillo $0.4; Edificio Oeste $1.7; Ave Fagot $1.45, 4-58-5052) (+$200k Villa Kennedy, Loiza) (-$20m CF) (+$99K Eq Cloro -2-38-5010)	$ 50,027,036	$ 258,395	Jul-07	Jun-11	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8-08-6005	Norte	HATILLO	Mejoras a tanques de distribución de 1M y 7 KMS de tubería (2-08-6005)	$ 5,351,656	$ 3,529,246	Sep-09	Jun-11	Dec-16	CONSTRUCCIÓN	82	Acueducto	Abastos	M DOH	1.27	$ 1,616,476	$ 64,516	$ -	$ -	$ -	$ 1,680,992
1-61-6000	Este	RIO GRANDE	Reemplazo tanque de retrolavado para la PF El Yunque	$ 641,205	$ 571,249	Jul-09	Jun-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.1	$ 226,825	$ 15,010	$ -	$ -	$ -	$ 241,836
0-80-9301	ISLA	ISLA	Medidas remediativas STS, instalación de medidores de flujo, sensores de nivel y equipo para declorar Fase I	$ 16,074,109	$ 16,036,442	Sep-09	Jun-11	x	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	PFE	M STS	0.7	$ 7,044,783	$ 430,337	$ -	$ -	$ -	$ 7,475,120
1-17-5003	Metro	CATAÑO	Diseño Construcción Rehabilitación de Estación de Bombas La Puntilla	$ 381,524	$ 381,524	Jun-10	Jun-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Cumpl	0.52	$ 263,737	$ 14,743	$ -	$ -	$ -	$ 278,480
7-18-9000	Este	CAYEY	Mejoras a sistema de acueductos, instalación de 350ml de tubería 6" DI SDR 14 en el Sector Santo Domingo López del Bo. Beatriz	$ 156,681	$ 156,681	Aug-10	Jun-11	Jan-00	CERRADO	100	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.44	$ 66,225	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66,225
7-55-9000	Sur	OROCOVIS	Compra e Instalación de 5 generadores para las estaciones de bombas de agua potable del Bo. Saltos	$ 565,527	$ 565,527	Oct-10	Jun-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	0.6	$ 291,814	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 291,814
7-67-9001	Este	SAN LORENZO	Mejoras al sistema de acueductos, instalación de 915ml tubería 4" PVC SDR14 en la Barriada Roosvelt PR-181 hacia Quebradas	$ 181,855	$ 181,855	Aug-10	Jun-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 76,866	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76,866
2-75-5040	Norte	VEGA BAJA	Mejoras a la PAS Vega Baja: instalación medidor de flujo de entrada y modificaciones al spliter box #1, sistema recolección arenas, tubería de entrada a los contenedores y al scum box	$ 2,173,679	$ 2,173,679	Jul-10	Jun-11	Jun-11	CONSTRUCCIÓN	76	Alcantarillado	PASE	M EPA	1.83	$ 1,464,914	$ 81,890	$ -	$ -	$ -	$ 1,546,803
7-08-9020	Sur	ARROYO	Diseño y Construcción Tanque 10,000g Los Morales Com. Pitahaya Sector Los Morales	$ 150,969	$ 150,969	Sep-10	Jun-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	1.04	$ 66,516	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66,516
1-66-5088	Metro	SAN JUAN	Mejoras a la tubería de salida de la PAS de Puerto Nuevo	$ 1,040,945	$ 1,040,945	Dec-10	Jun-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Calidad	0.61	$ 846,368	$ 49,917	$ -	$ -	$ -	$ 896,284

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-66-5090	Metro	SAN JUAN	Renovación de 85ml tubería saniatria calle Tirso de Molina El Señorial	$ 148,971	$ 148,971	Nov-10	Jun-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0.65	$ 79,559	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,559
7-78-9001	Este	YABUCOA	Renovación y Reemplazo de 473 ml 2" dia por 4" dia y 40 acometidas en la calle 13 Com. Martorell	$ 273,884	$ 273,884	Dec-10	Jun-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 159,937	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159,937
0-80-2805	ISLA	ISLA	Automatizacion de Plantas de Filtración y Alcantarillado Sanitario Fase I	$ 10,575,877	$ 10,575,652	May-10	Jul-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	1.34	$ 6,407,928	$ 378,173	$ -	$ -	$ -	$ 6,786,101
4-49-6002	Sur	MAUNABO	Terminación - Mejoras al sistema de distribución de agua potable Comunidades Palo Seco, Calada, Los Lebrones y Los Sánchez, 3-20-7005	$ 400,238	$ 400,238	Oct-10	Jul-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.78	$ 302,624	$ 19,046	$ -	$ -	$ -	$ 321,670
4-29-5020	Sur	GUANICA	Mejoras adicionales PAS Guanica	$ 2,149,788	$ 2,094,645	Sep-10	Jul-11	Jun-11	CONSTRUCCIÓN	3	Alcantarillado	PASE	M EPA	1.1	$ 1,512,388	$ 99,354	$ -	$ -	$ -	$ 1,611,742
0-99-2011	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 2,603,562	$ 2,603,562	Jul-10	Jul-11	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ 1,737,378	$ 121,212	$ -	$ -	$ -	$ 1,858,591
0-99-3011	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 3,000,000	$ 3,000,000	Jul-10	Jul-11	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0.6	$ 2,084,854	$ 145,455	$ -	$ -	$ -	$ 2,230,309
0-99-8011	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo, menos CIP Obras Menores	$ 30,701,140	$ 30,701,140	Jul-10	Jul-11	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ 11,672,085	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,672,085
3-05-7000	Sur	SALINAS	SISTEMA ACUEDUCTO COM. AGUIRRE Y MONTESORIA	$ 5,868,600	$ 3,488,459	Jun-09	Jul-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	96	Acueducto	Redes	NM Cumpl	1.45	$ 1,379,501	$ 124,466	$ -	$ -	$ -	$ 1,503,967
3-64-5010	Sur	SALINAS	SISTEMA ALCANTARILLADO COMUNIDAD AGUIRRE Y MONTESORIA	$ 4,812,820	$ 2,062,073	Jun-09	Jul-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	96	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.44	$ 817,952	$ 73,800	$ -	$ -	$ -	$ 891,752
1-66-5013	Metro	SAN JUAN	Sistema sanitario comunidad El Capá Carretera #199 (REN-212106)	$ 369,102	$ 369,102	Sep-10	Jul-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 269,491	$ 21,214	$ -	$ -	$ -	$ 290,704
2-51-5025	Oeste	MOCA	TRONCAL COMUNIDADES ISLETA, VOLADORAS Y LOMAS VERDES	$ 10,986,496	$ 5,677,142	Feb-08	Jul-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	92	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.62	$ 1,342,073	$ 137,779	$ -	$ -	$ -	$ 1,479,853
3-16-6016	Sur	PATILLAS	Nueva WTP, Capacidad 6.0 MGD - Fase I	$ 28,202,884	$ 7,639,147	Aug-06	Jul-11	Dec-11	CONSTRUCCIÓN	93	Acueducto	PFN	M DOH	1.79	$ 1,112,999	$ 173,705	$ -	$ -	$ -	$ 1,286,705
3-27-6001	Este	FAJARDO	Mejoras a la PF Fajardo, 4ta bomba PF	$ 462,997	$ 462,997	Oct-10	Jul-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	0.26	$ 335,272	$ 39,530	$ -	$ -	$ -	$ 374,802
0-80-2704	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (CIS, Customer Information System) (ACTIVO)	$ 20,784,574	$ 2,158,425	Jan-06	Jul-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 264,464	$ 47,288	$ -	$ -	$ -	$ 311,752
0-80-2708	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (Redes de Datos(LAN/WAN))	$ 2,084,230	$ 423,643	Jan-06	Jul-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 51,907	$ 9,281	$ -	$ -	$ -	$ 61,188
0-80-2710	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (Remplazo de equipos por Obsolecencia)	$ 3,718,324	$ 1,239,926	Jan-06	Jul-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 151,925	$ 27,165	$ -	$ -	$ -	$ 179,091

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
0-80-2713	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (Licencias y Hardware)	$ 12,984,743	$ 2,977,808	Jan-06	Jul-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 365,217	$ 65,304	$ -	$ -	$ -	$ 430,520
7-61-8001	Este	RIO GRANDE	Rehabilitacion y mejoras a la EBAS de la PAS Palmer, para eliminar PAS Palmer	$ 254,015	$ 254,015	Jan-11	Jul-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM OTH	1.3	$ 192,185	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 192,185
4-29-5016	Sur	GUANICA	LATERALES SANITARIAS COMUNIDADES ENSENADA Y GUAYPAO	$ 19,351,038	$ 9,203,000	Sep-07	Aug-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	85	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 1,838,849	$ 295,529	$ -	$ -	$ -	$ 2,134,378
0-99-9011	ISLA	ISLA	Mantenimiento Preventivo	$ 15,215,200	$ 15,215,200	Jul-10	Aug-11	x	REN y Otros	0	PMP	Otros W&S	M EPA	1.74	$ 6,824,099	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,824,099
4-02-6001	Sur	YAUCO	TUBERIA AGUAS CRUDAS y TOMA (LUCHETTI), Fase II (incluye 4-02-6020)	$ 7,202,625	$ 6,238,227	Sep-09	Aug-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	58	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.83	$ 2,864,677	$ 394,912	$ -	$ -	$ -	$ 3,259,589
7-50-9004	Oeste	MAYAGUEZ	Construcción nuevo tanque de gaua de 0.15mg en hormigón e instalación de tubería de conexión al sistema existente. MOA con Municipio de Mayaguez	$ 395,640	$ 395,640	Jan-11	Aug-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM OTH	1.04	$ 304,444	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 304,444
2-73-5014	Norte	UTUADO	NUEVA PLANTA ALCANTARILLADO 2 MGD, TRONCAL SANITARIA Y E/B INFLUENTE	$ 34,767,133	$ 5,823,173	Nov-02	Aug-11	Jun-11	CIERRE	98	Alcantarillado	PASN	M EPA	1.44	$ 449,054	$ 76,981	$ -	$ -	$ -	$ 526,035
4-29-5030	Sur	GUANICA	LATERALES SANITARIAS SALINAS PROVIDENCIA FASE II, TS Eliminacion PAS Playa Santa	$ 7,775,068	$ 3,546,939	Mar-09	Aug-11	Jun-16	CONSTRUCCIÓN	85	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.44	$ 1,316,824	$ 223,011	$ -	$ -	$ -	$ 1,539,835
8-02-7001	Este	AIBONITO	WTP AIBONITO LA PLATA NUEVO - CUMPLIMIENTO, Fase IA Mejoras a represa, tanque de distribución y relocalización descarga del sistema de cienos (RD) (3-02-7001)	$ 6,380,881	$ 4,288,583	Oct-09	Aug-11	Dec-11	CONSTRUCCIÓN	10	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ 1,986,694	$ 300,508	$ -	$ -	$ -	$ 2,287,202
7-71-5000	Metro	TOA BAJA	Adquisición de terrenos troncal sanitaria Bo. Candelaria Arenas (Finca Navy)	$ 91,588	$ 91,588	Oct-10	Aug-11	Jan-00	Estudio	0	Alcantarillado	SAS	NM Calidad	0.87	$ 59,661	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59,661
4-79-5020	Sur	YAUCO	AMPLIACION PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO YAUCO	$ 40,116,389	$ 13,200,954	Dec-06	Aug-11	Jun-11	CONSTRUCCIÓN	97	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ 2,080,286	$ 506,015	$ -	$ -	$ -	$ 2,586,301
7-07-2002	Norte	ARECIBO	Obras de construcción menor en sistemas de acueductos en los municipios de Arecibo, Ciales y Vega Baja	$ 362,275	$ 362,275	Nov-10	Aug-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	0.52	$ 235,988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 235,988
7-17-5023	Metro	CATAÑO	Reemplazo de low voltage switchgear (LVS #3 y #4) sección efluente PAS Bayamón	$ 239,257	$ 239,257	Nov-10	Aug-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.74	$ 155,853	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 155,853
7-20-9000	Norte	CIALES	Renovación de tubería de distribución de agua potable de las Com. La Grama y Campamento, PR-633	$ 434,720	$ 434,720	Nov-10	Aug-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.48	$ 283,179	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 283,179
7-07-8001	Norte	ARECIBO	Mejoras al sistema de alcantarillados sanitario de la Comunidad Buenos Aires	$ 606,662	$ 606,662	Mar-11	Aug-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - CSO	1.92	$ 506,441	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506,441
7-68-9001	Oeste	SAN SEBASTIAN	Rehabilitación Estación de Bombas Altosano, MOA Muncipio	$ 66,160	$ 66,160	Mar-11	Aug-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	1.04	$ 56,586	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56,586
8-32-7000	Sur	ADJUNTAS	Mejoras acueductos Yahuecas Fase II, construcción 2 tanques y líneas de distribución Ref 4-32-7000	$ 9,362,982	$ 8,284,138	Sep-09	Sep-11	Jun-13	CONSTRUCCIÓN	39	Acueducto	Redes	M STS	0.75	$ 3,756,429	$ 671,679	$ -	$ -	$ -	$ 4,428,108

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
4-08-6175A	Oeste	LAS MARIAS	Terminación PLANTA FILT. (2.5 MGD) Y TOMA RIO AÑASCO, E/B,LINEA AGUAS CRUDAS,TANQUE Y CIENOS-TURBIDEZ, Fase I	$ 31,469,266	$ 31,469,266	Aug-05	Sep-11	Dec-11	CONSTRUCCIÓN	85	Acueducto	PFN	M DOH	1.62	$ 4,369,161	$ 1,107,675	$ -	$ -	$ -	$ 5,476,836
4-77-6003	Sur	VILLALBA	Compra e instalación de sistema de aireación en el Lago Toa Vaca y en el Lago de Cidra	$ 1,995,718	$ 1,995,718	Dec-10	Sep-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Abastos	M STS	1.48	$ 1,453,585	$ 335,443	$ -	$ -	$ -	$ 1,789,028
7-30-9009	Sur	GUAYAMA	Reparación de carpeta asfáltica en los Bos. Carite y Guamaní	$ 337,076	$ 337,076	Mar-11	Sep-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM OTH	0	$ 293,583	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 293,583
7-60-9000	Oeste	RINCON	Mejoras al sistema de agua potable en Bo. Atalaya	$ 557,224	$ 557,224	Dec-10	Sep-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.99	$ 411,131	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 411,131
7-70-7000	Norte	TOA ALTA	Adquisición de franja de terreno en Sector Los Pachecos para terminar proyectos de renovación de tubería REN-54133	$ 53,754	$ 35,314	Dec-10	Sep-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 26,056	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26,056
7-13-8000	Este	CAGUAS	Instalación filtro prensa de correas en PAS Borinquen	$ 30,790	$ 30,790	Sep-10	Sep-11	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.74	$ 19,358	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,358
7-19-9000	Este	CEIBA	Mejoras al sistema de acueductos, instalación de 200ml tubería agua potable de 10" DI SDR14 y válvulas sostenedoras y reguladoras en Sector Chupacayos	$ 92,369	$ 92,369	Dec-10	Sep-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 68,901	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68,901
7-36-9001	Este	NAGUABO	Sistema de extracción continua de cieno PF Rio Blanco y rehabilitación de filtro #5	$ 691,079	$ 691,079	Dec-10	Sep-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.26	$ 516,759	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 516,759
0-80-2715	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - REMPLAZO DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE NETWORKING OBSOLETOS	$ 1,461,880	$ 1,090,133	Sep-08	Oct-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.78	$ 307,350	$ 77,798	$ -	$ -	$ -	$ 385,148
7-14-8001	Norte	CAMUY	Mejoras al sistema de aplicación de cloro de la PAS de Camuy, añdir punto de aplicación a los clarificadores finales.	$ 8,301	$ 8,301	Jun-11	Oct-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	0.92	$ 8,896	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,896
4-58-6002	Sur	PONCE	Acueducto del Sur, Fase I - Materiales	$ 32,252,720	$ 32,252,720	Aug-11	Oct-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 28,685,685	$ 7,171,421	$ -	$ -	$ -	$ 35,857,107
8-05-6000	Este	AIBONITO	WTP AIBONITO LA PLATA NUEVO - CUMPLIMIENTO, Fase II Mejoras a PF (DW) (Orden de la Corte) (Ref 3-05-6000)	$ 4,070,204	$ 3,725,708	Sep-09	Oct-11	Dec-11	CONSTRUCCIÓN	12	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ 1,708,499	$ 463,897	$ -	$ -	$ -	$ 2,172,396
3-18-5001	Este	CAYEY	ELIMINACION PLANTA TRATAMIENTO EL TORITO Y 6 ESTACIONES DE BOMBEO	$ 19,614,425	$ 9,177,843	Apr-08	Oct-11	Jun-11	CONSTRUCCIÓN	79	Alcantarillado	EB	M EPA	1.35	$ 2,326,809	$ 658,991	$ -	$ -	$ -	$ 2,985,800
2-37-5001	Oeste	ISABELA	Terminacion SISTEMA LATERALES COMUNIDAD LA MAYOR PR 113, SUBTRONCAL ESTE II	$ 5,492,682	$ 2,787,224	Jun-09	Oct-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	42	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 1,196,874	$ 307,454	$ -	$ -	$ -	$ 1,504,328
1-01-2025	ISLA	ISLA	PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS Gerencia	$ 6,280,296	$ 3,120,276	Jun-06	Oct-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W	Estructura - MIS	0.78	$ 422,823	$ 159,508	$ -	$ -	$ -	$ 582,331
7-42-9003	Norte	LARES	Diseño- Construcción de 2 estaciones de bombas y 2 sub-estaciones electricas para la Comunidad Cerro Las Avispas Bo. Bartolo	$ 715,808	$ 715,808	Dec-10	Oct-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	1.22	$ 550,785	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550,785
3-53-6001	Este	NAGUABO	Rehabilitación EB acuedcutos en PF Rio Blanco y mejoras tanque Punta Lima (Nuevo5)	$ 477,886	$ 477,886	Dec-10	Oct-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	0.87	$ 377,788	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 377,788

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-54-9000	Norte	NARANJITO	Nueva línea de succión para la EB Bo. Ortiz	$ 591,221	$ 591,221	Dec-10	Oct-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 453,280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 453,280
7-67-9000	Este	SAN LORENZO	Mejoras a la estación de bombas Los Carrasquillos II y al sistema de acueductos, instalación de 92ml de tubería de 4" PVC SDR14 y sellado de tanque en el Bo. Cerro Gordo	$ 94,161	$ 94,161	Dec-10	Oct-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	1.04	$ 72,453	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72,453
3-76-6000	Este	VIEQUES	Sistema de transmisión de agua Com Florida, remplazo de tubería de 8" por 12" en Punta Lima y tanque Arcadia, reemplazar EB Arcadia	$ 837,378	$ 837,378	Dec-10	Oct-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.7	$ 564,008	$ 189,768	$ -	$ -	$ -	$ 753,775
7-13-8001	Este	CAGUAS	Aportación al Municipio de Caguas - Combinado Caguas Courtyard, reemplazo de tubería sanitaria y agua potable. Requiere la firma del MOA	$ 104,440	$ 104,440	Jan-11	Oct-11	Jan-00	CERRADO	100	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.39	$ 84,545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 84,545
7-22-8005	Sur	COAMO	Diseño Construcción de la renovación de 185.62 ml de tubería PVC, 11 acometidas sanitarias en la calle municipal José I. Quintón	$ 246,660	$ 246,660	Feb-11	Oct-11	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	NM OTH	1.09	$ 209,985	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 209,985
4-55-9000	Sur	OROCOVIS	Emergencia reparación PR-149, Juana Díaz, línea de 36" DI Toa Vaca -Juana Díaz y sistema de almacenaje e intyección de carbón activado.	$ 400,472	$ 400,472	Jan-11	Oct-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM OTH	0	$ 324,187	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324,187
7-61-8000	Este	RIO GRANDE	Construccion de sistema alcantarillado sanitario en Sector Las Flores en la PR-3 Km 23.6	$ 254,015	$ 254,015	Apr-11	Oct-11	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	NM Crec	1.22	$ 247,815	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 247,815
7-14-9000	Norte	CAMUY	Terminación proyecto de mejoras al sistema de distribución de agua potable del Sector Mediania Bo. Santiago, REN-51385 (asfalto)	$ 309,424	$ 309,424	Jun-11	Oct-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 332,708	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 332,708
8-63-5001	Oeste	SABANA GRANDE	Eliminación de la PAS de Sabana Grande Fase I Ref 4-63-5030 (5-63-5001) Diseño Construcción	$ 7,078,331	$ 4,377,429	Sep-09	Nov-11	Jun-11	CONSTRUCCIÓN	58	Alcantarillado	PASE	M EPA	1.62	$ 2,165,490	$ 636,350	$ -	$ -	$ -	$ 2,801,841
8-01-6024	Metro	TRUJILLO ALTO	WTP SERGIO CUEVAS - CUMPLIMIENTO (estrictamente cumplimiento) Ref 1-01-6024	$ 15,423,057	$ 13,784,651	Dec-09	Nov-11	Dec-16	CONSTRUCCIÓN	78	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ 6,748,038	$ 2,009,170	$ -	$ -	$ -	$ 8,757,208
8-71-5025	Metro	TOA BAJA	Sistema alcantarillado sanitario Comunidad Ingenio (1-71-5025)	$ 17,833,134	$ 14,070,109	Oct-09	Nov-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	53	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.44	$ 6,591,847	$ 2,082,392	$ -	$ -	$ -	$ 8,674,239
7-50-9005	Oeste	MAYAGUEZ	Nuevo generador de emergencia para EB Las Caiceas	$ 65,069	$ 65,069	Jun-11	Nov-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	1.04	$ 69,766	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69,766
7-13-9000	Este	CAGUAS	Mejoras a sistema de acueductos, instalación de 500ml de tubería 6" DI SDR 14 y 300ml 4" DI en el Sector Los Angeles del Bo. Borinquen	$ 340,380	$ 340,380	Dec-10	Nov-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 270,634	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270,634
1-80-6020	Norte	ARECIBO	Instalación de ventosas en el Superacueducto	$ 515,722	$ 501,442	Jan-10	Nov-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.34	$ 277,162	$ 90,226	$ -	$ -	$ -	$ 367,388
1-71-5003	Metro	TOA BAJA	TERMINACION TERMINACION LATERALES MARISOL, KENNEDY, VEGAS Y CAMASEYES (Ref 1-71-5001)	$ 8,569,963	$ 8,532,768	Apr-10	Nov-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 4,680,368	$ 1,565,988	$ -	$ -	$ -	$ 6,246,356
7-02-8000	Oeste	AGUADA	Rehabilitación de tanque espesador en la PAS de Aguada	$ 95,099	$ 95,099	Jun-11	Nov-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Calidad	1.04	$ 102,198	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102,198
7-02-8001	Oeste	AGUADA	Diseño y Construcción de la rehabilitación de Automatic Transfer Switch de la PAS de Aguada	$ 260,755	$ 260,755	Jun-11	Nov-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM OTH	1.04	$ 280,220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280,220

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-11-2000	Metro	BAYAMON	Remodelación Oficina Comercial Cantón Mall	$ 128,844	$ 128,844	Jun-11	Nov-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Edificios	Otros W&S	NM OTH	0.52	$ 138,462	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 138,462
7-47-2000	Norte	MANATI	Mejoras a edificio de empleados del Area de Operaciones	$ 84,897	$ 84,897	Jun-11	Nov-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Edificios	Otros W&S	NM OTH	0.78	$ 91,235	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91,235
7-68-8000	Oeste	SAN SEBASTIAN	Eliminación EB Los Alamos	$ 495,811	$ 495,811	Jun-11	Nov-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Calidad	1.74	$ 532,823	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 532,823
7-68-9002	Oeste	SAN SEBASTIAN	Nuevo generador de emergencia Estación de Bombas Calabazas	$ 260,755	$ 260,755	Jun-11	Nov-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	1.04	$ 280,220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280,220
7-72-9000	Metro	TRUJILLO ALTO	Mejoras al sistema pluvial de la PF Sergio Cuevas	$ 89,289	$ 89,289	Jun-11	Nov-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM OTH	0	$ 95,954	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 95,954
2-54-6001	Norte	NARANJITO	Estación de Bombas en Tanque Doña Elena para el Sistema de Distribución Palomas Arriba	$ 622,236	$ 622,236	Aug-10	Nov-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	EB	NM Cumpl	0	$ 365,045	$ 137,934	$ -	$ -	$ -	$ 502,979
3-23-5000	Este	COMERIO	COMERIO-CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COM. LA PRIETA	$ 5,138,803	$ 3,661,627	Aug-07	Dec-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 864,408	$ 317,538	$ -	$ -	$ -	$ 1,181,946
7-03-9031	Oeste	AGUADILLA	Rehabiliatción de filtros: lavado superficial, reparación de válvuas de filter to waste y head loss en PF Ramey	$ 744,449	$ 744,449	Mar-11	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	1.17	$ 635,019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 635,019
2-07-9000	Norte	ARECIBO	Renovación tubería 200pl de 24" y 90pl de 16" Rio Tanamá, tibería expuesta en el cauce del rio.	$ 226,614	$ 226,614	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0	$ 134,974	$ 73,121	$ -	$ -	$ -	$ 208,094
7-30-9005	Sur	GUAYAMA	Diseño y Construcción para el sistema hidroneumático en el Sector Santos Morales del Bo. Carite, PF Guayama	$ 110,771	$ 110,771	Mar-11	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	EB	NM Calidad	0.18	$ 101,329	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 101,329
7-42-2000	Norte	LARES	Obras de construcción menor en sistemas de acueductos en los municipios de Lares, Utuado y Jayuya	$ 486,418	$ 486,418	Mar-11	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	1.26	$ 445,033	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 445,033
7-55-9001	Sur	OROCOVIS	Mejoras y Automatización PF Bo. Matrullas: reemplazo filtros, valvulas, actuadores, metros de flujo, sist polimeros, telemetría a represa y tanque, lozas y techar lechos de secado.	$ 491,226	$ 491,226	Mar-11	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0.17	$ 416,770	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416,770
7-04-8000	Este	AGUAS BUENAS	Mejoras al servicio eléctrico secundario e instalación de subestación de 75kv en la estación de bombas Palma Sola de la estación de bombas Jácanas etapa 3 en el Bo. Jácanas	$ 132,088	$ 132,088	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	EB	NM Calidad	1.04	$ 100,532	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,532
7-04-9000	Este	AGUAS BUENAS	Instalación filtroprensa de correas PAS Aguas Buenas	$ 38,909	$ 38,909	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.26	$ 31,826	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,826
7-18-9001	Este	CAYEY	Mejoras a Estación de bombas Cercadillo Fase 3 en Bo. Cercadillo	$ 225,327	$ 225,327	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	EB	NM Calidad	0.44	$ 171,496	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 171,496
4-30-7100	Sur	GUAYAMA	Mejoras al sistema de acueductos de los Barrios Carite y Guamaní	$ 381,101	$ 381,101	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0	$ 226,168	$ 122,525	$ -	$ -	$ -	$ 348,693
7-48-8000	Oeste	MARICAO	Rehabilitación del sistema sanitario del área recreacional de las cabañas del Monte del Estado	$ 197,253	$ 197,253	Oct-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.56	$ 155,692	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 155,692

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-55-8000	Sur	OROCOVIS	Diseño y Construcción renovación de 200p de tubería sanitaria en calle municipal frente Centro Cultural del pueblo	$ 102,556	$ 102,556	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0	$ 83,885	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83,885
7-57-8002	Sur	PEÑUELAS	Diseño y Construcción para el sistema de manejo de lodos en PAS Peñuelas	$ 755,510	$ 755,510	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.04	$ 617,965	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 617,965
7-57-9000	Sur	PEÑUELAS	Diseño y Construcción para el reemplazo medio filtrante de la PF Rucio	$ 49,695	$ 49,695	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0.87	$ 40,648	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,648
7-58-9001	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras a sedimentadores y válvulas de control entrada PF Coto Laurel	$ 522,641	$ 522,641	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0	$ 427,492	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 427,492
7-58-9003	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras a filtros en PF Real Anon	$ 745,247	$ 745,247	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0	$ 609,571	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 609,571
7-79-9010	Sur	YAUCO	Diseño y Construcción para el reemplazo de tapas de acceso para tanques en el Municipio	$ 62,233	$ 62,233	Dec-10	Dec-11	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - APlan	0.47	$ 50,903	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,903
7-11-9000	Metro	BAYAMON	Reemplazo tubería línea de distribución de agua potable en la calle B de la Urb. Montañez	$ 141,633	$ 141,633	Jun-11	Dec-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.74	$ 151,649	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 151,649
7-12-9000	Oeste	CABO ROJO	Rehabilitación Tanque Puerto Real	$ 130,856	$ 130,856	Jun-11	Dec-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	1.04	$ 140,110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140,110
3-36-6002	Este	HUMACAO	Sistema de Distribución Bo. Candelero Arriba, Fase I (EB, tanque y linea de transmisión), Ref TBD	$ 1,978,262	$ 1,978,262	May-10	Dec-11	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.86	$ 1,040,237	$ 469,127	$ -	$ -	$ -	$ 1,509,364
7-43-8000	Oeste	LAS MARIAS	Mejoras a la PAS Las Marias, rehabilitación y mejoras a; poceto	$ 13,086	$ 13,086	Jun-11	Dec-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM OTH	1.04	$ 14,011	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,011
7-45-9000	Metro	LOIZA	Sistema de distribución de gaua potable, inlcuyendo 22 acometidas en el Camino Los Rivera	$ 184,738	$ 184,738	Jun-11	Dec-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM OTH	0.18	$ 197,802	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197,802
7-50-9003	Oeste	MAYAGUEZ	Diseño e instalación de subestación de poste para el Pozo Consumo	$ 32,425	$ 32,425	Jun-11	Dec-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM OTH	1.04	$ 34,718	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34,718
8-52-5001	Norte	MOROVIS	NUEVA PLANTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECUNDARIA (1.7 MGD) (2-52-5001)	$ 17,801,373	$ 15,207,556	Sep-09	Dec-11	Jun-16	CONSTRUCCIÓN	38	Alcantarillado	PASN	M EPA	1.62	$ 6,814,042	$ 2,756,590	$ -	$ -	$ -	$ 9,570,631
7-27-9003	Este	FAJARDO	Rehabilitación toberas de las losas de retro-lavado y renovación del medio filtrante, filtros 7 y 8 en la PF Fajardo	$ 213,163	$ 213,163	Jun-11	Dec-11	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM OTH	0	$ 231,723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 231,723
0-80-2400	ISLA	ISLA	Servicios especiales en Gerencia de Construcción: apoyo en reclamaciones, salud y seguridad, plan maestro, PMIS, desarrollo de métricas	$ 5,896,876	$ 3,249,814	Jun-09	Dec-11	Jan-00	Estudio	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura	0.08	$ 1,300,911	$ 483,196	$ -	$ -	$ -	$ 1,784,106
2-14-7001	Norte	CAMUY	Mejoras al sistema de distribución Camuy-Hatillo-Quebradillas, Fase IA: PF Quebradas y nuevo tanque 500,000g (Ref 2-14-7000 - Fase II 2-34-9002)	$ 2,415,129	$ 2,415,129	Dec-10	Jan-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.39	$ 1,399,951	$ 817,490	$ -	$ -	$ -	$ 2,217,440
0-80-9010	ISLA	ISLA	Agua no Contabilizada: Mega Censo	$ 88,839,014	$ 56,971,583	Oct-08	Jan-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	50	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0.6	$ 17,144,507	$ 7,290,186	$ -	$ -	$ -	$ 24,434,693

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-22-8000	Sur	COAMO	Terminación línea de Juana Diaz - Coamo hasta el punto de conexión cercano a la PF de Coamo, Ref. 9-99-6235	$ 4,941,304	$ 4,941,304	Dec-10	Jan-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Crec	1.3	$ 4,204,426	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,204,426
1-66-2001	Metro	SAN JUAN	Cafeteria Edificio Central (Sede) Ref 1-80-2056	$ 1,584,260	$ 1,584,260	Dec-10	Jan-12	Jan-00	SUBASTA	0	Edificios	Otros W&S	NM OTH	0	$ 896,149	$ 597,433	$ -	$ -	$ -	$ 1,493,582
Nuevo7	Norte	DORADO	Mejoras adicionales PAS Dorado	$ 425,000	$ 425,000	Jun-11	Jan-12	Jun-11	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	M EPA	1.39	$ 462,006	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 462,006
8-08-6176	Oeste	LAS MARIAS	SISTEMA DE DISTRIBUCION 75 KM, a los Barrios Maravillas, Palma Escrita, Naranjales y áreas urbanas, Fase II A (Ref 4-08-6176)	$ 12,259,713	$ 9,229,649	Dec-09	Jan-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	26	Acueducto	Redes	NM Crec	0.75	$ 4,363,447	$ 2,017,508	$ -	$ -	$ -	$ 6,380,955
7-27-9000	Este	FAJARDO	Mejoras al sistema de acueductos, instalación de 600ml tubería agua potable de 6" PVC SDR 14, válvulas y construcción de tanque 30,000gl en Sector Goya Flores	$ 156,764	$ 156,764	Dec-10	Feb-12	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 123,858	$ 7,382	$ -	$ -	$ -	$ 131,240
7-27-9001	Este	FAJARDO	Mejoras al sistema de acueductos, instalación de 550ml tubería agua potable de 4", válvulas y construcción de tanque 30,000gl en Sector El Espejo	$ 141,088	$ 141,088	Dec-10	Feb-12	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 111,472	$ 6,644	$ -	$ -	$ -	$ 118,116
3-06-7001	Este	CAGUAS	Sistema de agua potable Com. Palomas Arriba, Comerio	$ 429,410	$ 429,410	Jun-11	Feb-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Cumpl	0.53	$ 200,742	$ 238,214	$ -	$ -	$ -	$ 438,956
7-73-9000	Norte	UTUADO	Construcción sistema de colección de cienos frente a lechos de secado en PF Roncador	$ 58,786	$ 58,786	Jul-11	Feb-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	1.74	$ 60,706	$ 4,082	$ -	$ -	$ -	$ 64,787
7-07-9001	Norte	ARECIBO	Renopvación de tubería de agua potable en Parcelas Miraflores	$ 428,555	$ 428,555	May-11	Feb-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 420,121	$ 25,320	$ -	$ -	$ -	$ 445,441
7-46-9001	Este	LUQUILLO	Convertir Pozo Paisale del Lago a EB	$ 456,777	$ 456,777	Aug-11	Feb-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM Cumpl	1.17	$ 474,072	$ 36,781	$ -	$ -	$ -	$ 510,853
7-63-9002	Oeste	Sabana Grande	Rehabilitación de pavimento en la PR-121, mejoras al sistema pluvial y al puente Viga del Rio Loco	$ 299,048	$ 299,048	Oct-11	Feb-12			1	Alcantarillado Sanitario	Sistemas de Alcantarillados	Estructura - REN	1						$ -
7-44-9000	Este	LAS PIEDRAS	Diseño y Construcción para la instalación de 852ml de tubería de 6" SDR-14 en el Area Industrial	$ 289,292	$ 289,292	Aug-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM OTH	1.04	$ 297,334	$ 26,207	$ -	$ -	$ -	$ 323,540
4-56-5000	Sur	PATILLAS	Expansión relocalización Planta Sanitaria Paquete de San Germán	$ 3,959,121	$ 3,816,350	Dec-10	Mar-12	x	SUBASTA	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ 1,925,605	$ 1,605,338	$ -	$ -	$ -	$ 3,530,943
7-20-8000	Norte	CIALES	Estación de bombeo sanitario temporero y conexión a sistema sanitario existente	$ 595,751	$ 595,751	May-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM OTH	0.18	$ 560,561	$ 73,003	$ -	$ -	$ -	$ 633,564
7-59-9001	Norte	QUEBRADILLAS	Construcción nueva toma en el Lago Guajataca	$ 763,577	$ 763,577	Feb-11	Mar-12	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	1.22	$ 619,449	$ 71,659	$ -	$ -	$ -	$ 691,108
7-01-9000	Sur	ADJUNTAS	Construcción EB, caseta y camino Represa Hogares Seguros	$ 364,006	$ 364,006	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0.17	$ 315,527	$ 45,498	$ -	$ -	$ -	$ 361,025
7-01-9001	Sur	ADJUNTAS	Reparación sistema de control y automatización de PF Guilarte	$ 379,173	$ 379,173	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	0.34	$ 328,674	$ 47,394	$ -	$ -	$ -	$ 376,067

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-03-9030	Oeste	AGUADILLA	Automatizar filtros de lavado con headloss PF Aguadilla Nueva	$ 682,512	$ 682,512	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	1.17	$ 591,613	$ 85,309	$ -	$ -	$ -	$ 676,921
7-05-9000	Este	AIBONITO	Instalación de 1,593 ml de tuberia de 4", 6" y 8" para transferir agua del sistema La Plata al Bo Asomante de la PF Urbana de Aibonito	$ 389,095	$ 389,095	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 363,132	$ 52,362	$ -	$ -	$ -	$ 415,494
7-08-8000	Sur	ARROYO	Rehabiolitación y reemplazo de 393 ml tubería sanitaria en hormigón de 8" e instalación de 25 acometidas en la PR-178	$ 149,412	$ 149,412	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0.7	$ 139,443	$ 20,107	$ -	$ -	$ -	$ 159,550
7-11-5026	Metro	BAYAMON	Instalación de 89 ml de tuberia sanitaria de 10" PVC Com. Sierra Linda y 36 ml de tuberia sanitaria de 8" PVC Comunidad Especial Sección Corea (incluye 7-11-5027)	$ 123,231	$ 123,231	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.39	$ 106,819	$ 15,403	$ -	$ -	$ -	$ 122,222
1-11-6000	Metro	BAYAMON	Reemplazo tuberia transmision Ave. North Main, Sierra Bayamón (Nuevo12)	$ 2,229,165	$ 2,229,165	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.82	$ 1,972,042	$ 284,362	$ -	$ -	$ -	$ 2,256,405
7-11-7002	Metro	BAYAMON	Instalación de tuberia de 4" PVC: 374 ml en Bo. Dajaos, 205 ml en Bo. Santa Olaya y 364ml en la Urb. Montañez (incluye 7-11-7003)	$ 262,388	$ 262,388	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.65	$ 227,442	$ 32,796	$ -	$ -	$ -	$ 260,239
7-11-7004	Metro	BAYAMON	Sistema de Dosificación de Cloro	$ 185,059	$ 185,059	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	1.74	$ 160,412	$ 23,131	$ -	$ -	$ -	$ 183,543
7-11-7005	Metro	BAYAMON	Mejoras al sistema de acueducto en: Bo. Nuevo, calles vecinales PR-816 Km. 1.9, Km. 2.1y Km. 3 (incluye 7-11-7006 y 7-11-7007)	$ 237,742	$ 237,742	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.65	$ 206,078	$ 29,716	$ -	$ -	$ -	$ 235,794
2-14-2000	Norte	CAMUY	Reemplazo verja periferal y reparación de estructuras PAS Camuy	$ 908,943	$ 908,943	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Edificios	Otros WW	NM Calidad	1.04	$ 414,752	$ 585,533	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,285
2-14-2001	Norte	CAMUY	Reemplazo verja periferal, instalcion de portones, reparaciones estructurales a oficinas y unidades de proceso en la PAS Camuy Fase I (ref 7-14-2000) Repetido 2-14-2000	$ 908,944	$ 908,944	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM OTH	0.3	$ 867,118	$ 125,036	$ -	$ -	$ -	$ 992,153
7-15-7001	Metro	CANOVANAS	Reemplazo de tubería galvanizada de 2" a PVC de 4" en la PR-954 km. 2.1 Bo. Canovanillas	$ 106,168	$ 106,168	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.87	$ 92,029	$ 13,270	$ -	$ -	$ -	$ 105,299
7-17-5021	Metro	CATAÑO	Reemplazo de MCC D & E sección afluente y reempalso de bombas de entrada #2 y #5 por bombas Flygt Dry Pit en PAS Bayamón (inlcuye 7-17-5022)	$ 561,176	$ 561,176	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.74	$ 486,437	$ 70,143	$ -	$ -	$ -	$ 556,580
7-18-8000	Este	CAYEY	Instalación de 150ml tubería de alcantarillado sanitario 8" PVC SDR 35 en Calle Esteban Rivera Int. PR-14 Cantro Urbano	$ 186,478	$ 186,478	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0.7	$ 161,940	$ 23,351	$ -	$ -	$ -	$ 185,291
7-18-9003	Este	CAYEY	Mejoras al sistema de acueductos, construcción de pozo en el Bo. Pasto Viejo	$ 150,346	$ 150,346	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0	$ 140,314	$ 20,233	$ -	$ -	$ -	$ 160,547
7-24-6000	Norte	COROZAL	Instalación de sistema de metros de flujo, control de niveles de filtros y panel de control para automatización PF Cibuco	$ 227,504	$ 227,504	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	1.74	$ 197,204	$ 28,436	$ -	$ -	$ -	$ 225,640
Nuevo8	Norte	COROZAL	Mejoras represa PF Negros	$ 743,055	$ 743,055	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	1.74	$ 657,347	$ 94,787	$ -	$ -	$ -	$ 752,135
7-26-9000	Norte	DORADO	Mejoras al sistema de distribución de agua potable en Com. Guarisco del Bo. Espinosa, instalación de 1,750ml de tub de 4" PVC SDR-14	$ 457,833	$ 457,833	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.13	$ 396,858	$ 57,226	$ -	$ -	$ -	$ 454,083

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-29-9000	Sur	GUANICA	Instalación de tubería para utilizar alternadamente el Pozo M1 y Pozo M2	$ 45,501	$ 45,501	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.34	$ 39,441	$ 5,687	$ -	$ -	$ -	$ 45,128
7-30-8000	Sur	GUAYAMA	Diseño y construcción mejoras EB Brandery: parcela, backflow preventer, alumbrado, verja, tanque diesel, estructura acero y reemplazo filtro de control.	$ 136,502	$ 136,502	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM Cumpl - APlan	0.34	$ 118,323	$ 17,062	$ -	$ -	$ -	$ 135,384
7-30-9000	Sur	GUAYAMA	Mejoras tanque 2MG Barrio Pozo Hondo: remoción de válvula de boya de 16", instalación tapa de acceso, caseta de boyas, respiraderos y área de descansoen escalera de acero.	$ 44,439	$ 44,439	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - APlan	0.34	$ 38,521	$ 5,555	$ -	$ -	$ -	$ 44,075
7-30-9001	Sur	GUAYAMA	Mejoras tanque distribución de Arroyo PF Guayama: reemplazo de acceso, escaleras y sellado interior y exterior.	$ 75,835	$ 75,835	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - APlan	0.34	$ 65,735	$ 9,479	$ -	$ -	$ -	$ 75,213
7-30-9003	Sur	GUAYAMA	Diseño y Construcción sistema de inyección de ortofosfato en PF Urbana	$ 25,652	$ 25,652	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0.78	$ 22,225	$ 3,205	$ -	$ -	$ -	$ 25,430
7-30-9008	Sur	GUAYAMA	Rehabilitación y Construcción de escalera de acceso a sedimentador y verja alrededor de los filtros en la PF Guayama	$ 23,346	$ 23,346	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0	$ 21,788	$ 3,142	$ -	$ -	$ -	$ 24,930
7-31-9000	Sur	GUAYANILLA	Mejoras Pozos Guayanilla: cambio de bomba y motro, panel eléctrico, subestación eléctrica, poste de hormigón, generador de emeregnecia, ATS de 200 amp, telemetría, etc.	$ 182,003	$ 182,003	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Crec	0.34	$ 157,763	$ 22,749	$ -	$ -	$ -	$ 180,512
7-31-9001	Sur	GUAYANILLA	Diseño y Construcción para la instalación de 330ml de tubería de 2' en Callejón Lajas del Bo. Indios	$ 77,819	$ 77,819	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.6	$ 72,626	$ 10,472	$ -	$ -	$ -	$ 83,099
7-32-7001	Metro	GUAYNABO	Instalación de 4 reguladoras en Caminos: Los Vigios, Avelino López, Los Benítez y Los García	$ 165,320	$ 165,320	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 143,302	$ 20,664	$ -	$ -	$ -	$ 163,965
7-32-7003	Metro	GUAYNABO	Rehabilitación y mejoras a los equipos para la aplicación y medición de cloro, PF Los Filtros	$ 163,803	$ 163,803	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	1.35	$ 141,987	$ 20,474	$ -	$ -	$ -	$ 162,461
7-32-8020	Metro	GUAYNABO	Renovación y reemplazo de tubería de agua potable de 50 ml de 8" Bo. Juan Domingo (ver 7-32-9000 sanitaria)	$ 132,445	$ 132,445	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.53	$ 114,806	$ 16,555	$ -	$ -	$ -	$ 131,360
7-32-9000	Metro	GUAYNABO	Renovación y reemplazo de tubería de sanitaria de 50 ml de 8" Bo. Juan Domingo (ver 7-32-8020 agua potable)	$ 245,970	$ 245,970	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0	$ 213,211	$ 30,744	$ -	$ -	$ -	$ 243,955
7-33-9000	Este	GURABO	Mejoras a PF Gurabo, metro de flujo, válvula salida, reemplazo tubería y alambrado electrico	$ 536,951	$ 536,951	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	1.26	$ 501,122	$ 72,260	$ -	$ -	$ -	$ 573,382
7-34-8000	Norte	HATILLO	Renovación tramo tubería alcantarillado sanitario en la intersección de la PR-2 con la PR-130	$ 65,368	$ 65,368	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.92	$ 61,006	$ 8,797	$ -	$ -	$ -	$ 69,803
7-34-9000	Norte	HATILLO	Mejoras al sistema de distribución de agua potable Bo. Esperanza Sector Mariposa, instalación de 2,800ml de tubería de 4" PVC SDR-14	$ 549,422	$ 549,422	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 476,248	$ 68,674	$ -	$ -	$ -	$ 544,922
7-80-2000	Norte	ISLA	Adquisición de unidad de inspección de circuito cerrado para sistemas de alcantarilados sanitario (Región Norte)	$ 268,679	$ 268,679	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	1.57	$ 250,751	$ 36,158	$ -	$ -	$ -	$ 286,908
7-41-9000	Oeste	LAJAS	Instalación de 4.4km de tubería de 6"agua potable Com. La Garza	$ 529,642	$ 529,642	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.87	$ 460,143	$ 66,351	$ -	$ -	$ -	$ 526,494

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-42-7000	Norte	LARES	Mejoras al sistema de distribución de agua potable Sector Los Quemaos, instalación de 800ml de tubería de 2" PVC SDR-14	$ 159,856	$ 159,856	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.09	$ 138,566	$ 19,981	$ -	$ -	$ -	$ 158,547
7-42-9000	Norte	LARES	Mejoars al sistema de distribución de agua potable Bo Callejones, inxtalación de 1,500ml tubería de 6" PVC SDR-14	$ 412,718	$ 412,718	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 385,179	$ 55,542	$ -	$ -	$ -	$ 440,721
7-42-9001	Norte	LARES	Mejoras al sistema de distribución de agua potable Bo. Piletas, instalación de 1,500ml de tubería de 4" PVC SDR-14	$ 302,182	$ 302,182	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 261,937	$ 37,770	$ -	$ -	$ -	$ 299,707
7-45-8000	Metro	LOIZA	PAS Carolina Cloro proporcional al flujo	$ 121,335	$ 121,335	Jun-11	Mar-12	x	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	M EPA	1.74	$ 105,176	$ 15,166	$ -	$ -	$ -	$ 120,342
7-47-9000	Norte	MANATI	Mejoras al sistema de distribución de agu potable Bo Pajonal, instalación de 100ml de tubería de 6", valvulas de cotrtina y mejoras a las bombas del pozo Manati II	$ 183,430	$ 183,430	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 171,190	$ 24,685	$ -	$ -	$ -	$ 195,875
7-47-9001	Norte	MANATI	Mejoras al sistema de distribución de agua potable instalación de 700ml de tubería de 4" PVC SDR-14 en Com. Cerro Quiñones, Com. Cerro Vending y Bda. El Polvorin	$ 335,880	$ 335,880	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.13	$ 291,147	$ 41,982	$ -	$ -	$ -	$ 333,129
7-49-8000	Sur	MAUNABO	Mejoras Plantas Filtración: reparación verjas, caseta, empañetado, resanado y disponer de escombros. (Encuesta Sanitaria)	$ 30,334	$ 30,334	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM OTH	0.34	$ 26,294	$ 3,791	$ -	$ -	$ -	$ 30,085
7-49-8001	Sur	MAUNABO	Mejoras Pozos Maunabo: parcelas, verja y otros. (Encuesta Sanitaria)	$ 30,334	$ 30,334	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - APlan	0.34	$ 26,294	$ 3,791	$ -	$ -	$ -	$ 30,085
7-49-9002	Sur	MAUNABO	Conexión de tubería de desague del Pozo Urbano al sistema de alcantarillado sanitario.	$ 23,346	$ 23,346	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - APlan	0	$ 21,788	$ 3,142	$ -	$ -	$ -	$ 24,930
7-49-9003	Sur	MAUNABO	Rehabilitación de EB, remoción y disposición de facilidades eléctricas eliminadas y reemplazo de viga de troley en EB y Tanque Pica 3	$ 70,037	$ 70,037	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM Cumpl - APlan	0	$ 65,364	$ 9,425	$ -	$ -	$ -	$ 74,789
7-49-9004	Sur	MAUNABO	Instalación de tubería de agua potable de 6" en Bo. Matuyas	$ 77,819	$ 77,819	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Cumpl - APlan	0.52	$ 72,626	$ 10,472	$ -	$ -	$ -	$ 83,099
7-50-8000	Oeste	MAYAGUEZ	Renovación 180ml tubería sanitaria de 10" calle Cintrón, Com. Dulces Labios	$ 121,335	$ 121,335	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.44	$ 105,176	$ 15,166	$ -	$ -	$ -	$ 120,342
7-50-9000	Oeste	MAYAGUEZ	Instalación de 2.5Km de tubería de 8" para conectar tanques de agua potable Rio Hondo y Quebrada Grande.	$ 682,512	$ 682,512	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.13	$ 591,613	$ 85,309	$ -	$ -	$ -	$ 676,921
2-52-6003	Norte	MOROVIS	Mejoras represa PF Morovis Sur (Nuevo9)	$ 681,981	$ 681,981	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	0.35	$ 591,153	$ 85,242	$ -	$ -	$ -	$ 676,395
7-52-9000	Norte	MOROVIS	Mejoras al sistema de distribución de agua potable Sector Cuchillas, instalación de 700ml de tubería de 4" desde el tanque de 1.0MG en al PF de Morovis Sur hasta la EB Cocal	$ 165,376	$ 165,376	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.13	$ 143,351	$ 20,671	$ -	$ -	$ -	$ 164,021
7-52-9001	Norte	MOROVIS	Mejoras al sistema de distribución de agua potable Com. Cabachuelas Bo. Torrecillas, instalación de 1,850ml de tubería de 4" PVC SDR-14	$ 436,223	$ 436,223	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 378,125	$ 54,525	$ -	$ -	$ -	$ 432,650
7-53-9001	Este	NAGUABO	Mejoras a sistema de acueductos, instalación de 460ml de tubería 4" PVC SDR 14 en el Sector Tablones del Bo. El Duque	$ 101,165	$ 101,165	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 94,414	$ 13,614	$ -	$ -	$ -	$ 108,028

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-56-9001	Sur	PATILLAS	Cosntrucción de interconexiones entre la línea de distribución de 24" y 30" y el sistema de agua de Patillas y Arroyo e instalción de válvulas de control	$ 116,728	$ 116,728	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM OTH	0	$ 108,939	$ 15,709	$ -	$ -	$ -	$ 124,648
7-56-9002	Sur	PATILLAS	Mejoras a EB Marin 4, verja, loza y muro de retención	$ 70,037	$ 70,037	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM OTH	0	$ 65,364	$ 9,425	$ -	$ -	$ -	$ 74,789
7-56-9004	Sur	PATILLAS	Reemplazo de 1,000 p de tubería de 8" en PVC por tubería ductil iron desde EB Felicita hasta el Bo. Palmas	$ 77,819	$ 77,819	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.22	$ 72,626	$ 10,472	$ -	$ -	$ -	$ 83,099
7-57-2000	Sur	PEÑUELAS	Diseño y Construcción para el reemplazo de verja en tanques Rucio 2, Rucio 3 y Caracoles	$ 43,579	$ 43,579	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Cumpl - APlan	0.87	$ 40,671	$ 5,865	$ -	$ -	$ -	$ 46,535
7-57-8000	Sur	PEÑUELAS	Diseño y Construcción Mejoras EBAS Rio Sol	$ 311,276	$ 311,276	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Calidad	0.47	$ 290,505	$ 41,890	$ -	$ -	$ -	$ 332,395
7-58-9002	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras a modulo de sedimentación y represa en PF Guaraguao	$ 315,945	$ 315,945	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0	$ 294,863	$ 42,518	$ -	$ -	$ -	$ 337,381
3-61-6001	Este	RIO GRANDE	Mejoras sistema distribucion Palmasola, PF Guzman Arriba, Cubuy (Nuevo10)	$ 1,134,407	$ 1,134,407	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.44	$ 985,132	$ 142,053	$ -	$ -	$ -	$ 1,127,185
7-61-9000	Este	RIO GRANDE	Mejoras de seguridad ocupacional en PF El Yunque	$ 77,699	$ 77,699	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.52	$ 67,475	$ 9,730	$ -	$ -	$ -	$ 77,204
7-64-9000	Sur	SALINAS	Mejoras Pozo Las Margaritas: parcela, generadores de emergencia, construcción verja hormigón y portón	$ 60,668	$ 60,668	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Crec	0.17	$ 52,588	$ 7,583	$ -	$ -	$ -	$ 60,171
7-64-9003	Sur	SALINAS	Diseño y Construcción al camino de acceso y mejoras al sistema eléctrico de la EB y taqnue Cerrito	$ 38,909	$ 38,909	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM Cumpl - APlan	0.17	$ 36,313	$ 5,236	$ -	$ -	$ -	$ 41,549
7-65-9001	Oeste	SAN GERMAN	Mejoras a la EB La Tea, construcción depocetopara mejorar la succión	$ 330,731	$ 330,731	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	1.22	$ 308,662	$ 44,508	$ -	$ -	$ -	$ 353,170
7-66-5091	Metro	SAN JUAN	Instalación de 175ml de tubería saniatria de 8" Sector Los Peña calle Ramón Garay	$ 249,496	$ 249,496	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.27	$ 216,267	$ 31,185	$ -	$ -	$ -	$ 247,452
7-66-5092	Metro	SAN JUAN	Instalación de 900 pies de tubería de 6" con 7 válvuals, 7 Y conflange y acople para manga de 4" para linea de recirculación de los clarificadores y construcción rampa de hormigón para descarga de	$ 28,059	$ 28,059	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl - SREN	1.04	$ 24,322	$ 3,507	$ -	$ -	$ -	$ 27,829
7-66-6003	Metro	SAN JUAN	Instalación de 400ml de tubería de agua potable de 4" en la calle 35 de Hill Brothers	$ 165,320	$ 165,320	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.87	$ 143,302	$ 20,664	$ -	$ -	$ -	$ 163,965
7-70-8000	Norte	TOA ALTA	Adquisición de terrenos para le Estación de Bombas de Alcantarillados Sanitario Urb. Jardines de Escorial (Proyecto PPP)	$ 12,021	$ 11,521	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Calidad	1.79	$ 10,752	$ 1,550	$ -	$ -	$ -	$ 12,303
1-66-6000	Metro	TRUJILLO ALTO	Generador de emergencia EB Fairview	$ 891,666	$ 891,666	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.35	$ 788,817	$ 113,745	$ -	$ -	$ -	$ 902,562
7-72-2000	Metro	TRUJILLO ALTO	Sistema de acceso controlado Urb. Golden Hills aledaña a la PF Sergio Cuevas, como parte del plan integral de seguridad a la planta. Ordenanza Municipal #13	$ 36,793	$ 36,793	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM OTH	0	$ 34,338	$ 4,951	$ -	$ -	$ -	$ 39,289

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-72-6001	Metro	TRUJILLO ALTO	Cambio de romanas para el manejo de los cilindros de cloro en toneladas, mejoras al sistema de dosificación de cloro y cumplimiento de manejo de riesgo	$ 644,594	$ 644,594	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Cumpl	1.35	$ 558,745	$ 80,569	$ -	$ -	$ -	$ 639,315
7-73-8001	Norte	UTUADO	Renovación tramo de tubería alcantarillado sanitario en la calle Antonio R. Barcelo	$ 132,292	$ 132,292	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.92	$ 123,465	$ 17,803	$ -	$ -	$ -	$ 141,268
2-74-7000	Norte	VEGA ALTA	Instalación de 3,500ml de tubería de agua potable de 4" y 300 acometidas en el Bo. Sabana Hoyos (ref 7-74-9002)	$ 1,124,958	$ 1,124,958	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 995,200	$ 143,505	$ -	$ -	$ -	$ 1,138,705
7-74-9000	Norte	VEGA ALTA	Instalación de 1,400ml de tubería de agua potable de 4" en Bo. Bajuras	$ 358,956	$ 358,956	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 311,149	$ 44,867	$ -	$ -	$ -	$ 356,016
7-74-9001	Norte	VEGA ALTA	Instalación de 300ml de tubería de agua potable de 4" en la calle Emilio Varcalcel	$ 119,225	$ 119,225	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.13	$ 103,346	$ 14,902	$ -	$ -	$ -	$ 118,248
7-75-8000	Norte	VEGA BAJA	Trabajos de terminación de tramo de línea de fuerza 980 pies de 10" de la nuevas facilidades de la E/B de alcantarillado sanitario San Demetrio Com. Sandin	$ 74,373	$ 74,373	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Calidad	1.57	$ 64,467	$ 9,296	$ -	$ -	$ -	$ 73,763
7-75-8002	Norte	VEGA BAJA	Corregir filtraciones en troncal sanitaria Monte Carlo	$ 264,584	$ 264,584	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.92	$ 246,930	$ 35,606	$ -	$ -	$ -	$ 282,536
7-77-9000	Sur	VILLALBA	Mejoras y automatización PF Apeadero: reparación filtros, valvulas, actuadores, automatización lavado de filtros, sedimentadores, metros de flujo, aplicación polimeros, paneles elétricos	$ 151,669	$ 151,669	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0.34	$ 131,469	$ 18,957	$ -	$ -	$ -	$ 150,427
7-77-9002	Sur	VILLALBA	Diseño y Construcción de las mejoras de la PF Jagueyes	$ 311,276	$ 311,276	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0.17	$ 290,505	$ 41,890	$ -	$ -	$ -	$ 332,395
7-79-9002	Sur	YAUCO	Cambio de 50 acometidas de agua potable y eliminación de tubería existente calle 7 Bo. Palomas	$ 31,128	$ 31,128	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.39	$ 29,051	$ 4,189	$ -	$ -	$ -	$ 33,240
7-79-9003	Sur	YAUCO	Diseño y Construcción para la instalación de 320 ml de tubería en Sector Isleta	$ 96,496	$ 96,496	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Crec	0.39	$ 90,057	$ 12,986	$ -	$ -	$ -	$ 103,043
7-79-9005	Sur	YAUCO	Diseño y Construcción para la instalación de 135 ml de tubería en Solares Mariani	$ 31,128	$ 31,128	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Crec	0.17	$ 29,051	$ 4,189	$ -	$ -	$ -	$ 33,240
7-79-9006	Sur	YAUCO	Diseño y Construcción para el reemplazo de tapas para cajas de válvulas, reparación de verja sistema y rehabilitación de la represa de la PF Rancheras	$ 90,270	$ 90,270	Jun-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0.17	$ 84,247	$ 12,148	$ -	$ -	$ -	$ 96,395
7-42-8000	Norte	LARES	Instalación de sistema de alcantarillado sanitario en la calle Los Robles, Sector Campo Alegre, Bo. Pueblo	$ 114,257	$ 114,257	Aug-11	Mar-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM OTH	0	$ 109,255	$ 18,529	$ -	$ -	$ -	$ 127,784
7-46-9000	Este	LUQUILLO	Interconexión EB Mata de Plátano	$ 152,564	$ 152,564	Aug-11	Mar-12	AT	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	M DOH	1.17	$ 145,884	$ 24,741	$ -	$ -	$ -	$ 170,625
7-50-8001	Oeste	Mayaguez	Reemplazo de swichtgear de la PAS Mayaguez	$ 621,219	$ 621,219	Nov-11	Mar-12		Diseño	0	Alcantarillado Sanitario	Plantas de Alcantarillado	Estructura - REN							$ -
7-65-2000	Oeste	San German	Construcción de un muro en hormigón reforzado en predio del tanque Mon Ortiz	$ 114,845	$ 114,845	Nov-11	Mar-12		Diseño	0	Acueducto	Abastos	Estructura - REN							$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
1-17-5017	Metro	CATAÑO	Limpieza e Inspección Troncal Santaria Cataño	$ 400,404	$ 400,404	Jun-11	Apr-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	Nuevo	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.22	$ 158,481	$ 249,278	$ -	$ -	$ -	$ 407,759
0-99-3012	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 16,800,000	$ 16,800,000	Jul-11	Apr-12	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0	$ 16,800,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,800,000
1-66-5090	Metro	SAN JUAN	Remplazo de tubería de salida de la PAS Puerto Nuevo	$ 1,330,068	$ 1,330,068	Jun-11	Apr-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Calidad	0.61	$ 529,700	$ 833,174	$ -	$ -	$ -	$ 1,362,875
7-70-8001	Norte	TOA ALTA	Estación de bombas sanitaria Urb. Monte Sol	$ 288,646	$ 288,646	Jul-11	Apr-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Cumpl	0.7	$ 252,648	$ 63,162	$ -	$ -	$ -	$ 315,810
7-78-9003	Este	YABUCOA	Reemplazo tuberias distribucion Bos. Camino Nuevo y Limones (Comunidad Martorell) Yabucoa (Nuevo4)	$ 592,702	$ 592,702	Jun-11	Apr-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 523,165	$ 116,696	$ -	$ -	$ -	$ 639,861
1-80-2056	Metro	SAN JUAN	REMODELACION EDIFICIO SEDE - Estacionamiento (+1-80-2411)	$ 1,415,187	$ 667,398	Oct-11	Apr-12	Jan-00	SUBASTA	0	Edificios	Otros W&S	NM OTH	0.44	$ 180,756	$ 514,461	$ -	$ -	$ -	$ 695,217
7-05-6041	Obras menores	Aibonito	Diseño y Construcción de muro en gaviones, camino de acceso, verja y trabajos mecánicos en toma de aguas crudas Usabón, Bo. Llanos	$ 129,400	$ 129,400	Nov-11	Abr-12		Diseño	1	Acueducto	Abastos	Estructura - REN	1						$ -
7-13-9002	Este	Caguas	Diseño y Construcción instalación 183ml de tubería de agua potable de 4" diametro hierro ductil 350 en Ave. Principal de Urb. Mirador de Bairoa (Elimina la EB Prince)	$ 60,191	$ 60,191	Nov-11	Abr-12		Diseño	0	Acueducto	Sistemas de Acueductos	Estructura - REN							$ -
7-27-9004	Este	Fajardo	Instalación de 440ml tubería agua potable dúctil de 6" dia. 350 en calle Igualdad Sector Montemar	$ 187,452	$ 187,452	Nov-11	Abr-12		Diseño	0	Acueducto	Sistemas de Acueductos	Estructura - REN							$ -
7-33-9001	Este	Gurabo	Reemplazo de 213 ml tubería agua potable de 4" dia hierro ductil 350 en el Camino El Campito de la Com. Reparto de San José	$ 77,388	$ 77,388	Nov-11	Abr-12		Diseño	0	Acueducto	Sistemas de Acueductos	Estructura - REN							$ -
7-33-9002	Este	Gurabo	Reemplazo de 463 ml tubería agua potable de 4" dia PVC SDR14 en el Sector Los Chinos carretera PR-9942 del Barrio Celada	$ 137,579	$ 137,579	Nov-11	Abr-12		Diseño	0	Acueducto	Sistemas de Acueductos	Estructura - REN							$ -
4-58-5091	Sur	PONCE	Rehabilitación de los digestores anaeróbicos #1 y #2, compra e instalación de un quemador de gases y un generador de emergencia en la PAS de Ponce (Nuevo1)	$ 3,012,209	$ 3,012,209	Dec-10	Apr-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.09	$ 1,295,089	$ 1,509,384	$ -	$ -	$ -	$ 2,804,473
7-68-9003	Oeste	San Sebastian	Instalación válvula reguladora de flujo en la PF de San Sebastían	$ 73,182	$ 73,182	Nov-11	Abr-12		Diseño	0	Acueducto	Plantas de Filtración :	M DOH							$ -
7-78-9004	Este	Yabucoa	Diseño y Construcción reemplazo1810 ml tuberias transmisión 6" en la Comunidad Martorell del Barrio Limones (Fase I)	$ 714,165	$ 714,165	Nov-11	Abr-12		Diseño	0	Acueducto	Sistemas de Acueductos	Estructura - REN							$ -
1-45-6000	Metro	LOIZA	Sistema de agua potable sector Colobo, incluyendo 2,300 ml de tubería de 4", 375 acometidas, cajas de contadores e hidrantes.	$ 1,239,567	$ 1,239,567	Mar-11	May-12	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM Crec	0.83	$ 485,676	$ 738,125	$ -	$ -	$ -	$ 1,223,802
7-10-2000	Este	BARRANQUITAS	Diseño y construcción de caseta para generador de emergencia en la Toma de Aguas Crudas Barrancas	$ 91,355	$ 91,355	Aug-11	May-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM OTH	1.04	$ 72,541	$ 29,629	$ -	$ -	$ -	$ 102,171
7-18-2000	Este	CAYEY	Rehabilitacaión de vagones de almacen de materiales y equipo del Area Operacional de Cayey	$ 22,839	$ 22,839	Aug-11	May-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Edificios	Otros W&S	NM OTH	0.78	$ 18,135	$ 7,407	$ -	$ -	$ -	$ 25,543

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-09-9200	Norte	BARCELONETA	Instalacion de 1,320ml tuberia ade 8" en PR-681 desde Com. Punta Palmas a Com. Palmas Altas	$ 472,837	$ 472,837	Oct-11	May-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 313,284	$ 209,728	$ -	$ -	$ -	$ 523,012
4-09-6017	Sur	JUANA DIAZ	Combinado: COMPLEMENTO TRANSMISIÓN JUANA DIAZ - PF COTO LAUREL LÍNEA DE 16" DESDE SISTEMA TOA VACA A TANQUE SABANA LLANA	$ 952,546	$ 928,655	Dec-10	May-12	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5-50-6003	Oeste	Mayaguez	Mejoras a la PF Miradero (medio filtrante, underdrain para filtros, actuadores de valvulas, calibración de actuadores e integración al sistema de control existente)	$ 2,928,340	$ 2,928,340	Oct-11	Jun-12		Subasta	0	Acueducto	Plantas de Filtración :	NM CUMPL							$ -
7-05-9001	Este	AIBONITO	Mejoras electricas, controles e instalación de sistema de velocidad variable en la Represa y EB nen la PF La Plata	$ 121,807	$ 121,807	Aug-11	Jun-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM OTH	1.04	$ 92,635	$ 43,593	$ -	$ -	$ -	$ 136,228
2-20-5003	Norte	CIALES	Conexión de la Cominidad de Morovis al sistema sanitario	$ 666,590	$ 666,590	Aug-11	Jun-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarilado	SAS	NM OTH	0.09	$ 506,944	$ 238,562	$ -	$ -	$ -	$ 745,505
3-40-5003	Obras menores	Juncos	Reparación de emergencia tubería troncal sanitaria a campo traviesa cerca del Rio Valecniano (tramo MH-14 7 MH-16)	$ 402,741	$ 402,741	Mar-12	Jun-12			1	Alcantarilado Sanitario	Sistemas de Alcantarilados	NM OTH	1						$ -
1-16-5024	Metro	CAROLINA	Mejoras a la estación de bombas de aguas sanitarias Villa Carolina	$ 7,311,447	$ 7,301,047	May-11	Jun-12	x	DISEÑO	0	Alcantarilado	EB	M EPA	0	$ 2,527,906	$ 4,431,270	$ 267,661	$ -	$ -	$ 7,226,837
5-37-7000	Oeste	ISABELA	Diseño / Construcción Tanques de Arenales 0.637mg	$ 559,208	$ 559,208	May-11	Jun-12	Jan-00	DISEÑO	0	Acueducto	Abastos	NM OTH	0	$ 208,023	$ 364,653	$ 22,026	$ -	$ -	$ 594,702
5-51-7001	Oeste	ISABELA	Diseño / Construcción Tanques Voladoras 1mg	$ 557,397	$ 556,116	May-11	Jun-12	Jan-00	DISEÑO	0	Acueducto	Abastos	NM OTH	0	$ 206,873	$ 362,637	$ 21,904	$ -	$ -	$ 591,414
5-51-7000	Oeste	MOCA	Diseño / Construcción Tanque Marias 600,000g & estación de bombas	$ 557,398	$ 557,398	May-11	Jun-12	Jan-00	DISEÑO	0	Acueducto	Abastos	NM OTH	0	$ 207,350	$ 363,472	$ 21,955	$ -	$ -	$ 592,777
2-07-7002	Norte	ARECIBO	Reemplazo 1,800ml de tubería en la carretera PR-123 del Bo. Rio Arriba	$ 761,470	$ 761,470	Jun-11	Jun-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0	$ 259,517	$ 493,716	$ 28,484	$ -	$ -	$ 781,717
7-78-9002	Este	YABUCOA	Rehabiliatcion Pozo Voluntario	$ 92,707	$ 92,707	Oct-11	Jun-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0.7	$ 52,516	$ 49,655	$ -	$ -	$ -	$ 102,171
3-13-7001	Sur	GUAYAMA	WTP - GUAYAMA URBANO (Guayama Carite) - CUMPLIMIENTO	$ 4,553,992	$ 4,251,975	Oct-10	Jun-12	Dec-11	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ 1,483,949	$ 1,935,232	$ 109,772	$ -	$ -	$ 3,528,953
1-01-7008	Metro	GUAYNABO	EB Finca Rosso I, Generador de Emergencia	$ 4,718,266	$ 4,471,689	Dec-10	Jun-12	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	EB	NM Calidad	0	$ 1,611,991	$ 2,175,532	$ 157,267	$ -	$ -	$ 3,944,790
0-80-2806	ISLA	ISLA	Automatizacion de Plantas de Filtración y Alcantarillado Sanitario Fase II (Ref 0-80-2805 - Auto1)	$ 38,237,403	$ 38,237,403	Sep-10	Jun-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	1.34	$ 15,161,107	$ 18,910,185	$ 1,112,364	$ -	$ -	$ 35,183,656
4-55-5001	Sur	OROCOVIS	ELIMINACION PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ALTURAS DE OROCOVIS Y SISTEMA SANITARIO COM. EL GATO, FASE II	$ 9,229,980	$ 9,229,980	Jun-10	Jun-12	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarilado	SAS	NM Cumpl	1.57	$ 3,314,155	$ 3,786,333	$ 240,543	$ -	$ -	$ 7,341,031
1-66-6002	Metro	SAN JUAN	Mejoras a la EB de acueductos del Viejo San Juan, Gastón Nogales	$ 686,688	$ 686,688	Jun-11	Jul-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM OTH	0.69	$ 495,349	$ 257,274	$ -	$ -	$ -	$ 752,623

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-67-6017	Obras menores	San Lorenzo	Reeplazo de medio filtrante y bloque de drenaje del filtro #2 de la Planta de Filtración Cerro Gordo	$ 210,275	$ 210,275	Feb-12	Jul-12		Planificación	1	Acueducto	Plantas de Filtración:	Estructura - REN	1						$ -
Nuevo2	Sur	PONCE	Generadores EB salida PAS Ponce	$ 891,666	$ 891,666	Jun-11	Jul-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Cumpl	0.31	$ 284,825	$ 570,575	$ 58,260	$ -	$ -	$ 913,659
7-04-9001	Este	Aguas Buenas	D&C para la instalación de control de velocidad variable en la EB de aguas crudas de la PF Jagueyes	$ 138,592	$ 138,592	Nov-11	Jul-12		Diseño	0	Acueducto	Plantas de Filtración:	Estructura - REN							$ -
7-08-6021	Obras menores	Arroyo	Rehabilitación y mejoras a tanques de la Región: El Piojo, Jacanas I, II y III; Olimpo en Gauyama, Jacaboa en Patillas y Cerrito en Salinas	$ 148,810	$ 148,810	Nov-11	Jul-12		Diseño	0	Acueducto	Abastos	Estructura - REN	0						$ -
7-20-9001	Norte	Ciales	Acuerdo Municipio Ciales: renovación infraestructura de agua potable de 6" y alcantarillado sanitario ede 12" en la calle Palmer	$ 693,052	$ 693,052	Nov-11	Jul-12		Diseño	0	Alcantarillado Sanitario	Otros Proyectos de Acueduct	NM CUMPL							$ -
7-24-6014	Obras menores	Corozal	Mejoras a la toma de aguas crudas de la Planta de Filtración Negros	$ 401,787	$ 401,787	Nov-11	Jul-12		Diseño	0	Acueducto	Abastos	Estructura - REN	0						$ -
0-80-7001	Isla	Isla	Diseño y Construcción para la instalación de equipos de desinfección en sistemas Non-PRASA Fase II	$ 806,946	$ 806,946	Nov-11	Jul-12	Sep-12	Diseño	0	Acueducto Rural	Sistemas de Acueductos	M DOH	0						$ -
1-66-7001	Metro	San Juan	Diseño & Construcción para la instalaión de tubería de agua potable en el Camino Hogar del Niño, Cupey	$ 404,375	$ 404,375	Dic-11	Jul-12			0	Acueducto Rural	Sistemas de Acueductos	NM OTH	0						$ -
0-80-9097	ISLA	ISLA	Renovación y mejoras de los equipos para la medición y registro de flujo en las plantas de filtración - Fase III	$ 3,114,123	$ 3,114,123	Dec-11	Jul-12	x	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M STS	1.13	$ 629,198	$ 2,482,598	$ 307,760	$ -	$ -	$ 3,419,556
7-54-6011	Obras menores	Naranjito	Construcción de verja de seguridad para la Planta de Filtración Naranjito Urbano (Planta Vieja)	$ 83,333	$ 83,333	Mar-12	Jul-12			0	Acueducto	Plantas de Filtración:	Estructura - REN	0						$ -
8-55-5020	Sur	OROCOVIS	ELIMINACION PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ALTURAS DE OROCOVIS Y SISTEMA SANITARIO COM. EL GATO, FASE I Ref 4-55-5020	$ 4,063,798	$ 3,547,368	Nov-09	Aug-12	Jun-16	CONSTRUCCIÓN	26	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.44	$ 1,302,467	$ 1,155,356	$ 161,463	$ -	$ -	$ 2,619,286
0-99-9012	ISLA	ISLA	Mantenimiento Preventivo	$ 15,215,200	$ 15,215,200	Jul-11	Aug-12	x	REN y Otros	0	PMP	Otros W&S	M EPA	1.74	$ 9,200,298	$ 7,083,415	$ -	$ -	$ -	$ 16,283,713
0-99-2012	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 2,707,123	$ 2,707,123	Aug-11	Aug-12	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ 754,911	$ 1,814,583	$ 226,473	$ -	$ -	$ 2,795,967
0-99-8012	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo, menos CIP Obras Menores	$ 35,394,225	$ 35,394,225	Aug-11	Aug-12	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ 10,127,405	$ 24,343,280	$ 3,038,221	$ -	$ -	$ 37,508,906
3-13-6000	Este	CAGUAS	Techos para dos tanques de distribución y remplazo de palataforma de bombas y escaleras de PF Caguas Sur	$ 2,930,963	$ 2,930,963	Mar-11	Aug-12	Dec-16	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.48	$ 954,208	$ 1,653,360	$ 243,053	$ -	$ -	$ 2,850,621
0-80-6212	ISLA	ISLA	Implementación Mejoras a Represas y Embalses	$ 5,700,000	$ 5,700,000	Aug-11	Aug-12	Jan-00	REN y Otros	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - Dams	0.96	$ 3,168,278	$ 3,206,527	$ -	$ -	$ -	$ 6,374,805
7-22-8003	Sur	COAMO	Remoción de postes averiados en EB Coamo Main	$ 75,954	$ 75,954	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM OTH	0.34	$ 31,745	$ 51,357	$ -	$ -	$ -	$ 83,102

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-22-8004	Sur	COAMO	Diseño y Construcción para mejoras a EBAS Coamo Main y Villa Madrid	$ 140,074	$ 140,074	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Calidad	0.87	$ 58,544	$ 94,712	$ -	$ -	$ -	$ 153,256
7-22-9000	Sur	COAMO	Diseño y Construcción para mejoras sistema de operación y proceso de la PF Coamo	$ 311,276	$ 311,276	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	0	$ 130,097	$ 210,472	$ -	$ -	$ -	$ 340,569
7-29-9001	Sur	GUANICA	Diseño y Construcción para la instalación de nuevo panel de control en la EB La Luna	$ 54,473	$ 54,473	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	0.52	$ 22,767	$ 36,833	$ -	$ -	$ -	$ 59,600
7-30-2000	Sur	GUAYAMA	Mejoras a caseta de seguridad, instalación de camaras de seguridad y mejoras a planta física del Centro de Operaciones	$ 116,728	$ 116,728	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Edificios	Otros W&S	NM OTH	0	$ 48,786	$ 78,927	$ -	$ -	$ -	$ 127,713
7-30-8001	Sur	GUAYAMA	Rehabilitación y reemplazo de tubería saniataria de hormigón reforzado de 8" en Alturas de Olimpo	$ 49,804	$ 49,804	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0.7	$ 20,816	$ 33,675	$ -	$ -	$ -	$ 54,491
7-30-8002	Sur	GUAYAMA	Rehabilitación y reemplazo de 205p tubería saniataria de hormigón reforzado de 8" en la Urb. Costa Sur	$ 77,819	$ 77,819	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0.7	$ 32,524	$ 52,618	$ -	$ -	$ -	$ 85,142
7-30-8003	Sur	GUAYAMA	Rehabilitación y reemplazo de 350p tubería saniataria de hormigón reforzado de 8" en la Urb. Villa Caribe de Guayama	$ 116,728	$ 116,728	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0.7	$ 48,786	$ 78,927	$ -	$ -	$ -	$ 127,713
7-30-9004	Sur	GUAYAMA	Rehabilitación y construcción del camino de acceso al Tanque Olimpo	$ 18,677	$ 18,677	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0	$ 7,806	$ 12,628	$ -	$ -	$ -	$ 20,434
7-30-9006	Sur	GUAYAMA	Rehabilitación y construcción de 80pies de verja de colindancia, restablecer material de relleno y reparar cuneton en EB Rexmanor	$ 15,564	$ 15,564	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM OTH	0	$ 6,505	$ 10,524	$ -	$ -	$ -	$ 17,028
7-30-9007	Sur	GUAYAMA	Conexión eléctrica permanente del sistema de tratamiento de cieno al generador de emergencia de la PF Guayama	$ 38,909	$ 38,909	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM OTH	0.26	$ 16,262	$ 26,309	$ -	$ -	$ -	$ 42,571
7-57-9001	Sur	GUAYAMA	Diseño y Construcción para el reemplazo del sistema de lavado supercial de la PF Guayama	$ 31,128	$ 31,128	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl - APlan	0.34	$ 13,010	$ 21,047	$ -	$ -	$ -	$ 34,057
7-31-9002	Sur	GUAYANILLA	Diseño y Construcción para las mejoras a la EB Jagua Tuna	$ 46,691	$ 46,691	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	0	$ 19,515	$ 31,571	$ -	$ -	$ -	$ 51,085
7-37-9000	Oeste	ISABELA	Rehabilitación PF Jobos	$ 151,669	$ 151,669	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.17	$ 58,876	$ 95,250	$ -	$ -	$ -	$ 154,126
7-37-9001	Oeste	ISABELA	Nueva toma de agua y tanque de oxidación / floculación en PF Guajataca	$ 653,695	$ 653,695	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.44	$ 253,756	$ 410,527	$ -	$ -	$ -	$ 664,283
7-38-9000	Norte	JAYUYA	Diseno y Construcción para renovacion de tuberia de agua potable delas Coms. Santa Clara y Villa Canona y a lo largo de la PR-144	$ 747,062	$ 747,062	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.13	$ 312,234	$ 505,132	$ -	$ -	$ -	$ 817,365
7-39-9000	Sur	JUANA DIAZ	Diseño y Construcción de sistema de monitoreo continuo de cloro y PH para los Pozos de Juana Diaz, Villba y Santa Isabel	$ 770,408	$ 770,408	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	1.09	$ 321,991	$ 520,917	$ -	$ -	$ -	$ 842,908
7-49-9001	Sur	MAUNABO	Rehabilitación de lechos de secado del sistena de tratamiento de cienos en PF Lizas	$ 62,255	$ 62,255	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	0	$ 26,019	$ 42,094	$ -	$ -	$ -	$ 68,114

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-55-9005	Sur	OROCOVIS	Diseño y Construcción de instalación de tubería de 2" con 16 acometidas en Sector Don Mochín y Kike López del Bo. Saltos	$ 171,202	$ 171,202	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Crec	0	$ 71,554	$ 115,759	$ -	$ -	$ -	$ 187,313
7-56-9003	Sur	PATILLAS	Diseño y Construcción de EB soterrada y demolición de EB y tanque 3 Puntos	$ 233,457	$ 233,457	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM OTH	0.34	$ 97,573	$ 157,854	$ -	$ -	$ -	$ 255,427
7-56-9005	Sur	PATILLAS	Diseño y Construcción sistema de drenaje del tanque Jacaboa y su conexión al sistema de agua de Jacaboa	$ 85,601	$ 85,601	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.52	$ 35,777	$ 57,880	$ -	$ -	$ -	$ 93,656
7-56-9006	Sur	PATILLAS	Instalación de 600p de tubería de 4" en el Sector Casillas del Bo. Marin Bajo	$ 23,346	$ 23,346	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Crec	0.18	$ 9,757	$ 15,785	$ -	$ -	$ -	$ 25,543
7-57-8001	Sur	PEÑUELAS	Diseño y Construcción para la renovación de la tubería de alcantarillado sanitario en la calle Muñoz Rivera	$ 311,276	$ 311,276	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0.47	$ 130,097	$ 210,472	$ -	$ -	$ -	$ 340,569
7-58-8002	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras sistema de aereación tanques recibidores y lechos de secado PAS Ponce	$ 122,954	$ 122,954	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	0	$ 51,388	$ 83,136	$ -	$ -	$ -	$ 134,525
7-58-8003	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras plataformas y encintados EBAS Mercedita	$ 12,451	$ 12,451	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	0	$ 5,204	$ 8,419	$ -	$ -	$ -	$ 13,623
7-58-8004	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras viga EBAS Caracoles	$ 9,338	$ 9,338	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	0	$ 3,903	$ 6,314	$ -	$ -	$ -	$ 10,217
7-58-9004	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras y muro de contención en la EB Los Robles	$ 77,819	$ 77,819	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM OTH	0	$ 32,524	$ 52,618	$ -	$ -	$ -	$ 85,142
7-58-9005	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras y muro de contención en la EB Parcelas Irizarry	$ 77,819	$ 77,819	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM OTH	0	$ 32,524	$ 52,618	$ -	$ -	$ -	$ 85,142
7-58-9006	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras sub-estación eléctrica Pozo Fagot	$ 62,255	$ 62,255	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0	$ 26,019	$ 42,094	$ -	$ -	$ -	$ 68,114
7-58-9007	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras Sub-estación eléctrica EB Jacaranda	$ 54,473	$ 54,473	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	EB	NM Calidad	0	$ 22,767	$ 36,833	$ -	$ -	$ -	$ 59,600
7-58-9008	Sur	PONCE	Diseño y Construcción Mejoras sub-estación eléctrica Pozo UPR	$ 62,255	$ 62,255	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	0	$ 26,019	$ 42,094	$ -	$ -	$ -	$ 68,114
7-68-5000	Oeste	SAN SEBASTIAN	Instalación de 500ml de tubería de 10", 800ml de 12", 700ml de 6", 4 manholes y EB de aguas usadas y conexiones Com. Paralelo 38 Fase I	$ 703,670	$ 703,670	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.62	$ 273,156	$ 441,912	$ -	$ -	$ -	$ 715,068
7-68-5001	Oeste	SAN SEBASTIAN	EB de aguas usadas Com. Paralelo 38 Fase II	$ 682,512	$ 682,512	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Crec	1.62	$ 264,943	$ 428,624	$ -	$ -	$ -	$ 693,567
7-68-5002	Oeste	SAN SEBASTIAN	Instalación de 800ml tubería sanitaria de 8" y 2 manholes Com. Tablastilla y Pueblo Nuevo	$ 268,834	$ 268,834	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.62	$ 104,358	$ 168,830	$ -	$ -	$ -	$ 273,188
7-69-8000	Sur	SANTA ISABEL	Diseño y Construcción para las mejoras de la EBAS Playita Cortada de Santa Isabel y EBAS Pastillo de Juana Díaz	$ 35,797	$ 35,797	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM OTH	0.17	$ 14,961	$ 24,204	$ -	$ -	$ -	$ 39,165

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-69-8001	Sur	SANTA ISABEL	Diseño y Construcción Mejoras a oficinas de supervisores de la PAS Santa Isabel	$ 28,015	$ 28,015	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM OTH	0	$ 11,709	$ 18,942	$ -	$ -	$ -	$ 30,651
7-69-8003	Sur	SANTA ISABEL	Diseño y Construcción Mejotas al sistema de proceso y control de la PAS Santa Isabel	$ 183,653	$ 183,653	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	0.7	$ 76,757	$ 124,178	$ -	$ -	$ -	$ 200,936
7-70-9000	Norte	TOA ALTA	Sistema anti-ariete para la tuberia de aguas crudas de la PF Enrique Ortega	$ 428,782	$ 428,782	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.04	$ 179,209	$ 289,925	$ -	$ -	$ -	$ 469,134
7-77-8000	Sur	VILLALBA	Diseño y Construcción para mejoras a EBAS Jagueyes - Villalba y Lomas - Juana Diaz	$ 62,255	$ 62,255	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Calidad	0.17	$ 26,019	$ 42,094	$ -	$ -	$ -	$ 68,114
7-77-9001	Sur	VILLALBA	Diseño y Construcción de las mejoras a la represa del lago Toa Vaca	$ 46,691	$ 46,691	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM OTH	0.17	$ 19,515	$ 31,571	$ -	$ -	$ -	$ 51,085
7-79-8001	Sur	YAUCO	Diseño y Construcción para las mejoras de la EBAS Luchetti	$ 108,947	$ 108,947	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Calidad	0.61	$ 45,534	$ 73,665	$ -	$ -	$ -	$ 119,199
7-79-9007	Sur	YAUCO	Diseño y Construcción para la instalación de 300 ml de tuberia de agua cruda de 14" para la PF Yauco	$ 186,765	$ 186,765	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	0.17	$ 78,058	$ 126,283	$ -	$ -	$ -	$ 204,341
7-79-9009	Sur	YAUCO	Diseño y Construcción para la rehabilitación del sistema de telemetría de la represa de la PF Rancheras	$ 62,255	$ 62,255	Oct-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	0.47	$ 26,019	$ 42,094	$ -	$ -	$ -	$ 68,114
5-63-5002	Oeste	SABANA GRANDE	Combinado: Eliminación de la PAS de Sabana Grande Fase II, linea de Sabana Grande a San German, Ref 4-63-5030 (Desarrolladores Paseo del Valle y Villas de Porta Coeli) (Misla)	$ 3,197,725	$ 3,196,289	May-11	Aug-12	Jun-11	DISEÑO	0	Alcantarillado	PASE	M EPA	1.62	$ (475)	$ (930)	$ (162)	$ -	$ -	$ (1,567)
2-75-5051	Norte	VEGA BAJA	Terminación segunda LATERALES Y TRONCAL SANITARIA, ESTACIONES DE BOMBAS, COM. SANDIN BO. PUERTO NUEVO (2-75-5000 & 2-75-5040)	$ 10,831,818	$ 10,831,818	May-11	Aug-12	Jan-00	DISEÑO	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.87	$ 3,271,293	$ 6,398,914	$ 1,116,218	$ -	$ -	$ 10,786,424
7-70-7001	Obras menores	Toa Alta	Nueva conexión para el sistema de distribución de agua potable de la Urb. Los Palacios	$ 477,163	$ 477,163	Mar-12	Ago-12			1	Acueducto Rural	Sistemas de Acueductos	Estructura - REN	1						$ -
7-73-9001	Norte	UTUADO	Construcción tanque de lamacenamiento de agua potable de 0.05 MG para el Sector Sammy Vélez	$ 269,581	$ 269,581	Aug-11	Aug-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM OTH	1.04	$ 144,718	$ 156,778	$ -	$ -	$ -	$ 301,495
4-58-5087	Sur	PONCE	Construcción sistema alcantarillado sanitario para la zona historica (Ponce en Marcha) Fase IIIA, IIIB, IIIC	$ 1,418,582	$ 1,418,357	Oct-09	Sep-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	18	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	0.22	$ 453,728	$ 440,343	$ 96,367	$ -	$ -	$ 990,438
4-58-6003	Sur	PONCE	Construcción sistema agua potable para la zona historica (Ponce en Marcha) Fase IIIA, IIIB y IIIC	$ 1,541,102	$ 1,540,877	Oct-09	Sep-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	18	Acueducto	Redes	NM Cumpl	0.22	$ 492,921	$ 478,381	$ 104,691	$ -	$ -	$ 1,075,994
5-50-6002	Oeste	MAYAGUEZ	Mejoras sistema de acueductos, Fase G (Instalación 750 ml de 24" PR 2) + 4-06-6036	$ 3,755,388	$ 3,755,388	Jan-11	Sep-12	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.83	$ 1,230,242	$ 2,027,695	$ 448,818	$ -	$ -	$ 3,706,755
8-03-5001	Oeste	AGUADILLA	Desarrollo alcantarillado sanitario Com. Vista Verde (5-03-5001)	$ 3,471,899	$ 2,597,318	Dec-10	Sep-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Crec	0	$ 828,030	$ 1,339,225	$ 268,910	$ -	$ -	$ 2,436,165
1-66-5087	Metro	SAN JUAN	Trabajos asociados a la rehabilitación, limpieza y remplazo de líneas en el área del proyecto San Juan Water Front	$ 1,564,446	$ 1,564,446	Jun-11	Sep-12	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.14	$ 439,812	$ 911,268	$ 211,996	$ -	$ -	$ 1,563,074

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
7-24-6015	Obras menores	Corozal	Mejoras a la represa de la Planta de Filtración Negros	$ 727,875	$ 727,875	Ene-12	Sep-12		Planificación	1	Acueducto	Abastos	Estructura - REN	1						$ -
0-80-9096	ISLA	ISLA	Renovación y mejoras de los equipos para la medición y registro de flujo en las plantas de filtración - Fase II	$ 5,507,013	$ 5,507,013	Dec-11	Sep-12	x	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M STS	1.13	$ 960,566	$ 3,974,342	$ 1,068,630	$ -	$ -	$ 6,003,537
2-70-6042	Obras menores	Toa Alta	Rehabilitación Planta de Filtración La Virgencita	$ 616,268	$ 616,268	Ene-12	Sep-12		Planificación	1	Acueducto	Abastos	NM OTH	1						$ -
0-80-9304	ISLA	ISLA	Medidas remediativas STS, término intermedio	$ 23,249,291	$ 23,249,291	Jun-11	Sep-12	Jun-12	PLANIFICACIÓN	Nuevo	Acueducto	PFE	M STS	0.7	$ 6,869,326	$ 15,020,242	$ 3,434,663	$ -	$ -	$ 25,324,231
2-09-7092	Norte	LARES	Sistema de acueductos Bos. Espino y Pezuela de Lares y Bo. Chamorro de Las Marías Fase II (Extensión a los Bos. Pezuela y Rio Prieto de Lares)	$ 7,621,539	$ 7,420,832	Feb-11	Sep-12	Dec-11	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	M DOH	1.45	$ 2,176,257	$ 3,871,368	$ 910,475	$ -	$ -	$ 6,958,099
2-38-5002	Norte	JAYUYA	ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GRIPIÑAS Fase I (+ 2-38-5001)	$ 5,602,152	$ 3,849,468	Dec-10	Oct-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 1,196,118	$ 1,949,229	$ 539,663	$ -	$ -	$ 3,685,010
7-34-9002	Norte	Hatillo	Construcción tanque de almacenamiento de agua potable de 0.25MG para el Bo. Campo Alegre	$ 729,106	$ 729,106	Nov-11	Oct-12		Diseño	0	Acueducto	Abastos	Estructura - REN							$ -
2-34-6001	Norte	QUEBRADILLAS	Mejoras al sistema de distribución Camuy- Hatillo-Quebradillas, Fase IB: PF Quebradillas ((Ref 2-14-7000 - Fase II 2-34-9002)	$ 1,409,654	$ 1,409,654	Mar-11	Oct-12	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	1.39	$ 425,666	$ 843,448	$ 228,598	$ -	$ -	$ 1,497,712
8-20-5020	Norte	CIALES	EXPANSION PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAS A E/B DOS RIOS (2-20-5020)	$ 14,099,120	$ 11,358,046	Sep-09	Nov-12	Jun-21	CONSTRUCCIÓN	15	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ 3,479,530	$ 3,425,500	$ 1,091,405	$ -	$ -	$ 7,996,436
1-15-5002	Metro	CANOVANAS	Mejoras a la Estación de bombas de aguas sanitarias Torrecillas	$ 6,574,970	$ 6,122,616	Apr-11	Nov-12	x	SUBASTA	0	Alcantarillado	EB	M EPA	0	$ 1,537,367	$ 3,219,996	$ 1,077,367	$ -	$ -	$ 5,834,730
4-77-6004	Sur	VILLALBA	Terminación y automatización PF Toa Vaca, Ref 9-99-7070	$ 4,597,344	$ 4,597,344	Jun-11	Nov-12	Dec-11	SUBASTA	0	Acueducto	PFN	M DOH	1.79	$ 1,135,425	$ 2,649,325	$ 946,188	$ -	$ -	$ 4,730,938
0-80-2807	ISLA	ISLA	Automatizacion de Plantas de Filtración y Alcantarillado Sanitario Fase III (Ref 0-80-2805 - Auto2)	$ 3,373,889	$ 3,373,889	Apr-11	Nov-12	Jan-00	SUBASTA	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	1.34	$ 973,515	$ 2,007,402	$ 671,650	$ -	$ -	$ 3,652,567
3-13-5050	Este	CAGUAS	TRONCAL AGUAS BUENAS-CAGUAS FASE II-B, INTERCEPCION Y ELIMINACION PARCIAL TRONCAL OESTE Y TERMINACION FASE II-A CRUCE RIO CAGUITAS (3-13-5060)	$ 18,167,018	$ 16,064,715	Oct-10	Dec-12	Jun-21	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.35	$ 4,184,134	$ 7,369,781	$ 2,646,782	$ -	$ -	$ 14,200,696
2-09-7093	Norte	LARES	Sistema de acueductos Bos. Espino y Pezuela de Lares y Bo. Chamorro de Las Marías Fase III (Extensión a los Bos. Cerrote y Chamorro de Las Marías)	$ 4,524,304	$ 4,510,661	Feb-11	Dec-12	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	0.75	$ 1,142,973	$ 2,196,301	$ 896,449	$ -	$ -	$ 4,235,723
5-02-5001	Oeste	AGUADA	Segunda terminacion laterales santarias Com. Luyando y cruce Quebrada Gallinero (Ref 2-02-5007)	$ 1,897,882	$ 1,539,462	Mar-11	Dec-12	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.22	$ 362,156	$ 753,875	$ 295,637	$ -	$ -	$ 1,411,668
0-80-2101	ISLA	ISLA	REMODELACION OFICINAS COMERCIALES	$ 18,805,709	$ 13,662,592	Jul-06	Dec-12	Jan-00	CONSTRUCCIÓN	50	Edificios	Otros W&S	NM Calidad	0.52	$ 2,366,748	$ 1,538,386	$ 774,572	$ -	$ -	$ 4,679,707
5-83-6002	Oeste	SABANA GRANDE	Eliminación de la PF La Máquina, nuevo sistema de distribución PF Maginas	$ 3,112,754	$ 3,112,754	Nov-11	Jan-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Cumpl	0.78	$ 473,391	$ 1,842,478	$ 1,089,821	$ -	$ -	$ 3,405,689

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
3-13-6001	Este	CAGUAS	Rehabilitación PF Caguas Norte	$ 6,518,474	$ 6,518,474	Dec-10	Jan-13	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.43	$ 1,699,482	$ 3,132,379	$ 1,332,927	$ -	$ -	$ 6,164,788
2-03-6001	Oeste	SAN SEBASTIAN	WTP SAN SEBASTIAN (PF Calabazas) - Mejoras 2 tomas de agua cruda	$ 2,707,577	$ 2,703,491	Dec-10	Jan-13	Jan-00	SUBASTA	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	1.09	$ 652,076	$ 1,237,613	$ 572,230	$ -	$ -	$ 2,461,919
2-07-6000	Norte	ARECIBO	Evaluación del potencial de extracción de agua subterranea del acuifero de la costa norte desde Barceloneta a Arecibo Fase I y II, para aumentar el suminstro de agua a los sistemas, Superacueducto	$ 1,690,200	$ 1,665,200	Jun-11	Jan-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Crec	0.34	$ 383,344	$ 843,698	$ 470,623	$ -	$ -	$ 1,697,665
1-80-2415	Norte	ARECIBO	Evaluación de la Integridad del Superacueducto	$ 684,000	$ 684,000	Jun-11	Jan-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM OTH	0.17	$ 171,355	$ 377,133	$ 210,369	$ -	$ -	$ 758,857
1-66-5085	Metro	SAN JUAN	Trabajos asociados a la reparacion de la Troncal de Miramar, San Juan Water Front	$ 3,150,552	$ 3,150,552	Jun-11	Jan-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.75	$ 704,941	$ 1,551,499	$ 865,441	$ -	$ -	$ 3,121,880
7-03-6075	Obras menores	Aguadilla	Subestación eléctrica para la estación de bombas de aguas crudas en el Lago Calero	$ 566,125	$ 566,125	Nov-11	Ene-13		Diseño	1	Acueducto	Abastos	Estructura - REN	1						$ -
4-30-7101	Sur	GUAYAMA	Diseño - Construcción de mejoras al sistema de distribución de las Coms. Carite y Guamaní, instalación de tubería, válvulas reguladoras y sostenedoras	$ 1,385,554	$ 1,385,554	Dec-11	Feb-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.04	$ 163,649	$ 778,907	$ 630,993	$ -	$ -	$ 1,573,550
3-23-6240	Este	CAYEY	MEJORAS PLANTA FILTROS URBANA: TURBIDEZ Y BACTERIOLOGIA	$ 433,832	$ 433,832	Jun-11	Feb-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.44	$ 93,057	$ 202,916	$ 131,400	$ -	$ -	$ 427,373
4-28-7010	Sur	JUANA DIAZ	Extensión sistema de acueductos para el Sector San Carlo. Bo Collores	$ 4,769,024	$ 4,550,835	Jun-11	Feb-13	SEP 03-2012	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	M DOH	1.45	$ 945,678	$ 2,214,160	$ 1,386,692	$ -	$ -	$ 4,546,531
8-12-5000	Oeste	CABO ROJO	Eliminación de la PAS Boquerón (Villa Taina) 5-12-5000	$ 9,306,725	$ 7,068,950	Dec-10	Feb-13	Jun-16	CONSTRUCCIÓN	0	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.62	$ 1,693,281	$ 3,206,426	$ 1,765,336	$ -	$ -	$ 6,665,044
0-80-2808	ISLA	ISLA	Automatizacion de Plantas de Filtración y Alcantarillado Sanitario Fase IV (Ref 0-80-2805 - Auto3)	$ 42,735,921	$ 42,735,921	Jul-11	Feb-13	Jan-00	DISEÑO	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	1.34	$ 9,941,421	$ 22,559,378	$ 15,294,494	$ -	$ -	$ 47,795,293
0-80-2809	ISLA	ISLA	Automatizacion de Plantas de Filtración y Alcantarillado Sanitario Fase V (Ref 0-80-2805 - Auto4)	$ 17,994,072	$ 17,994,072	Jul-11	Feb-13	Jan-00	DISEÑO	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	1.34	$ 4,185,861	$ 9,498,686	$ 6,439,787	$ -	$ -	$ 20,124,334
Nuevo3	Sur	PONCE	Techo tanques distribución PF Ponce Vieja	$ 7,430,550	$ 7,430,550	Jul-11	Feb-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	0.31	$ 1,602,911	$ 3,637,374	$ 2,466,016	$ -	$ -	$ 7,706,301
Nuevo15	Oeste	MOCA	Eliminacion de la PF Rochas	$ 4,773,285	$ 4,773,285	Oct-11	Feb-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	0	$ 1,144,312	$ 3,734,338	$ 229,884	$ -	$ -	$ 5,108,534
2-52-6000	Norte	MOROVIS	PF Morovis Urbano - Rehabilitación de filtros, reemplazo de válvulas, instalación de "tube settlers", aumento de capacidad de floculación, mejoras al sistema de lavado de filtros y tanque de distribución.	$ 3,182,197	$ 3,182,197	Oct-11	Feb-13	Dec-16	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ 473,391	$ 1,682,411	$ 1,249,888	$ -	$ -	$ 3,405,689
1-11-5040	Metro	BAYAMON	Alc. Sanit. Urb. El Zorzal y Haciendas Bethel Barrio Buena Vista	$ 3,348,369	$ 3,342,261	Mar-11	Mar-13	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 77,506	$ 158,536	$ 102,167	$ -	$ -	$ 338,210
4-22-6101	Sur	COAMO	Terminación linea de transmisión de Juana Diaz - Coamo, interconexiones y pruebas de presión	$ 685,166	$ 685,166	Jun-11	Mar-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.3	$ 159,386	$ 344,060	$ 256,704	$ -	$ -	$ 760,150

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
2-09-5004	Norte	Barceloneta	Suplir e instalar sistema de manejo y disposición de cienos por centrífuga en la PAS de Barceloneta	$ 1,219,068	$ 1,219,068	Oct-12	Mar-13			0	Alcantarillado Sanitario	Plantas de Alcantarillado	NM CUMPL							$ -
0-80-9071	Isla	Isla	Diseño e instalación de equipo de medición de energía para auditorias de energía	$ 1,643,956	$ 1,643,956	Ene-13	Mar-13		Planificación	0	Sistemas Comunes	Otros Proyectos de Acueduct	NM OTH	0						$ -
1-16-5032	Metro	CAROLINA	CONSTRUCCION DE DOS (2) ESPESADORES PLANTA ALCANTARILLADO REGIONAL	$ 573,250	$ 573,250	Aug-11	Mar-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	M Demanda	1.3	$ 96,218	$ 266,318	$ 210,190	$ -	$ -	$ 572,726
1-01-6095	Metro	GUAYNABO	WTP GUAYNABO - CUMPLIMIENTO	$ 16,700,193	$ 16,700,193	Aug-11	Mar-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M Demanda	1.44	$ 2,815,533	$ 7,792,994	$ 6,150,599	$ -	$ -	$ 16,759,126
5-50-5000	Oeste	MAYAGUEZ	Mejoras al sistema sanitario Mayaguez Terrace, incluyendo estación de bombas	$ 4,830,270	$ 4,756,561	Mar-11	Apr-13	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	0	$ 1,065,268	$ 2,181,263	$ 1,623,266	$ -	$ -	$ 4,869,797
2-09-6007	Metro	TOA ALTA	MEJORAS DE PF ENRIQUE ORTEGA y EB, Fase IV (Rehab componentes 24 filtros, reemplazar medio filtrante y valvulas de control, mejoras al backwash incluyendo tanque de reserva y tuberia)	$ 13,507,597	$ 13,507,597	Aug-11	Apr-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M Demanda	1.44	$ 2,154,648	$ 5,682,885	$ 5,629,019	$ -	$ -	$ 13,466,552
2-12-7005	Norte	UTUADO	ACUEDUCTOS COMUNALES: SALTOS CAGUANAS Y LA ESTANCITA, BO. RONCADOR PROYECTO SUPLEMENTARIO AMBIENTAL PARA 2 SIST. NON PRASA	$ 2,196,113	$ 2,105,898	Aug-11	Apr-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	M Demanda	0.88	$ 334,688	$ 882,741	$ 874,374	$ -	$ -	$ 2,091,803
0-99-3013	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 16,800,000	$ 16,800,000	Jul-12	Apr-13	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0	$ -	$ 16,800,000	$ -	$ -	$ -	$ 16,800,000
7-22-6036	Obras menores	Coamo	Diseño y Construcción de las mejoras al sistema de operación y proceso de la Planta de Filtros de Coamo y de la Planta de Filtros de Jagueyes en Villalba.	$ 647,000	$ 647,000	Mar-12	May-13			0	Acueducto	Plantas de Filtración :	NM CUMPL	0						$ -
3-67-5000	Este	SAN LORENZO	Eliminación PAS existente por troncal sanitaria a PAS Caguas (FASE II)	$ 24,305,671	$ 17,302,858	Jan-10	Jun-13	Jun-16	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.35	$ 3,993,104	$ 6,095,667	$ 4,169,790	$ 159,017	$ -	$ 14,417,578
3-64-5001	Sur	SALINAS	Instalación del sistema sanitario Comunidad Cocos, Fase II, incluye cierre pozo septico Arcadio Maldonado (Requiere el proyecto 3-64-5030 para ser operable)	$ 24,380,771	$ 24,178,618	Apr-11	Jun-13	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 4,718,178	$ 9,845,586	$ 8,617,897	$ 216,651	$ -	$ 23,398,312
4-79-5002	Sur	YAUCO	Diseño y Construcción de la rehabilitación de la PAS de Guayanilla	$ 1,513,173	$ 1,513,173	Jan-12	Jun-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	NM Cumpl	1.13	$ 140,530	$ 762,373	$ 853,718	$ -	$ -	$ 1,756,620
3-18-5009	Este	CAYEY	Sistema sanitario para la Comunidad Brumas y parte de la Comunidad Marginal La Ley, Bo. Monte Llanos	$ 5,205,625	$ 5,205,625	May-11	Jun-13	Jan-00	DISEÑO	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ 960,084	$ 1,996,771	$ 1,955,916	$ 91,923	$ -	$ 5,004,693
4-58-5083	Sur	PONCE	Rehabiltacion 28 km. troncal sanitaria, Fase II	$ 19,989,171	$ 19,139,244	Aug-11	Jun-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.14	$ 3,160,870	$ 7,809,209	$ 9,131,403	$ 557,801	$ -	$ 20,659,282
2-34-7005	Norte	CIALES	WTP LAS DELICIAS - CUMPLIMIENTO	$ 2,080,256	$ 1,991,440	May-11	Jun-13	Dec-16	DISEÑO	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ 366,475	$ 729,051	$ 762,189	$ 52,632	$ -	$ 1,910,347
1-01-6232	Metro	TRUJILLO ALTO	Tanque agua tratada 13 MG, Sergio Cuevas, Fase III	$ 18,846,440	$ 18,840,038	Jun-11	Jun-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	M Demanda	0.7	$ 3,393,160	$ 6,878,526	$ 7,523,964	$ 497,909	$ -	$ 18,293,559
1-11-5007	Metro	BAYAMON	MEJORAS PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO BAYAMON Fase I	$ 15,565,093	$ 14,223,286	May-11	Jul-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	M Demanda	1.35	$ 2,634,071	$ 5,339,720	$ 5,840,766	$ 386,521	$ -	$ 14,201,078

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
3-02-7040	Este	AIBONITO	WTP AIBONITO URBANO - CUMPLIMIENTO - Mejoras Toma El Toronjo, Línea Transmisión Aguas Crudas & Exp WTP Urbana	$ 11,124,505	$ 10,499,065	May-11	Jul-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	M Demanda	1.62	$ 1,996,428	$ 4,047,106	$ 4,329,210	$ 390,605	$ -	$ 10,763,348
2-73-7000	Norte	UTUADO	Diseño y construcción de las mejoras al sistema de distribución de agua potable del Bo. Sabana Grande	$ 2,680,476	$ 2,680,476	Mar-12	Jul-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.22	$ 202,262	$ 1,960,387	$ 949,076	$ -	$ -	$ 3,111,726
2-04-7000	Norte	NARANJITO	WTP CEDRO ARRIBA - CUMPLIMIENTO	$ 3,621,369	$ 3,604,738	Oct-11	Jul-13	Dec-16	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ 421,027	$ 1,346,528	$ 1,820,657	$ 204,824	$ -	$ 3,793,035
2-74-7001	Norte	Vega Alta	Mejoras al sistema de distribución de agua potable del Bo. Bajuras (2.2km de tubería de 8" a lo largo de la PR-675 hasta la Urb. Velomas, intercoxión e instalación de acometidas y contadores en la calle	$ 1,260,449	$ 1,260,449	Ene-13	Jul-13		Planificación	0	Acueducto	Sistemas de Acueductos	NM Calidad							$ -
4-09-6011	Sur	PONCE	Reemplazo tuberia sanitaria 4" en Calle Navarra hasta PR 14	$ 186,839	$ 186,839	Dec-11	Jul-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.14	$ 18,150	$ 63,807	$ 95,056	$ 10,104	$ -	$ 187,117
0-99-2013	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 2,707,123	$ 2,707,123	Aug-12	Aug-13	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ -	$ 783,598	$ 1,883,537	$ 235,079	$ -	$ 2,902,214
0-99-8013	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo	$ 46,655,825	$ 46,655,825	Aug-12	Aug-13	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ -	$ 14,042,072	$ 33,752,980	$ 4,212,622	$ -	$ 52,007,674
4-04-6010	Oeste	AÑASCO	Mejoras a la toma de Rio Anasco, desarenador + 4-04-6015	$ 8,131,766	$ 7,857,036	Sep-11	Aug-13	Jan-00	DISEÑO	0	Acueducto	PFE	NM Calidad	1.04	$ 1,026,288	$ 2,799,713	$ 3,793,160	$ 591,142	$ -	$ 8,210,303
0-80-6213	ISLA	ISLA	Implementación Mejoras a Represas y Embalses	$ 5,700,000	$ 5,700,000	Aug-12	Aug-13	Jan-00	REN y Otros	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - Dams	0.96	$ -	$ 3,288,673	$ 3,328,375	$ -	$ -	$ 6,617,048
2-09-7001	Norte	ARECIBO	WTP ESPERANZA - CUMPLIMIENTO	$ 2,525,075	$ 2,487,579	Oct-11	Sep-13	Dec-21	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ 255,100	$ 750,584	$ 1,199,463	$ 247,742	$ -	$ 2,452,889
1-16-5031	Metro	CAROLINA	ELIMINACION CON LINEA GRAVITARIA DE LA ESTACION DE EYECTORES LA VICTORIA	$ 292,396	$ 292,396	Dec-12	Dec-13	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	EB	NM Calidad	1.35	$ -	$ 40,983	$ 174,800	$ 94,696	$ -	$ 310,479
1-72-6001	Metro	TRUJILLO ALTO	Rehabilitación y expansion del STS en la PF Sergio Cuevas (Nuevo)	$ 22,078,230	$ 22,078,230	Oct-11	Dec-13	Jun-14	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	M STS	1.39	$ 1,950,698	$ 5,722,047	$ 10,143,629	$ 3,858,047	$ -	$ 21,674,421
3-12-6022	Este	JUNCOS	PF Valenciano - Fase I - 2 MGD (Toma Ceiba Sur, adquisicion de terrenos, permisologia y procurement del embalse)	$ 46,226,617	$ 46,168,798	Jun-11	Dec-13	Dec-16	DISEÑO	0	Acueducto	PFN	M DOH	2	$ 6,808,398	$ 12,724,661	$ 19,720,877	$ 7,324,897	$ -	$ 46,578,834
0-80-9302	ISLA	ISLA	Medidas remediativas STS, instalación de medidores de flujo, sensores de nivel y equipo para declorar Fase II, 24 meses	$ 4,046,841	$ 4,046,841	Jun-11	Jan-14	x	PLANIFICACIÓN	Nuevo	Acueducto	PFE	M STS	0.7	$ 631,276	$ 1,179,832	$ 1,732,743	$ 774,945	$ -	$ 4,318,796
2-09-5050	Norte	BARCELONETA	Sistema de desinfección	$ 5,845,387	$ 5,422,277	May-11	Jan-14	Jun-11	DISEÑO	0	Alcantarillado	PASE	M EPA	0.92	$ 798,433	$ 1,463,794	$ 2,206,781	$ 986,952	$ -	$ 5,455,961
2-54-5001	Norte	NARANJITO	Sistema Alcantarillado Sanitario Com. Lago La Plata, 3 EB, laterales sanitarias y linea de transmision	$ 5,573,337	$ 5,209,327	Jun-11	Jan-14	SEP Jun 2013	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	M EPA	1.1	$ 719,708	$ 1,376,834	$ 2,148,695	$ 928,320	$ -	$ 5,173,556
2-34-7010	Norte	HATILLO	Mejoras a la represa que incluya poceto y muro y evaluación a la línea de aguas crudas. Construcción de nuevo almacén de polímeros de ser necesario. Ref PM1	$ 8,269,913	$ 8,269,913	Oct-11	Jan-14	Dec-16	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	M DOH	1.13	$ 723,709	$ 2,171,127	$ 3,916,543	$ 1,702,845	$ -	$ 8,514,223

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
0-99-9013	Isla	Isla	Mantenimiento Preventivo (Rehabilitación de sistemas)	$ 15,588,162	$ 15,588,162	Nov-12	Ene-14			0	Alcantarillado Sanitario	Otros Proyectos de Acueduct	M EPA							$ -
0-99-9014	Isla	Isla	Mantenimiento Preventivo (Rehabilitación de sistemas)	$ 18,243,851	$ 18,243,851	Nov-13	Ene-14			0	Alcantarillado Sanitario	Otros Proyectos de Acueduct	M EPA							$ -
5-68-6000	Oeste	SAN SEBASTIAN	San Sebastian WTP (STC) (3 MGD). Ref PM13	$ 1,058,386	$ 1,058,386	Oct-12	Feb-14	Jun-14	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M STS	0.87	$ -	$ 165,433	$ 551,821	$ 415,849	$ -	$ 1,133,102
1-70-6043	Metro	Toa Alta	Reemplazo de tubería de descarga del sistema de tratamiento de cienos de la PF Enrique Ortega para eliminar desbordes y proveer capacidad de transporte	$ 2,264,500	$ 2,264,500	Abr-13	Feb-14	Ago-11		0	Acueducto	Plantas de Filtración :	M STS	0						$ -
2-34-9002	Norte	HATILLO	Mejoras al sistema de distribución Camuy-Hatillo-Quebradillas, Fase II (7 tanques, 3 EB y línea de distribución) Ref 2-14-7000	$ 11,692,480	$ 11,692,480	Jan-12	Mar-14	Jan-00	DISEÑO	0	Acueducto	Redes	NM Calidad	1.39	$ 699,951	$ 2,863,435	$ 5,663,239	$ 3,499,754	$ -	$ 12,726,380
1-01-7007	Metro	LOIZA	Sistema de agua potable Com. Bosques de Piñones (Pascuala)	$ 3,996,443	$ 3,972,919	Aug-12	Mar-14	Jan-00	DISEÑO	0	Alcantarillado	SAS	NM Calidad	0.75	$ -	$ 719,372	$ 1,991,120	$ 1,571,486	$ -	$ 4,281,978
0-99-3014	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 16,800,000	$ 16,800,000	Jul-13	Apr-14	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0	$ -	$ -	$ 16,800,000	$ -	$ -	$ 16,800,000
0-99-2014	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 2,707,123	$ 2,707,123	Aug-13	Aug-14	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ -	$ -	$ 813,374	$ 1,955,111	$ 244,012	$ 3,012,498
0-99-8014	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo	$ 46,655,825	$ 46,655,825	Aug-13	Aug-14	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ -	$ -	$ 14,575,671	$ 35,035,593	$ 4,372,701	$ 53,983,965
2-03-6000	Norte	QUEBRADILLAS	Expansion WTP QUEBRADILLAS de 3 a 5 mgd-CUMPLIMIENTO	$ 16,389,338	$ 16,246,330	May-12	Aug-14	Dec-16	DISEÑO	0	Acueducto	PF>C	M DOH	1.62	$ 131,206	$ 2,886,539	$ 5,691,075	$ 6,658,721	$ 1,033,250	$ 16,400,792
1-71-6001	Metro	TOA BAJA	Rehabilitación Planta de Filtración La Virgencita Fase II, Incluye los pozos colectores 1-09-6041, Superacueducto	$ 6,090,360	$ 6,088,005	Jul-12	Aug-14	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Crec	0.56	$ -	$ 1,050,556	$ 2,212,733	$ 2,889,029	$ 413,656	$ 6,565,974
0-80-6214	ISLA	ISLA	Implementación Mejoras a Represas y Embalses	$ 5,700,000	$ 5,700,000	Aug-13	Aug-14	Jan-00	REN y Otros	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - Dams	0.96	$ -	$ -	$ 3,413,642	$ 3,454,853	$ -	$ 6,868,496
0-99-8114	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo líneas sanitarias	$ 5,700,000	$ 5,700,000	Aug-13	Aug-14	Jan-00	REN y Otros	0	REN	SAS	NM Cumpl - SREN	0.96	$ -	$ -	$ 3,413,642	$ 3,454,853	$ -	$ 6,868,496
3-21-6060	Este	CIDRA	Reeplazo valvula de guillotina en el pozo humedo de la Represa de Cidra	$ 1,929,318	$ 1,929,318	Apr-13	Dec-14	Jan-00	PLANIFICACIÓN	Nuevo	Acueducto	Abastos	NM Calidad - Dams	0.65	$ -	$ 51,716	$ 508,540	$ 1,131,287	$ 463,289	$ 2,154,832
0-80-9303	ISLA	ISLA	Medidas remediativas STS, instalación de medidores de flujo, sensores de nivel y equipo para declorar Fase III, 36 meses	$ 9,199,498	$ 9,199,498	Jun-11	Jan-15	x	PLANIFICACIÓN	Nuevo	Acueducto	PFE	M STS	0.7	$ 983,772	$ 1,553,808	$ 2,620,327	$ 2,767,433	$ 1,232,014	$ 9,157,355
5-41-5001	Oeste	LAJAS	Eliminación de la PAS Boqueron, Villa Taina, Fase II (Redirección del flujo desde la EB Palmarejo a la Pas Lajas)	$ 3,654,216	$ 3,654,216	Aug-13	Apr-15	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	M EPA	0.79	$ -	$ -	$ 704,532	$ 1,933,061	$ 1,765,734	$ 4,403,327
0-99-3015	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 18,286,884	$ 18,286,884	Jul-14	Apr-15	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0	$ -	$ -	$ -	$ 18,286,884	$ -	$ 18,286,884

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
0-99-2015	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 2,914,247	$ 2,914,247	Aug-14	Aug-15	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ -	$ -	$ -	$ 813,374	$ 1,955,111	$ 2,768,486
0-99-8015	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo	$ 46,655,825	$ 46,655,825	Aug-14	Aug-15	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ -	$ -	$ -	$ 14,575,671	$ 35,035,593	$ 49,611,264
2-68-5030	Oeste	SAN SEBASTIAN	RELOCALIZACION TRONCAL SANITARIA PR 111 PARALELA RIO CULEBRINAS	$ 1,415,649	$ 1,400,714	Jul-13	Aug-15	Jan-00	SUBASTA	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	1.14	$ -	$ -	$ 237,503	$ 500,240	$ 639,773	$ 1,377,517
0-80-1015	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - REMPLAZO DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE NETWORKING OBSOLETOS	$ 2,240,000	$ 2,240,000	Aug-14	Aug-15	Jan-00	REN y Otros	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.96	$ -	$ -	$ -	$ 1,341,502	$ 1,357,697	$ 2,699,198
0-80-1115	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - LICENCIAS MICROSOFT & ALTIRIS	$ 1,120,000	$ 1,120,000	Aug-14	Aug-15	Jan-00	REN y Otros	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.96	$ -	$ -	$ -	$ 670,751	$ 678,848	$ 1,349,599
0-80-1215	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - ALAMBRADO REDES LOCALES	$ 560,000	$ 560,000	Aug-14	Aug-15	Jan-00	REN y Otros	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.96	$ -	$ -	$ -	$ 335,375	$ 339,424	$ 674,800
0-80-6115	ISLA	ISLA	Implementación Ground Water Rule	$ 4,560,000	$ 4,560,000	Aug-14	Aug-15	Jan-00	REN y Otros	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - GWR	0.96	$ -	$ -	$ -	$ 2,730,914	$ 2,763,883	$ 5,494,796
0-80-6215	ISLA	ISLA	Implementación Mejoras a Represas y Embalses	$ 5,700,000	$ 5,700,000	Aug-14	Aug-15	Jan-00	REN y Otros	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - Dams	0.96	$ -	$ -	$ -	$ 3,413,642	$ 3,454,853	$ 6,868,496
0-99-8115	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo líneas sanitarias	$ 5,700,000	$ 5,700,000	Aug-14	Aug-15	Jan-00	REN y Otros	0	REN	SAS	NM Cumpl - SREN	0.96	$ -	$ -	$ -	$ 3,413,642	$ 3,454,853	$ 6,868,496
0-99-8315	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo Implementación Comprehensive Performance Evaluation (CPE)	$ 4,560,000	$ 4,560,000	Aug-14	Aug-15	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W	NM Cumpl - CPE	0.96	$ -	$ -	$ -	$ 2,730,914	$ 2,763,883	$ 5,494,796
3-36-5080	Este	HUMACAO	Sistema sanitario Bo. Candelero Abajo	$ 4,529,647	$ 4,529,647	Jul-13	Dec-15	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Crec	1.1	$ -	$ -	$ 654,763	$ 1,342,499	$ 1,978,420	$ 3,975,681
3-78-5015	Este	YABUCOA	AMPLIACION Y MEJORAS PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO YABUCOA	$ 11,822,653	$ 11,822,653	Jan-13	Dec-15	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ 644,554	$ 2,036,791	$ 3,725,523	$ 4,615,007	$ 11,021,875
2-68-5000	Oeste	SAN SEBASTIAN	EXPANSION PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 1.0 A 3.0 MGD	$ 16,269,433	$ 15,450,114	Jul-13	Dec-15	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ 2,223,540	$ 4,335,104	$ 6,766,601	$ 13,325,245
4-58-5040	Sur	PONCE	Renovación Sistema Alcantarillados Sanitario, Avenida Hostos y Playa de Ponce, Ponce en Marcha Fase IV	$ 19,600,305	$ 19,600,305	Aug-12	Jan-16	Jan-00	DISEÑO	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	0.17	$ -	$ 1,688,011	$ 3,587,022	$ 5,929,137	$ 7,068,544	$ 18,272,714
2-24-5005	Norte	COROZAL	Retrofit y Ampliación PAS Corozal	$ 4,531,575	$ 4,428,561	Aug-13	Jan-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ 574,403	$ 1,180,973	$ 1,971,351	$ 3,726,726
1-66-5089	Metro	SAN JUAN	Control de olores en la PAS de Puerto Nuevo	$ 8,209,640	$ 8,209,640	Jun-14	Jan-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	M EPA	0.35	$ -	$ -	$ 68,367	$ 1,914,276	$ 4,213,117	$ 6,195,761
0-99-9015	Isla	Isla	Mantenimiento Preventivo (Rehabilitación de sistemas)	$ 6,832,990	$ 6,832,990	Nov-14	Ene-16			0	Alcantarillado Sanitario	Otros Proyectos de Acueduct	M EPA							$ -

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplim iento	Etapa	Ava nce %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Priori dad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
4-55-5005	Sur	OROCOVIS	EXPANSION PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 8,475,589	$ 8,475,589	Aug-13	Feb-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ 990,752	$ 2,168,943	$ 3,846,974	$ 7,006,669
3-27-5007	Este	FAJARDO	ALCANTARILLADO SANITARIO LAS CROABAS	$ 12,942,992	$ 12,762,772	Jul-12	Feb-16	Jan-00	DISEÑO	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ 1,195,948	$ 2,009,686	$ 3,341,257	$ 3,859,090	$ 10,405,981
3-56-5001	Sur	PATILLAS	Troncal Patillas - Guayama	$ 14,901,539	$ 14,769,144	Jul-13	Feb-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	M EPA	0.7	$ -	$ -	$ 2,020,850	$ 3,827,367	$ 6,399,358	$ 12,247,576
4-69-5040	Sur	SANTA ISABEL	MEJORAS EMISARIO PAS Santa Isabel	$ 7,487,131	$ 7,485,578	Jul-14	Feb-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASE	M EPA	0.83	$ -	$ -	$ -	$ 1,675,467	$ 3,802,021	$ 5,477,488
3-05-5015	Este	AIBONITO	EXPANSION Y REHABILITACION PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 23,413,582	$ 23,402,046	Feb-13	Feb-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ 854,907	$ 3,514,619	$ 6,031,847	$ 9,119,013	$ 19,520,386
3-76-5002	Este	VIEQUES	Mejoras a la PAS de Vieques	$ 7,674,482	$ 7,674,482	Jul-13	Mar-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.22	$ -	$ -	$ 1,043,162	$ 1,865,047	$ 3,176,902	$ 6,085,111
2-09-5020	Norte	BARCELONETA	EXPANSION PAS BARCELONETA DE 8.0 A 12.0 MGD	$ 42,062,248	$ 40,440,234	Aug-12	Apr-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ 2,901,705	$ 5,764,721	$ 9,904,486	$ 12,806,191	$ 31,377,103
2-37-5005	Oeste	ISABELA	MEJORAS PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO ISABELA (PLANIFICACION, DISEÑO Y MEJORAS EMISARIO)	$ 24,585,830	$ 24,432,694	Aug-12	Apr-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.22	$ -	$ 1,828,298	$ 3,632,219	$ 6,240,592	$ 8,068,890	$ 19,770,000
2-42-5020	Norte	LARES	Mejoras a la PAS de Lares	$ 21,445,407	$ 21,445,407	Aug-12	Apr-16	Jun-16	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.22	$ -	$ 1,540,900	$ 3,061,254	$ 5,259,604	$ 6,800,504	$ 16,662,262
3-27-5006	Este	FAJARDO	EXPANSIÓN PLANTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FAJARDO A (6 MGD a 12MGD). Ref PM50	$ 20,098,188	$ 20,098,188	Aug-12	Apr-16	Evaluación, T2	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ 1,625,755	$ 3,229,834	$ 5,245,771	$ 7,478,475	$ 17,579,835
0-99-3016	ISLA	ISLA	Cambio de Contadores	$ 22,888,357	$ 22,888,357	Jul-15	Apr-16	Jan-00	REN y Otros	0	CON	Otros W	Estructura - Contadores	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,888,357	$ 22,888,357
4-58-5090	Sur	PONCE	Renovación sistema de alcantarillado en Comunidad Bélgica, Zona Histórica de Ponce	$ 6,741,878	$ 6,741,878	Jul-14	May-16	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl - SREN	0.31	$ -	$ -	$ -	$ 1,386,176	$ 3,126,430	$ 4,512,606
2-09-6008	Metro	TOA ALTA	MEJORAS DE PF ENRIQUE ORTEGA y EB, Fase V (Reemplazo 5 EB existentes, mejoras sist quimicos, aereadores, cloracion, tratamiento de solidos)	$ 18,782,704	$ 18,782,704	Apr-14	Jun-16	Dec-16	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ -	$ -	$ 395,928	$ 3,721,725	$ 7,740,397	$ 11,858,050
4-14-7001	Sur	YAUCO	NUEVA WTP RIO PRIETO (1.5MGD) Y SISTEMA DE DISTRIBUCION	$ 30,130,510	$ 29,922,111	Nov-11	Jul-16	Dec-16	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFN	M DOH	1.79	$ 1,104,206	$ 2,732,911	$ 4,168,379	$ 6,183,556	$ 7,895,075	$ 22,084,127
0-99-2016	ISLA	ISLA	Renovación flota	$ 10,414,247	$ 10,414,247	Aug-15	Aug-16	Jan-00	REN y Otros	0	Flota	Otros W&S	Estructura - Flota	0.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,253,498	$ 3,253,498
0-99-8016	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo	$ 58,319,781	$ 58,319,781	Aug-15	Aug-16	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W&S	Estructura - REN	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,219,588	$ 18,219,588
3-21-6061	Este	CIDRA	Rehabilitación estación de bombas de aguas crudas Candela, Bo. Rincón	$ 4,263,252	$ 4,263,252	Jul-14	Aug-16	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	Abastos	NM Calidad	1.04	$ -	$ -	$ -	$ 821,954	$ 1,818,574	$ 2,640,529

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplim iento	Etapa	Ava nce %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Priori dad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
4-16-6000	Oeste	SAN GERMAN	TUBERIA TRANSMISION 1 MGD LAJAS / SAN GERMAN	$ 3,769,760	$ 3,631,089	May-14	Aug-16	Dec-16	SUBASTA	0	Acueducto	Redes	M DOH	1.75	$ -	$ -	$ 30,657	$ 643,793	$ 1,360,397	$ 2,034,847
0-80-1016	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - REMPLAZO DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE NETWORKING OBSOLETOS	$ 2,240,000	$ 2,240,000	Aug-15	Aug-16	Jan-00	REN y Otros	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,341,502	$ 1,341,502
0-80-1116	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - LICENCIAS MICROSOFT & ALTIRIS	$ 1,120,000	$ 1,120,000	Aug-15	Aug-16	Jan-00	REN y Otros	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 670,751	$ 670,751
0-80-1216	ISLA	ISLA	MEJORAS TECNOLOGICAS - ALAMBRADO REDES LOCALES	$ 560,000	$ 560,000	Aug-15	Aug-16	Jan-00	REN y Otros	0	Tecnología	Otros W&S	Estructura - MIS	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 335,375	$ 335,375
0-80-6116	ISLA	ISLA	Implementación Ground Water Rule	$ 4,560,000	$ 4,560,000	Aug-15	Aug-16	Jan-00	REN y Otros	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - GWR	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,730,914	$ 2,730,914
0-80-6216	ISLA	ISLA	Implementación Mejoras a Represas y Embalses	$ 5,700,000	$ 5,700,000	Aug-15	Aug-16	Jan-00	REN y Otros	0	Acueducto	Abastos	NM Cumpl - Dams	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,413,642	$ 3,413,642
0-99-8116	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo líneas sanitarias	$ 5,700,000	$ 5,700,000	Aug-15	Aug-16	Jan-00	REN y Otros	0	REN	SAS	NM Cumpl - SREN	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,413,642	$ 3,413,642
0-99-8316	ISLA	ISLA	Renovacion y Remplazo Implementación Comprehensive Performance Evaluation (CPE)	$ 4,560,000	$ 4,560,000	Aug-15	Aug-16	Jan-00	REN y Otros	0	REN	Otros W	NM Cumpl - CPE	0.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,730,914	$ 2,730,914
2-07-7000	Norte	ARECIBO	Proyecto de mejoras a la Planta PF Río Arriba (0.14 MGD). Ref PM3	$ 1,586,247	$ 1,586,247	Jan-15	Sep-16	Dec-16	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ -	$ -	$ -	$ 110,798	$ 492,624	$ 603,421
3-12-6011	Este	JUNCOS	WTP JUNCOS (PF Quebrada Grande) - CUMPLIMIENTO	$ 1,819,221	$ 1,819,221	Aug-14	Oct-16	Dec-16	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	M DOH	1.44	$ -	$ -	$ -	$ 239,111	$ 571,952	$ 811,063
2-03-6201	Oeste	SAN SEBASTIAN	WTP SAN SEBASTIAN - CUMPLIMIENTO	$ 1,954,578	$ 1,951,762	Jul-15	Aug-17	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Acueducto	PFE	NM Cumpl	1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 328,286	$ 328,286
2-74-5000	Norte	VEGA ALTA	LATERALES SANITARIAS COM. MARICAO, BO. MARICAO Y CONEXION A TRONCAL PRINCIPAL	$ 6,135,484	$ 5,984,568	Jul-15	Dec-17	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Crec	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 865,291	$ 865,291
4-63-5015	Oeste	SABANA GRANDE	LATERALES SANITARIAS COMUNIDAD LIBORIO NEGRON, BARRIO MACHUCHAL	$ 2,701,563	$ 2,213,679	Dec-15	Mar-18	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 167,032	$ 167,032
2-14-5001	Norte	CAMUY	Sistema Sanitario Comunidades Membrillo y Yeguada Fase III Tramo PR 2	$ 4,680,745	$ 4,523,864	Dec-15	Apr-18	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 329,421	$ 329,421
4-65-5000	Oeste	SAN GERMAN	LATERALES SANITARIAS SECTOR EL COTO Y ESTACION DE BOMBAS	$ 4,769,349	$ 4,762,644	Dec-15	Jun-18	Jan-00	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	SAS	NM Cumpl	1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320,395	$ 320,395
1-71-5005	Metro	TOA BAJA	TOA BAJA-PAS DORADO	$ 87,360,043	$ 87,360,043	Mar-16	Oct-20	Jun-21	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASN	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,933,662	$ 1,933,662
2-75-5030	Norte	VEGA BAJA	NUEVA PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO REGIONAL	$ 100,475,069	$ 100,475,069	Apr-16	Dec-20	Jun-21	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PASN	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,332,958	$ 1,332,958

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC
29-Aug-11

Nota: Los proyectos, el alcance, la inversión estimada y la programación de los proyectos incluidos, pueden variar de tiempo en tiempo a tono con

PMC	Región	Municipio	Proyecto	Inversión Total Estimada	Inversión Remanente	Inicio Subasta	Puesta en Operació	Término Cumplimiento	Etapa	Avance %	Obra	Tipo	Mand/No Mand	Prioridad	2012	2013	2014	2015	2016	Total Resolución Num. 2650
1-11-5004	Metro	BAYAMON	AMPLIACIÓN PLANTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REGIONAL BAYAMON (40 MGD a 75 MGD) Ref PM45	$ 139,262,661	$ 139,262,661	May-16	Jan-21	Jun-21	PLANIFICACIÓN	0	Alcantarillado	PAS>C	M EPA	1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 534,284	$ 534,284
2-54-7000	Norte	Naranjito	Nuevo sistema de distribución de agua potable para la Comunidad Santana	$ 4,450,296	$ 4,450,296					0	Acueducto	Sistemas de Acueductos	NM Calidad							$ -
1-66-5014	Metro	San Juan	Nuevo edificio para el sistema de desarenador para la PAS Puerto Nuevo	$ 17,495,888	$ 17,495,888					0	Alcantarillado Sanitario	Plantas de Alcantarillado	NM Calidad							$ -
Total	**666**			**$ 4,094,204,859**	**$ 2,520,088,252**										**$ 406,750,580**	**$ 395,933,292**	**$ 300,083,730**	**$ 214,200,221**	**$ 241,753,995**	**$ 1,558,721,817**
